

105 年公共建築物無障礙生活環境  
及騎樓整平示範計畫  
業務督導考核

【成果報告】

委託單位：內政部營建署  
承辦單位：財團法人台灣建築中心

中華民國 105 年 12 月



# 目 錄

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 壹、前言                                | 1-001 |
| 貳、公共建築物及騎樓無障礙環境優化計畫（105-108 年）      | 2-001 |
| 一、依據                                | 2-001 |
| 二、目的                                | 2-002 |
| 三、考核事項                              | 2-002 |
| 四、受考核單位                             | 2-003 |
| 五、考核組織                              | 2-004 |
| 六、考核方式、考核成績及獎懲                      | 2-004 |
| 七、實地現場考核行程                          | 2-006 |
| 八、考核經費                              | 2-007 |
| 九、協調配合事項                            | 2-007 |
| 十、其他                                | 2-008 |
| 參、業務考核項目                            | 3-001 |
| 一、業務考核項目內容                          | 3-001 |
| 二、業務考核項目成績                          | 3-007 |
| 三、業務考核項目成果                          | 3-018 |
| 肆、實地現場考核                            | 4-001 |
| 一、實地現場考核內容                          | 4-001 |
| 二、實地現場考核紀錄                          | 4-003 |
| 三、實地現場考核成果                          | 4-178 |
| 四、實地現場考核加分項目評分原則與參考表                | 4-182 |
| 五、督導考核總成績                           | 4-254 |
| 伍、結論與建議                             | 5-001 |
| 一、考核成果結論                            | 5-001 |
| 二、業務推動相關作業建議                        | 5-002 |
| 陸、附件                                | 6-001 |
| 一、105 年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表           | 6-001 |
| 二、105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考核評分表       | 6-008 |
| 三、無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 102 年版) | 6-019 |
| 四、無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 97 年版)  | 6-032 |

|   |       |
|---|-------|
| 五、105-106 年度內政部營建署建築物無障礙生活環境業務督導小組名單 .....          | 6-045 |
| 六、實地現場考核行程表 .....                                   | 6-047 |
| 七、無障礙生活環境業務考核會議議程.....                              | 6-048 |
| 八、改善諮詢及審查小組名冊範例.....                                | 6-049 |
| 九、建築物勘檢案件總清冊範例.....                                 | 6-050 |
| 十、公共建築無障礙設備設施勘檢小組名冊範例.....                          | 6-052 |
| 十一、分期分區改善計畫表範例.....                                 | 6-053 |
| 十二、無障礙設備與設施改善基金管理委員會名冊範例...                         | 6-055 |
| 十三、推動公共建築物無障礙生活環境相關法規.....                          | 6-056 |
| 十四、實地現場抽查日期變更相關公文.....                              | 6-074 |
| 十五、研商 105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查行前說明會議會議紀錄 ..... | 6-078 |
| 十六、研商 105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查評分事宜會議紀錄 .....   | 6-083 |
| 十七、105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導檢討會會議紀錄 .....               | 6-091 |

## 圖表目錄

|          |                          |       |
|----------|--------------------------|-------|
| 圖 2.1    | 考核計畫執行概要圖 .....          | 2-005 |
| 圖 3.3.1  | 行政措施業務評分指標得分率統計圖 .....   | 3-018 |
| 圖 3.3.2  | 改善成果業務評分指標得分率統計圖 .....   | 3-020 |
| 圖 3.3.3  | 其他積極作為業務評分指標得分率統計圖 ..... | 3-021 |
| 圖 4.3.1  | 建築圖說缺失數量統計圖 .....        | 4-179 |
| 圖 4.3.2  | 無障礙設施、設備部份缺失數量統計圖 .....  | 4-180 |
| 圖 4.3.3  | 騎樓整平缺失數量統計圖 .....        | 4-181 |
| 表 3.2.1  | 業務考核項目成績表 .....          | 3-007 |
| 表 3.2.2  | 業務考核項目填報資料表 .....        | 3-010 |
| 表 3.3.1  | 行政措施業務評分指標得分率統計表 .....   | 3-018 |
| 表 3.3.2  | 改善成果業務評分指標得分率統計表 .....   | 3-019 |
| 表 3.3.3  | 其他積極作為業務評分指標得分率統計表 ..... | 3-021 |
| 表 3.3.4  | 其他積極作為得分項目表 .....        | 3-023 |
| 表 4.1.1  | 直轄市、縣市政府考核建築物配分說明表 ..... | 4-001 |
| 表 4.2.1  | 臺北市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-003 |
| 表 4.2.2  | 新北市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-011 |
| 表 4.2.3  | 桃園市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-019 |
| 表 4.2.4  | 臺中市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-027 |
| 表 4.2.5  | 臺南市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-034 |
| 表 4.2.6  | 高雄市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-042 |
| 表 4.2.7  | 基隆市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-049 |
| 表 4.2.8  | 新竹市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-058 |
| 表 4.2.9  | 嘉義市政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-069 |
| 表 4.2.10 | 宜蘭縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-079 |
| 表 4.2.11 | 新竹縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-086 |
| 表 4.2.12 | 苗栗縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-095 |
| 表 4.2.13 | 彰化縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-104 |
| 表 4.2.14 | 南投縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-113 |
| 表 4.2.15 | 雲林縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-120 |
| 表 4.2.16 | 嘉義縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-126 |
| 表 4.2.17 | 屏東縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-134 |
| 表 4.2.18 | 花蓮縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-141 |
| 表 4.2.19 | 臺東縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-148 |
| 表 4.2.20 | 澎湖縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-155 |
| 表 4.2.21 | 金門縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-162 |
| 表 4.2.22 | 連江縣政府實地現場考核紀錄 .....      | 4-170 |

|         |   |       |
|---------|---|-------|
| 表 4.3.1 | 建築圖說得分彙整表 .....                             | 4-179 |
| 表 4.3.2 | 無障礙設施、設備部份得分 (未計加分項目)<br>彙整表 .....          | 4-180 |
| 表 4.3.3 | 騎樓整平得分彙整表 .....                             | 4-181 |
| 表 4.4.1 | 實地現場考核加分項目評分參考表 .....                       | 4-183 |
| 表 4.4.2 | 受考核單位實地現場考核加分項目得分表 .....                    | 4-185 |
| 表 4.5.1 | 105 年無障礙生活環境業務考核總成績表 .....                  | 4-262 |
| 表 4.5.2 | 105 年公共建築物無障礙生活環境業務考核成績<br>等級表 .....        | 4-265 |
| 表 6.1   | 105 年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表                     | 6-001 |
| 表 6.2   | 105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考<br>核評分表 .....       | 6-008 |
| 表 6.3   | 無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表<br>(設計規範 102 年版) ..... | 6-019 |
| 表 6.4   | 無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表<br>(設計規範 97 年版) .....  | 6-032 |
| 表 6.5   | 105-106 年內政部營建署建築物無障礙生活環境<br>業務督導小組名單 ..... | 6-045 |
| 表 6.6   | 實地現場考核行程表 .....                             | 6-047 |
| 表 6.7   | 無障礙生活環境業務考核會議議程 .....                       | 6-048 |
| 表 6.8   | 改善諮詢及審查小組名冊範例 .....                         | 6-049 |
| 表 6.9   | 建築物勘檢案件總清冊範例-新建 .....                       | 6-050 |
| 表 6.10  | 建築物勘檢案件總清冊範例-既有 .....                       | 6-051 |
| 表 6.11  | 公共建築無障礙設備設施勘檢小組名冊範例 .....                   | 6-052 |
| 表 6.12  | 分期分區改善計畫表範例 .....                           | 6-053 |
| 表 6.13  | 無障礙設備與設施改善基金管理委員會名冊範<br>例 .....             | 6-055 |

## 壹、前言



## 壹、前言

無障礙生活環境建立之完善與否乃為發展中國家生活品質的重要指標之一。隨著高齡化社會的到來，民眾對於無障礙生活環境的需求日益增加，有鑑於此，內政部營建署自民國 88 年以來便大力推行無障礙生活環境業務等各項工作；在歷經了多年來有計畫的推行，以及與各單位協助配合共同努力下，我國無障礙生活環境品質水準也日漸提升，逐步趨向先進國家水準。

本（105）年公共建築物無障礙生活環境業務督導內容分為「業務考核項目」及「實地現場考核」兩大項目，並且分別辦理考評。「業務考核項目」考評部分，營建署因考量各縣市發展型態與規模、人力配置及資源等實質差異性，將全國直轄市、縣（市）政府區分成「都會型」、「城鎮型」與「偏遠及離島型」三種類組，評分指標對各類型受督導單位也加以調整對應，以此督促地方政府重視並積極推動無障礙生活環境之改善工作。執行方式為由營建署發函各受督導單位，訂於 6 月 30 日前將業務資料報送營建署考評，「業務考核項目」成績併同各受考核單位「實地現場考核」成績於實地現場考核期程結束後召開本年度檢討會議討論。

為能區分不同縣市無障礙業務執行之差異性，並塑造地方特色之無障礙環境，故重新研訂「公共建築物及騎樓無障礙環境 優化計畫（105-108 年）」，評分方式主要如下：

- 一、總成績計算為「業務考核項目分數佔 30%，實地現場考核分數佔 70%」。
- 二、「實地現場考核」選定抽查地點五件，內容為一件新建公共建築物、三件既有公共建築物改善案件及一條至少 100 公尺以上連續騎樓路段（新建公共建築物係指於 103、104 年取得使用執照之公共建築物；既有公共建築物係指 103、104 年經改善諮詢及審查小組審查通過並已施工完竣之公共建築物；騎樓係指 103、104 年改善完竣之騎樓）。
- 三、「實地現場考核」現場設備設施評分方式為倒扣方式與加分

方式併行。倒扣方式依現勘標的缺失自 80 分開始扣分；加分方式係指設備設施業依規定設置，且整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計項目，視實際情形酌予加分，每項加分項目最高可得五分，每個受考核單位加分分數以 20 分為限。

## 貳、督導計畫

一、依據

二、目的

三、考核事項

四、受考核單位

五、考核組織

六、考核行程

七、考核方式、考核成績及獎懲

八、考核經費

九、協調配合事項

十、其他



## 貳、公共建築物及騎樓無障礙環境 優化計畫（105-108年）

### 一、依據

- （一）93年1月7日行政院身心障礙者權益促進委員會第五次會議決議，持續督導各地方政府加強改善。
- （二）行政院主計處94年10月7日函為將依無障礙生活環境督導業務督導考核成果作為中央增減對各該縣市一般性補助款之參考依據。
- （三）94年7月11日內政部身心障礙者保護委員會第15次會議第四案決議，加強無障礙設施行政督導。
- （四）95年5月19日行政院人權推動小組第11次委員會決定事項：「為維護身心障礙者行動與使用之權益，請內政部與相關部會密切配合，持續落實推動辦理。」。
- （五）95年11月23日內政部第40次部務會報部長指示略以：考核時應以「有無落實初核作業」、「是否依規定裁罰」以及「有無確實督促改善」等事項確實督考各直轄市及縣（市）政府，除函送行政院主計處作為增減地方一般性補助之依據，以促其改善。
- （六）98年12月30日98年第26次部務會報提報：「改善現有無障礙生活環境之有效方案及新作為--公共建築物部分，分別就都會、城鎮及偏遠與離島等區域，明定各地方政府年度執行目標值」，以有效提昇既有公共建築物改善率，以加速推動改善執行計畫之完成期程。
- （七）99年1月14日99年第1次部務會報提報：「結合民間力量督促地方政府之積極作為，公共建築物無障礙生活環境業務督導部分：提高公共建築物無障礙設施改善審查及諮詢小組應遴聘肢體、視覺障礙等身心障礙者團體代表所佔之人員比例，及修正督導計畫，請各受督導單位邀請當地民間身心障礙團體與公共建築

物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組委員參加督導行程。」。

(八) 為配合 101 年 10 月 1 日修正發布「建築技術規則」建築設計施工編部分條文、101 年 11 月 16 日修正「建築物無障礙設施設計規範」及「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，於 102 年 1 月 1 日生效施行。

(九) 配合 104 年第 19 次部務會報紀錄重要工作報告結論：「請營建署檢討評鑑標準，對於實地隨機抽測項目分數比重應予提高，並納入騎樓整平後之配套管理機制，及加強舊有建築物之考核，以落實公共建築物無障礙生活環境之推動」。

## 二、目的

按身心障礙者權益保障法第 2 條規定，內政部營建署為推動身心障礙者住宅、公共建築物、公共設施之總體規劃與無障礙生活環境等相關權益之規劃、推動及監督等事項之目的事業主管機關，為有效推動建立公共建築物無障礙生活環境，積極督促直轄市、縣（市）政府及內政部指定之特設主管建築機關落實執行清查及改善工作，爰辦理直轄市、縣（市）政府及內政部指定之特設主管建築機關等業務考核，以貫徹執行成效。

## 三、考核事項

(一) 業務考核項目：（詳附件一「105 年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表」）（考核內容得視實際需要逐年調整）

1. 行政措施

2. 改善成果

3. 其他積極作為

(二) 實地現場考核：（詳附件二「105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考核評分表」、附件三「無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 102 年版)」、附件四「無障礙生活

環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 97 年版)」) (以上附件內容得視實際需要逐年調整)

1. 新建公共建築物：無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間、無障礙標誌、無障礙客房等項目。
2. 既有公共建築物：無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、浴室、輪椅觀眾席位、停車空間、無障礙標誌、無障礙客房等項目。
3. 騎樓整平：地面順平、坡道處理、水溝蓋、方向、鋪面材質等項目。

#### 四、受考核單位

- (一) 6 直轄市、13 縣(市)政府(即澎湖縣、金門縣、連江縣以外)：每年一次。
- (二) 澎湖縣、金門縣、連江縣政府：每二年一次。
- (三) 內政部指定之特設主管建築機關：本署所屬國家公園管理處，每五年一次。
- (四) 內政部指定之特設主管建築機關：科技部(新竹、中部、南部)科學工業園區管理局、經濟部加工出口區管理處、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部台北水源特定區管理局，每五年一次。
- (五) 依據內政部發布至 105 年 1 月之戶數、人口數、性比例及人口密度統計表，分為都會型、城鎮型、偏遠及離島型、特設主管建築機關，俾更能依人口數、居住密度、城鄉型態、建築物類型、人力資源等，有效提升轄內既有公共建築物之改善數量：
  1. 都會型甲組(人口數 100 萬人以上)：臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市。
  2. 都會型乙組(人口數未達 100 萬人)：基隆市、新竹市、嘉義市。

3. 城鎮型：彰化縣、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣。
4. 偏遠及離島型：花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。
5. 特設主管建築機關：本署所屬國家公園管理處、科技部（新竹、中部、南部）科學工業園區管理局、經濟部加工出口區管理處、交通部台灣區國道高速公路局、經濟部台北水源特定區管理局。

## 五、考核組織

- (一) 由營建署邀請考核委員及相關單位代表，組成「內政部營建署公共建築物無障礙生活環境考核小組」（詳如附件五）（小組成員得視實際需要逐年調整），其中考核委員由專家學者、相關單位及團體代表擔任，並由營建署指派召集人及副召集人若干人。
- (二) 本考核業務委託由「財團法人台灣建築中心」（以下簡稱為受委託辦理單位）承辦行政事務。

## 六、考核方式、考核成績及獎懲

- (一) 考核方式：
  1. 考核前邀集各受考核機關承辦單位主管，召開會議說明本次考核事項及行程，並請與會人員提供意見。
  2. 督導分為「業務考核項目」及「實地現場考核」兩部分。
    - (1) 「業務考核項目」部份：受考核單位於指定日期前，依據「內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務考核評分表」先自評分數並檢具相關佐證資料，報署評核。
    - (2) 「實地現場考核」部分：依據「公共建築物-新建設置及已領使用執照改善無障礙設施及設備清查列管清冊」，選定抽查地點五件，包括一件新建公共建築物、三件既有公共建築物改善案件及一條至少 100 公尺以上連續騎樓路段。新建公共建築物係指於 103、104 年取得使用執照之公共建築物；既有公共建築物係指 103、104 年度經改善諮詢及審查小組審查通過並已施工完竣之公共建築物。

- (3) 各受考核單位於指定時間應送達考核資料，未於指定時間內送達或資料不全者，視影響程度採外扣分方式辦理（總分外扣最高可至 5 分），並以逾期 1 至 3 日(工作天)外扣 1 分，逾 4 至 6 日外扣考核分數 2 分之方式類推，以臻公允。
- (4) 考核結束後召開考核檢討會議，並依各受考核機關之考核成績予以獎懲。
- (5) 內政部指定之特設主管建築機關須於非考核之年度，依「內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務考核評分表」自評分數並檢具相關佐證資料，報署備查列管。

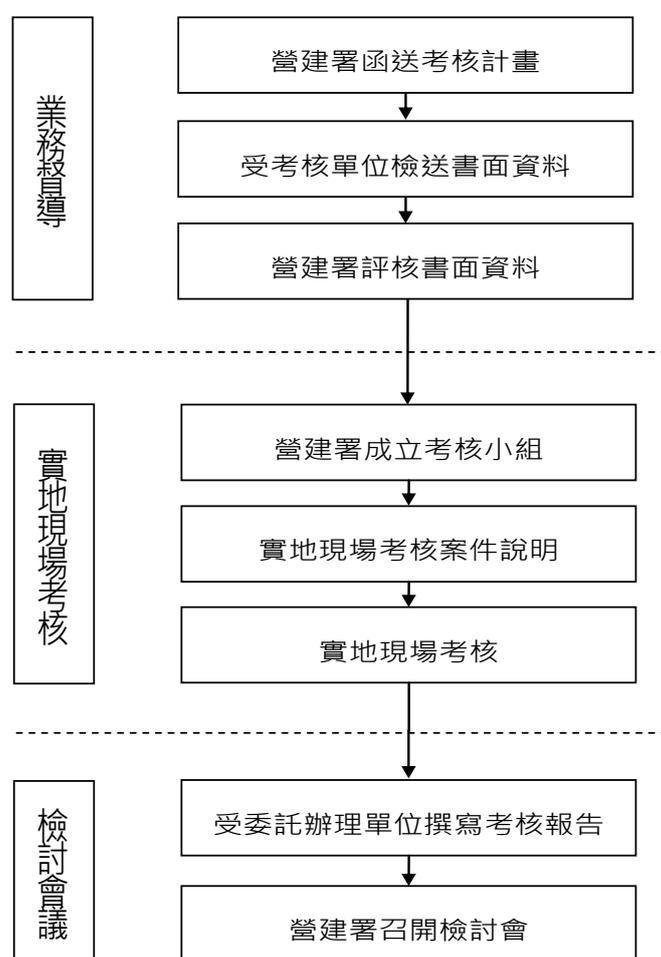


圖 2.1 考核計畫執行概要圖

- (二) 考核成績計算方式，「業務考核項目」考評表配分 100 分，「實地現場考核」考評表配分 100 分；總成績計算由兩項分數合計為總分 100 分，其中「業務考核項目」分數佔 30%，「實地現場考核」分數佔 70%。

### (三) 考核獎懲：

1. 考核成績函送受督導機關列入年終考績獎懲。獎懲對象為機關相關業務主管及承辦人員等核心成員為主（各直轄市、縣（市）政府以不超過 5 人，特設主管建築機關以不超過 3 人為原則）；本署另將業務考核成果提報相關會議報告。其評分等次依據評核所得分數區分，各機關得視其人事獎懲規定依下列給予每人額度辦理（惟懲處額度不得減少），獎懲原則如次：
  - (1) 特優：評核分數 95 分以上，記功二次。
  - (2) 優等：評核分數 90 分至 94 分，記功一次。
  - (3) 甲等：評核分數 80 分至 89 分，記嘉獎二次。
  - (4) 乙等：評核分數 70 分至 79 分，記嘉獎一次。
  - (5) 丙等：評核分數 60 分至 69 分，不予獎懲。
  - (6) 丁等：評核分數 50 分至 59 分，記申誡一次。
  - (7) 戊等：評核分數 40 分至 49 分，記申誡二次。
  - (8) 己等：評核分數 30 至 39 分以下，記過一次。
  - (9) 庚等：評核分數 29 分以下，記過二次。
2. 實地現場考核前，受考核單位須備齊相關資料向考核小組做行程說明及考核案件之建築物概況及設施項目。
3. 考核結果將由考核單位發布新聞稿，供媒體報導各受考核機關之執行績效；考核成績為特優者，並頒發獎狀勉勵。
4. 業務考核成果納入「下年度行政院主計處所掌（20%分數）中央對台灣省各縣市一般性補助款」之核撥，並納入本署補助地方辦理相關計畫型補助預算之評核。建議經評定成績良好之縣、市政府，由該補助款提撥部分比例充實「建築物無障礙設備與設施改善基金」。

### 七、實地現場考核行程

- (一) 實地現場考核分組、分梯次同時進行，每組由 3~5 位考核委員參與，如遇天候等不可抗力因素無法依原預定時間前往，時間再行調整通知（實地現場考核場次日期，詳如附件六）。
- (二) 實地現場考核前，受督導單位須備齊相關資料向考核小組做行程說明及考核案件之建築物概況及設施項目。
- (三) 受考核單位應於現場實地考核時應備齊下列資料以供委員查核。
  - 1. 新建公共建築物：請受考核單位備齊選定地點之建造執照或使用執照（含無障礙全區配置圖及設施大樣圖及使用執照勘檢紀錄）。
  - 2. 既有公共建築物：改善案件審查通過之書圖資料及勘檢紀錄。
- (四) 有關實地現場考核行程日期另行訂定；現場考核議程（詳如附件七），行程如有變動，另於考核前 2 日通知。

#### 八、考核經費

- (一) 考核委員出席費及考核委員與工作人員交通費、住宿費由受委託辦理單位支應。
- (二) 受委託辦理單位應負責提供租用交通工具供考核小組使用。
- (三) 各機關代表之差旅費，由各單位自行依規定報支。

#### 九、協調配合事項

- (一) 實地現場考核行程中如需協助租用交通工具、代訂住宿及午餐便當，請受考核單位協助配合，並檢附收據向受委託辦理單位核銷。
- (二) 請受考核單位提供場地召開實地現場考核會議。
- (三) 如因天災或事變等不可抗力不可歸責之事由必須延期考核，受委託辦理單位將另行電話通知受考核單位。
- (四) 考核小組謝絕各項禮品或紀念品，請務必配合。

(七) 請受考核單位密切配合受委託辦理單位之相關聯繫及協助事項，如有業務準備或其他配合疑義，請與該單位承辦人聯繫：姚汾涼，聯絡電話：(02) 8771-2688，傳真：(02) 8771-2709，或洽內政部營建署承辦人：陳雅芳，聯絡電話：(02) 8771-2684。

#### 十、其他

本計畫簽報核定後實施，如有未盡事宜另行通知。

## 參、業務督導項目

一、業務考核項目內容

二、業務考核項目成績

三、業務考核項目成果



## 參、業務考核項目

### 一、業務考核項目內容

105 年公共建築物及騎樓無障礙環境 優化計畫（105-108 年）經營建署 105 年 2 月 4 日召會研商獲致決議，並於 105 年 3 月 11 日以營署建管字第 1052903191 號函檢送該優化計畫，各受考核單位填寫自評表並檢附相關佐證資料，於 105 年 6 月 30 日前報署評核。業務考核項目內容如下所示：

#### （一）行政措施

##### 1、改善諮詢及審查小組

##### （1）改善諮詢及審查小組名單及資格

本項依據既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則(以下簡稱替改作業原則)第七條規定：七、公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組應具備下列資格之一：（一）取得內政部營建署於中華民國九十七年七月一日以後委託辦理之公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓講習結業證書。（二）曾擔任內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務督導小組委員連續三年以上。（三）曾擔任各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關勘檢小組委員連續三年以上。（四）相關專業領域之專家學者。

##### （2）諮詢小組遴聘身心障礙者團體比例

本項比照「身心障礙者權益保障法」第 10 條規定，審查諮詢小組委員應遴聘（派）肢體、視覺、聽覺障礙等身心障礙者團體代表，其比例不得小於 40%，法規規定是不得小於三分之一，101 年修改無障礙督導表格會議提高標準為 40%以上。須提供改善諮詢及審查小組名單及符合資格相關證明文件，詳如附件八。如該受考核單位應改善建築物全部改善完成者，仍應組成改善諮

詢及審查小組。檢查肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表類型是否參與，若為多重障別團體可認定為聽覺障礙者團體。

### (3) 諮詢小組會議紀錄

本項目依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則辦理，須提供諮詢小組會議紀錄，考核按照都會型甲組、都會型乙組、城鎮型、偏遠及離島型及特設主管建築機關等類別區分評分標準。如該縣市應改善建築物已全部改善完成者，未召開會議或召開次數不足，本項分數仍可加權計算。

## 2、無障礙設施勘檢作業

### (1) 104 年公共建築物勘檢案件總清冊

依公共建築物無障礙勘檢作業原則(以下簡稱勘檢原則)第二條規定：適用範圍如下：(一)申請新建及增建使用執照之公共建築物。(二)申請變更使用執照提具替代改善計畫之公共建築物。(三)依身心障礙者權益保障法第五十七條第三項規定辦理無障礙設施替代改善計畫之公共建築物。須提供 104 年建築物勘檢案件總清冊，詳如附件九。

### (2) 勘檢小組名單及資格

依勘檢原則第五條規定：勘檢人員應具備下列資格之一：  
(一)取得內政部營建署於中華民國九十七年七月一日以後委託辦理之公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓講習結業證書。(二)曾擔任內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務督導小組委員連續三年以上。(三)曾擔任各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關勘檢小組委員連續三年以上。須提供勘檢小組人員名單及符合資格相關證明文件，詳如附件十。

### (3) 勘檢實務講習簽到紀錄

依勘檢原則第六條規定：當地主管建築機關應對聘任之勘檢人員，辦理至少三個小時之勘檢實務講習。須提供實務講習簽到表。

#### (4) 勘檢實務講習課程表

依勘檢原則第六條規定：當地主管建築機關應對聘任之勘檢人員，辦理至少三個小時之勘檢實務講習，其講習內容如下：

(一) 勘檢注意事項（含勘檢實例錯誤樣態說明）。(二) 勘檢程序。(三) 勘檢任務。(四) 其他相關事項。須提供實務講習課程表。

### 3、分期改善計畫

#### (1) 最新之分期分區改善計畫

本項目依既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則辦理，須提供最新之分期分區改善計畫（須為 105 年之前），詳如附件十一。如逾四年以上未修正計畫者，酌予扣分。

#### (2) 最新分期分區改善計畫同意案之會議紀錄

提供經諮詢審查小組會議通過之最新分期分區改善計畫會議紀錄（須為 105 年之前）。

### 4、無障礙設施改善基金運用情形

#### (1) 基金帳戶收支帳目資料

確認基金帳戶收支帳目資料。

#### (2) 基金委員會小組名單

依建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法（以下簡稱基金管理辦法）第七條規定：基金管理委員會，置主任委員一人，委員十二人至十四人，由主管機關就機關內及其他有

關機關、身心障礙團體代表、專家學者聘兼之。須提供基金管理委員會名單及資格證明文件，詳如附件十二。

### (3) 基金委員會會議紀錄

依基金管理辦法第十條規定：每三個月開會一次，故應檢附 4 次以上會議紀錄。須提供基金委員會會議紀錄，未達 4 次者不給分。

## (二) 改善成果

### 1、104 年改善完成案件數

97 年 6 月 30 日以前既有公共建築物分期分區改善計畫完成案件數，考核按照都會型甲組、都會型乙組及城鎮型、偏遠及離島型等類別區分評分標準。應改善完成案件數低於評分標準，但案件全部改善完成者給 30 分。列管應改善案件使用類組僅餘 B-3、B-4 類者，可正式行文說明，此項目另於其他積極作為計分。須提供改善完成清冊，清冊需載明改善完成核備公文號，詳如附件九。改善完成案件包含採用提具替代改善計畫改善完竣的案件。

### 2、替代改善計畫結案率

替代改善計畫考評採結案率計算，以 103 至 104 年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數（103 年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過而改善期限於 104 年以前完成結案之案件及 104 年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過而改善期限於 104 年 12 月 31 日以前完成結案之案件總數；倘審核通過案件數為 0 件者不給分）為分母，改善完竣案件數（104 年 12 月 31 日以前完成結案之案件數）為分子，計算結案率。應結案之案件數低於評分標準，對照分期分區改善計畫之應改善案件全部改善完成者給 10 分。列管應改善案件使用類組僅餘 B-3、B-4 類者，可正式行文說明，此

項目另於其他積極作為計分。須提供改善計畫審核通過清冊，清冊需載明改善完成核備公文號，改善完成案件數以建築物為計算單位，詳如附件九。既有公共建築物之替代改善計畫之完成時程如非屬考核年度者得不列入當年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數。

### (三) 其他積極作為

#### 1、案例彙編及通則

##### (1) 優良既有建築物改善案例彙編

彙整當年度既有建築物優良改善案例於無障礙專區網頁刊登者，每案 1 分。

##### (2) 無障礙設施設備改善通則

擬訂無障礙設施設備改善通則，該通則經由改善諮詢及審查小組會議通過，並於無障礙專區網頁刊登者（採用此通則改善項目可免提送改善諮詢及審查小組會議），每項通則 1 分。須提供會議紀錄。

#### 2、無障礙生活環境法令說明會

辦理法令說明會，並於無障礙專區網頁公開課程資料，每完成一場得 1 分，須檢附相關資料證明。如該場次人數超過 100 人者，檢附簽到相關資料，則得 2 分。

#### 3、建管人員培訓率

本項目考評採培訓率計算，以核定人數為分母，培訓人數為分子，計算培訓率。須請提供建管人員編制名冊及培訓證號，現編制人員涉及建照、使管人員編制為主，離職、調職、退休不計入。

#### 4、無障礙生活環境缺失通報

提供可隨時通報公共建築物無障礙生活環境缺失管道，依實際辦理情形給分，各項通報方式須檢附相關資料證明。

#### 4、積極作為

- (1) 如辦理優良無障礙建築物評選、訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率、提供 300 平方公尺以上餐廳清冊、其他積極作為，請檢附相關資料證明，依實際辦理成果給分。
- (2) 104 年改善完成案件數改善案件達到標準以上額外增加的數量依規定增加之件數給分。
- (3) 如（二）、改善成果項目，經正式行文說明獲同意者，以該項目實際得分與該項目配分之差額視事實情況給予加權，做為積極作為之加分，其加分之結果可不受配分 14 分之限制。（案例說明：某偏遠及離島型縣市，其考核年度內之改善結案數為 12 件，表定配分為 30 分，實際得分為 6 分，經正式行文說明獲同意該項目得以實際得分與該項目配分之差額百分之八十計算，其積極作為可得分數計算為 $(30-6)*0.8=11.2$ 分)

## 二、業務考核項目成績

### (一) 業務考核項目成績

表 3.2.1 業務考核項目成績表

| 項目       | 評分指標            | 配分 | 得分   | 都會型甲組 |        |       |       |       |       | 都會型乙組 |       |       |
|----------|-----------------|----|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                 |    |      | 1     | 2      | 3     | 4     | 5     | 6     | 1     | 2     | 3     |
|          |                 |    |      | 臺北市   | 新北市    | 桃園市   | 臺中市   | 臺南市   | 高雄市   | 基隆市   | 新竹市   | 嘉義市   |
| 壹、行政措施   | 一、改善諮詢及審查小組     | 9  | 單位自評 | 9     | 9      | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     |
|          |                 |    | 實際得分 | 9     | 9      | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     |
|          | 二、無障礙設施勘檢作業     | 8  | 單位自評 | 8     | 8      | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
|          |                 |    | 實際得分 | 7     | 8      | 8     | 8     | 8     | 7     | 6     | 7     | 8     |
|          | 三、分期改善計畫        | 6  | 單位自評 | 6     | 6      | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
|          |                 |    | 實際得分 | 6     | 6      | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
|          | 四、無障礙設施改善基金運用情形 | 3  | 單位自評 | 3     | 3      | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
|          |                 |    | 實際得分 | 3     | 3      | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2     | 3     |
| 貳、改善成果   | 一、104年改善完成案件數   | 30 | 單位自評 | 30    | 30     | 30    | 30    | 30    | 30    | 12    | 6     | 10    |
|          |                 |    | 實際得分 | 30    | 30     | 30    | 30    | 29    | 30    | 12    | 6     | 10    |
|          | 二、替代改善計畫結案率     | 10 | 單位自評 | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    | 8     | 5     | 10    |
|          |                 |    | 實際得分 | 10    | 10     | 10    | 10    | 6     | 10    | 4     | 6     | 8     |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則       | 12 | 單位自評 | 12    | 12     | 12    | 12    | 12    | 12    | 0     | 12    | 12    |
|          |                 |    | 實際得分 | 12    | 12     | 12    | 12    | 12    | 12    | 0     | 12    | 12    |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會  | 4  | 單位自評 | 4     | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | 2     | 4     | 4     |
|          |                 |    | 實際得分 | 4     | 4      | 4     | 4     | 4     | 4     | 2     | 1     | 2     |
|          | 三、建管人員培訓率       | 2  | 單位自評 | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          |                 |    | 實際得分 | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報   | 2  | 單位自評 | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          |                 |    | 實際得分 | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          | 五、積極作為          | 14 | 單位自評 | 14    | 14     | 14    | 14    | 14    | 14    | 9     | 14    | 14    |
|          |                 |    | 實際得分 | 14    | 14     | 7     | 13    | 6     | 12    | 4     | 5     | 8     |
| 自評得分合計   |                 |    |      | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 61    | 71    | 80    |
| 得分合計     |                 |    |      | 99    | 100    | 93    | 99    | 87    | 97    | 50    | 58    | 70    |
| 加權項目合計   |                 |    |      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 外扣分      |                 |    |      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
| 加權後得分    |                 |    |      | 99.00 | 100.00 | 93.00 | 99.00 | 87.00 | 97.00 | 50.00 | 58.00 | 70.00 |

| 項目       | 評分指標            | 配分 | 得分   | 城鎮型   |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-----------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                 |    |      | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|          |                 |    |      | 宜蘭縣   | 新竹縣   | 苗栗縣   | 彰化縣   | 南投縣   | 雲林縣   | 嘉義縣   | 屏東縣   |
| 壹、行政措施   | 一、改善諮詢及審查小組     | 9  | 單位自評 | 7     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     |
|          |                 |    | 實際得分 | 6     | 8     | 8     | 9     | 9     | 9     | 8     | 9     |
|          | 二、無障礙設施勘檢作業     | 8  | 單位自評 | 4     | 8     | 4     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     |
|          |                 |    | 實際得分 | 4     | 7     | 4     | 7     | 8     | 7     | 7     | 8     |
|          | 三、分期改善計畫        | 6  | 單位自評 | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
|          |                 |    | 實際得分 | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
|          | 四、無障礙設施改善基金運用情形 | 3  | 單位自評 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2     |
|          |                 |    | 實際得分 | 2     | 3     | 3     | 2     | 3     | 3     | 1     | 2     |
| 貳、改善成果   | 一、104年改善完成案件數   | 30 | 單位自評 | 2     | 30    | 4     | 10    | 30    | 30    | 16    | 18    |
|          |                 |    | 實際得分 | 2     | 30    | 4     | 10    | 30    | 30    | 16    | 18    |
|          | 二、替代改善計畫結案率     | 10 | 單位自評 | 10    | 10    | 6     | 10    | 10    | 10    | 6     | 9     |
|          |                 |    | 實際得分 | 6     | 6     | 6     | 1     | 10    | 10    | 6     | 7     |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則       | 12 | 單位自評 | 0     | 12    | 0     | 12    | 12    | 12    | 5     | 12    |
|          |                 |    | 實際得分 | 0     | 12    | 0     | 2     | 12    | 12    | 4     | 12    |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會  | 4  | 單位自評 | 0     | 4     | 0     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     |
|          |                 |    | 實際得分 | 0     | 4     | 0     | 1     | 4     | 4     | 0     | 3     |
|          | 三、建管人員培訓率       | 2  | 單位自評 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          |                 |    | 實際得分 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報   | 2  | 單位自評 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          |                 |    | 實際得分 | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
|          | 五、積極作為          | 14 | 單位自評 | 2     | 11    | 8     | 9     | 14    | 14    | 14    | 6     |
|          |                 |    | 實際得分 | 2     | 9.6   | 3     | 2     | 11    | 7.3   | 2     | 6     |
| 自評得分合計   |                 |    |      | 38    | 97    | 44    | 75    | 100   | 100   | 74    | 77    |
| 得分合計     |                 |    |      | 31    | 89.6  | 38    | 44    | 97    | 92.3  | 54    | 75    |
| 加權項目合計   |                 |    |      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 外扣分      |                 |    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 加權後得分    |                 |    |      | 31.00 | 89.60 | 38.00 | 44.00 | 97.00 | 92.30 | 54.00 | 75.00 |

| 項目       | 評分指標            | 配分 | 得分   | 偏遠及離島型 |       |       |       |      |
|----------|-----------------|----|------|--------|-------|-------|-------|------|
|          |                 |    |      | 1      | 2     | 3     | 4     | 5    |
|          |                 |    |      | 花蓮縣    | 臺東縣   | 澎湖縣   | 金門縣   | 連江縣  |
| 壹、行政措施   | 一、改善諮詢及審查小組     | 9  | 單位自評 | 6      | 9     | 9     | 9     | 6    |
|          |                 |    | 實際得分 | 6      | 8     | 9     | 8     | 3    |
|          | 二、無障礙設施勘檢作業     | 8  | 單位自評 | 8      | 8     | 8     | 8     | 4    |
|          |                 |    | 實際得分 | 4      | 8     | 4     | 8     | 4    |
|          | 三、分期改善計畫        | 6  | 單位自評 | 6      | 6     | 6     | 6     | 3    |
|          |                 |    | 實際得分 | 6      | 6     | 6     | 6     | 0    |
|          | 四、無障礙設施改善基金運用情形 | 3  | 單位自評 | 2      | 2     | 2     | 3     | 2    |
|          |                 |    | 實際得分 | 2      | 2     | 2     | 2     | 2    |
| 貳、改善成果   | 一、104年改善完成案件數   | 30 | 單位自評 | 8      | 8     | 30    | 30    | 0    |
|          |                 |    | 實際得分 | 8      | 8     | 30    | 30    | 0    |
|          | 二、替代改善計畫結案率     | 10 | 單位自評 | 0      | 8     | 10    | 10    | 0    |
|          |                 |    | 實際得分 | 0      | 8     | 10    | 10    | 0    |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則       | 12 | 單位自評 | 0      | 12    | 12    | 12    | 0    |
|          |                 |    | 實際得分 | 0      | 12    | 12    | 12    | 0    |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會  | 4  | 單位自評 | 1      | 1     | 1     | 4     | 0    |
|          |                 |    | 實際得分 | 0      | 1     | 0     | 2     | 0    |
|          | 三、建管人員培訓率       | 2  | 單位自評 | 2      | 2     | 2     | 2     | 2    |
|          |                 |    | 實際得分 | 2      | 2     | 2     | 2     | 2    |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報   | 2  | 單位自評 | 2      | 2     | 2     | 2     | 2    |
|          |                 |    | 實際得分 | 2      | 2     | 1     | 2     | 2    |
|          | 五、積極作為          | 14 | 單位自評 | 10     | 33.2  | 14    | 14    | 1    |
|          |                 |    | 實際得分 | 0      | 5     | 5     | 14    | 1    |
| 自評得分合計   |                 |    |      | 45     | 91.2  | 96    | 100   | 20   |
| 得分合計     |                 |    |      | 30     | 62    | 81    | 96    | 14   |
| 加權項目合計   |                 |    |      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0    |
| 外扣分      |                 |    |      |        |       |       |       | -5   |
| 加權後得分    |                 |    |      | 30.00  | 62.00 | 81.00 | 96.00 | 9.00 |

## (二) 業務考核項目填報資料

表 3.2.2 業務考核項目填報資料表

| 項目     | 評分指標            | 成果                                   | 都會型(甲組)                                     |           |         |         |         |            |         |
|--------|-----------------|--------------------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|
|        |                 |                                      | 1   | 2         | 3       | 4       | 5       | 6          |         |
|        |                 |                                      | 臺北市   | 新北市       | 桃園市     | 臺中市     | 臺南市     | 高雄市        |         |
| 壹、行政措施 | 一、改善諮詢及審查小組     | 1. 改善諮詢及審查小組名單及資格                    | ○   | ○         | ○       | ○       | ○       | ○          |         |
|        |                 | 2. 諮詢小組遴聘身心障礙者團體比例：審查諮詢小組委員共__位(A)   | 16  | 20        | 7       | 18      | 15      | 17         |         |
|        |                 | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表：__位(B)               | 7   | 10        | 5       | 8       | 6       | 7          |         |
|        |                 | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表是否完整                  | ○   | ○         | ○       | ○       | ○       | ○          |         |
|        |                 | 比例：(B) / (A) × 100% = __ % (不得小於40%) | 43.75%                                      | 50.00%    | 71.43%  | 44.44%  | 40.00%  | 41.18%     |         |
|        |                 | 3. 諮詢小組會議紀錄(次)                       | 16  | 14        | 6       | 6       | 6       | 7          |         |
|        | 二、無障礙設施勘檢作業     | 1. 104年公共建築物勘檢案件總清冊(件)               | 304   | 135       | 96      | 229     | 95      | 235        |         |
|        |                 | 2. 勘檢小組名單及資格(人)                      | 213   | 125       | 6       | 11      | 21      | 14         |         |
|        |                 | 3. 勘檢實務講習紀錄：辦理勘檢講習                   | ○   | ○         | ○       | ○       | ○       | ○          |         |
|        |                 | 3-1. 勘檢實務講習紀錄：是否全員出席                 | ×   | ○         | ○       | ○       | ○       | ×          |         |
|        |                 | 4. 勘檢實務講習課程表                         | ○   | ○         | ○       | ○       | ○       | ○          |         |
|        | 三、分期改善計畫        | 1. 最新之分期分區改善計畫                       | ○   | ○         | ○       | ○       | ○       | ○          |         |
|        |                 | 2. 最新分期分區改善計畫同意案之會議紀錄                | ○   | ○         | ○       | ○       | ○       | ○          |         |
|        | 四、無障礙設施改善基金運用情形 | 1. 基金帳戶收支帳目資料(元)                     | 37,612,000                                  | 3,215,035 | 291,000 | 365,542 | 951,380 | 10,088,232 |         |
|        |                 | 2. 基金委員會小組名單(人)                      | 15  | 15        | 13      | 13      | 12      | 15         |         |
|        |                 | 3. 基金委員會會議紀錄(次)                      | 4   | 4         | 4       | 4       | 4       | 7          |         |
|        | 貳、改善成果          | 一、104年改善完成案件數                        | 104年改善完成案件數(件)                              | 492       | 224     | 207     | 207     | 193        | 320     |
|        |                 | 二、替代改善計畫結案率                          | 1. 103-104年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數(件)(A) | 78        | 50      | 53      | 52      | 11         | 56      |
|        |                 |                                      | 2. 結案數(件)(B)                                | 72        | 46      | 46      | 52      | 11         | 56      |
|        |                 |                                      | 3. 結案率：(B) / (A) × 100% = __ %              | 92.31%    | 92.00%  | 86.79%  | 100.00% | 100.00%    | 100.00% |

註：南投縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣之應改善完成案件(B-3、B-4類除外)已全部改善完成。

| 項目       | 評分指標           | 成果                                    | 都會型(甲組) |         |         |         |        |         |
|----------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|          |                |                                       | 1       | 2       | 3       | 4       | 5      | 6       |
|          |                |                                       | 臺北市     | 新北市     | 桃園市     | 臺中市     | 臺南市    | 高雄市     |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則      | 1. 優良既有建築物改善案例彙編：共__案                 | 64      | 9       | 11      | 8       | 8      | 8       |
|          |                | 2. 無障礙設施設備改善通則：共__項                   | 6       | 23      | 9       | 11      | 5      | 5       |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會 | 1. 辦理法令說明會，並於無障礙專區網頁公開課程資料：共__場       | 3       | 4       | 0       | 4       | 2      | 4       |
|          |                | 2. 法令說明會場次人數超過100人者，檢附簽到相關資料：共__場     | 1       | 1       | 2       | 0       | 2      | 0       |
|          | 三、建管人員培訓率      | 1. 核定人數__人(A)                         | 111     | 99      | 54      | 58      | 17     | 67      |
|          |                | 2. 培訓人數__人(B)                         | 110     | 99      | 54      | 58      | 15     | 67      |
|          |                | 3. 培訓率：(B) / (A) × 100% = __ %        | 99.10%  | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.24% | 100.00% |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報  | 公共建築物無障礙生活環境缺失通報方式(種)                 | 3       | 5       | 3       | 4       | 2      | 4       |
|          | 五、積極作為         | 1. 辦理優良無障礙建築物評選                       | ×       | ×       | ○       | ○       | ×      | ×       |
|          |                | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率                      | ×       | ○       | ○       | ○       | ×      | ×       |
|          |                | 提供300平方公尺以上餐廳清冊(間)                    | ×       | 76      | 27      | 213     | 108    | 107     |
|          |                | 其他積極作為(項)                             | 8       | 9       | 0       | 6       | 4      | 4       |
|          |                | 2. 104年改善完成案件數達標準以上加分：104年改善完成案件數共__件 | 492     | 224     | ×       | ×       | ×      | 320     |
|          |                | 3. 改善成果項目經正式行文說明獲同意者，給予加權             | ×       | ×       | ×       | ×       | ×      | ×       |

| 項目     | 評分指標  | 成果                                   | 都會型(乙組)                                     |          |         | 城鎮型       |         |         |         |
|--------|---|--------------------------------------|---|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|        |   |                                      | 1   | 2        | 3       | 1         | 2       | 3       |         |
|        |   |                                      | 基隆市   | 新竹市      | 嘉義市     | 宜蘭縣       | 新竹縣     | 苗栗縣     |         |
| 壹、行政措施 | 一、改善諮詢及審查小組                                   | 1. 改善諮詢及審查小組名單及資格                    | ○   | ○        | ○       | ○         | ○       | ○       |         |
|        |   | 2. 諮詢小組遴聘身心障礙者團體比例：審查諮詢小組委員共__位(A)   | 11  | 12       | 15      | 15        | 19      | 14      |         |
|        |   | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表：__位(B)               | 5   | 5        | 6       | 6         | 8       | 7       |         |
|        |   | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表是否完整                  | ○   | ○        | ○       | ○         | ×       | ×       |         |
|        |   | 比例：(B) / (A) × 100% = __ % (不得小於40%) | 45.45%                                      | 41.67%   | 40.00%  | 40.00%    | 42.11%  | 50.00%  |         |
|        |   | 3. 諮詢小組會議紀錄(次)                       | 4   | 5        | 4       | 1         | 4       | 4       |         |
|        | 二、無障礙設施勘檢作業                                   | 1. 104年公共建築物勘檢案件總清冊(件)               | 17  | 35       | 19      | 45        | 212     | 128     |         |
|        |   | 2. 勘檢小組名單及資格(人)                      | 14  | 15       | 15      | 23        | 13      | 31      |         |
|        |   | 3. 勘檢實務講習紀錄：辦理勘檢講習                   | ○   | ○        | ○       | ×         | ○       | ×       |         |
|        |   | 3-1. 勘檢實務講習紀錄：是否全員出席                 | ○   | ×        | ○       | ×         | ×       | ×       |         |
|        |   | 4. 勘檢實務講習課程表                         | ×   | ○        | ○       | ×         | ○       | ×       |         |
|        | 三、分期改善計畫                                      | 1. 最新之分期分區改善計畫                       | ○   | ○        | ○       | ○         | ○       | ○       |         |
|        |   | 2. 最新分期分區改善計畫同意案之會議紀錄                | ○   | ○        | ○       | ○         | ○       | ○       |         |
|        | 四、無障礙設施改善基金運用情形                               | 1. 基金帳戶收支帳目資料(元)                     | 1,122,268                                   | 基金轉為公務預算 | 91,295  | 1,016,687 | 304,229 | 401,400 |         |
|        |   | 2. 基金委員會小組名單(人)                      | 13  | 11       | 15      | 15        | 15      | 15      |         |
|        |   | 3. 基金委員會會議紀錄(次)                      | 4   | 4        | 4       | 1         | 4       | 4       |         |
|        | 貳、改善成果  | 一、104年改善完成案件數                        | 104年改善完成案件數(件)                              | 44       | 17      | 34        | 2       | 179     | 11      |
|        |   | 二、替代改善計畫結案率                          | 1. 103-104年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數(件)(A) | 14       | 6       | 19        | 2       | 10      | 4       |
|        |   |                                      | 2. 結案數(件)(B)                                | 10       | 6       | 19        | 2       | 9       | 4       |
|        |   |                                      | 3. 結案率：(B) / (A) × 100% = __ %              | 71.43%   | 100.00% | 100.00%   | 100.00% | 90.00%  | 100.00% |
|        | 註：南投縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣之應改善完成案件(B-3、B-4類除外)已全部改善完成。 |                                      |   |          |         |           |         |         |         |

| 項目       | 評分指標           | 成果                                    | 都會型(乙組) |         |         | 城鎮型    |         |         |
|----------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
|          |                |                                       | 1       | 2       | 3       | 1      | 2       | 3       |
|          |                |                                       | 基隆市     | 新竹市     | 嘉義市     | 宜蘭縣    | 新竹縣     | 苗栗縣     |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則      | 1. 優良既有建築物改善案例彙編：共__案                 | 0       | 10      | 9       | 0      | 10      | 0       |
|          |                | 2. 無障礙設施設備改善通則：共__項                   | 0       | 7       | 4       | 0      | 5       | 0       |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會 | 1. 辦理法令說明會，並於無障礙專區網頁公開課程資料：共__場       | 2       | 1       | 2       | 0      | 1       | 0       |
|          |                | 2. 法令說明會場次人數超過100人者，檢附簽到相關資料：共__場     | 0       | 0       | 0       | 0      | 2       | 0       |
|          | 三、建管人員培訓率      | 1. 核定人數__人(A)                         | 18      | 14      | 4       | 17     | 16      | 12      |
|          |                | 2. 培訓人數__人(B)                         | 17      | 14      | 4       | 14     | 16      | 12      |
|          |                | 3. 培訓率：(B) / (A) × 100% = __ %        | 94.44%  | 100.00% | 100.00% | 82.35% | 100.00% | 100.00% |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報  | 公共建築物無障礙生活環境缺失通報方式(種)                 | 2       | 4       | 2       | 1      | 4       | 2       |
|          | 五、積極作為         | 1. 辦理優良無障礙建築物評選                       | ×       | ×       | ×       | ×      | ×       | ×       |
|          |                | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率                      | ×       | ×       | ○       | ×      | ○       | ×       |
|          |                | 提供300平方公尺以上餐廳清冊(間)                    | 21      | 43      | 11      | 6      | 44      | 35      |
|          |                | 其他積極作為(項)                             | 2       | 3       | 4       | 0      | 2       | 1       |
|          |                | 2. 104年改善完成案件數達標準以上加分：104年改善完成案件數共__件 | ×       | ×       | ×       | ×      | 179     | ×       |
|          |                | 3. 改善成果項目經正式行文說明獲同意者，給予加權             | ×       | ×       | ×       | ×      | ×       | ×       |

| 項目     | 評分指標  | 成果                                 | 城鎮型   |         |         |         |         |         |
|--------|---|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |   |                                    | 4   | 5       | 6       | 7       | 8       |         |
|        |   |                                    | 彰化縣   | 南投縣     | 雲林縣     | 嘉義縣     | 屏東縣     |         |
| 壹、行政措施 | 一、改善諮詢及審查小組                                   | 1. 改善諮詢及審查小組名單及資格                  | ○   | ○       | ○       | ○       | ○       |         |
|        |   | 2. 諮詢小組遴聘身心障礙者團體比例：審查諮詢小組委員共__位(A) | 37  | 12      | 9       | 12      | 15      |         |
|        |   | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表：__位(B)             | 17  | 6       | 4       | 5       | 6       |         |
|        |   | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表是否完整                | ○   | ○       | ○       | ×       | ○       |         |
|        |   | 比例：(B) / (A) × 100% = __%(不得小於40%) | 45.95%                                      | 50.00%  | 44.44%  | 41.67%  | 40.00%  |         |
|        |   | 3. 諮詢小組會議紀錄(次)                     | 4   | 5       | 4       | 4       | 11      |         |
|        | 二、無障礙設施勘檢作業                                   | 1. 104年公共建築物勘檢案件總清冊(件)             | 58  | 74      | 30      | 64      | 45      |         |
|        |   | 2. 勘檢小組名單及資格(人)                    | 63  | 12      | 13      | 13      | 9       |         |
|        |   | 3. 勘檢實務講習紀錄：辦理勘檢講習                 | ○   | ○       | ○       | ○       | ○       |         |
|        |   | 3-1. 勘檢實務講習紀錄：是否全員出席               | ×   | ○       | ×       | ×       | ○       |         |
|        |   | 4. 勘檢實務講習課程表                       | ○   | ○       | ○       | ○       | ○       |         |
|        | 三、分期改善計畫                                      | 1. 最新之分期分區改善計畫                     | ○   | ○       | ○       | ○       | ○       |         |
|        |   | 2. 最新分期分區改善計畫同意案之會議紀錄              | ○   | ○       | ○       | ○       | ○       |         |
|        | 四、無障礙設施改善基金運用情形                               | 1. 基金帳戶收支帳目資料(元)                   | 1,212,219                                   | 175,691 | 235,423 | 506,587 | 473,230 |         |
|        |   | 2. 基金委員會小組名單(人)                    | 14  | 20      | 13      | 7       | 13      |         |
|        |   | 3. 基金委員會會議紀錄(次)                    | 1   | 4       | 4       | 0       | 2       |         |
|        | 貳、改善成果  | 一、104年改善完成案件數                      | 104年改善完成案件數(件)                              | 37      | 80      | 156     | 67      | 71      |
|        |   | 二、替代改善計畫結案率                        | 1. 103-104年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數(件)(A) | 10      | 27      | 7       | 36      | 15      |
|        |   |                                    | 2. 結案數(件)(B)                                | 4       | 27      | 7       | 21      | 15      |
|        |   |                                    | 3. 結案率：(B) / (A) × 100% = __%               | 40.00%  | 100.00% | 100.00% | 58.33%  | 100.00% |
|        | 註：南投縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣之應改善完成案件(B-3、B-4類除外)已全部改善完成。 |                                    |   |         |         |         |         |         |

| 項目       | 評分指標           | 成果                                    | 城鎮型     |         |         |        |         |
|----------|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
|          |                |                                       | 4       | 5       | 6       | 7      | 8       |
|          |                |                                       | 彰化縣     | 南投縣     | 雲林縣     | 嘉義縣    | 屏東縣     |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則      | 1. 優良既有建築物改善案例彙編：共__案                 | 1       | 20      | 8       | 4      | 8       |
|          |                | 2. 無障礙設施設備改善通則：共__項                   | 1       | 4       | 5       | 0      | 7       |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會 | 1. 辦理法令說明會，並於無障礙專區網頁公開課程資料：共__場       | 1       | 3       | 2       | 0      | 1       |
|          |                | 2. 法令說明會場次人數超過100人者，檢附簽到相關資料：共__場     | 0       | 1       | 2       | 0      | 1       |
|          | 三、建管人員培訓率      | 1. 核定人數__人(A)                         | 7       | 11      | 8       | 18     | 8       |
|          |                | 2. 培訓人數__人(B)                         | 7       | 11      | 8       | 16     | 8       |
|          |                | 3. 培訓率：(B) / (A) × 100% = __ %        | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% | 100.00% |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報  | 公共建築物無障礙生活環境缺失通報方式(種)                 | 2       | 3       | 4       | 2      | 4       |
|          | 五、積極作為         | 1. 辦理優良無障礙建築物評選                       | ×       | ○       | ×       | ×      | ×       |
|          |                | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率                      | ×       | ○       | ×       | ×      | ×       |
|          |                | 提供300平方公尺以上餐廳清冊(間)                    | 2       | 43      | 45      | 30     | 7       |
|          |                | 其他積極作為(項)                             | 0       | 4       | 3       | ×      | 4       |
|          |                | 2. 104年改善完成案件數達標準以上加分：104年改善完成案件數共__件 | ×       | ×       | 156     | ×      | ×       |
|          |                | 3. 改善成果項目經正式行文說明獲同意者，給予加權             | ×       | ×       | ×       | ×      | ×       |

| 項目     | 評分指標  | 成果                                 | 偏遠及離島型                                      |         |         |           |        |       |
|--------|---|------------------------------------|---|---------|---------|-----------|--------|-------|
|        |   |                                    | 1   | 2       | 3       | 4         | 5      |       |
|        |   |                                    | 花蓮縣   | 臺東縣     | 澎湖縣     | 金門縣       | 連江縣    |       |
| 壹、行政措施 | 一、改善諮詢及審查小組                                   | 1. 改善諮詢及審查小組名單及資格                  | ○   | ○       | ○       | ○         | ○      |       |
|        |   | 2. 諮詢小組遴聘身心障礙者團體比例：審查諮詢小組委員共__位(A) | 18  | 10      | 10      | 10        | 12     |       |
|        |   | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表：__位(B)             | 7   | 4       | 4       | 4         | 1      |       |
|        |   | 肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表是否完整                | ×   | ×       | ○       | ×         | ×      |       |
|        |   | 比例：(B) / (A) × 100% = __%(不得小於40%) | 38.89%                                      | 40.00%  | 40.00%  | 40.00%    | 8.33%  |       |
|        |   | 3. 諮詢小組會議紀錄(次)                     | 2   | 7       | 2       | 3         | 0      |       |
|        | 二、無障礙設施勘檢作業                                   | 1. 104年公共建築物勘檢案件總清冊(件)             | 18  | 25      | 17      | 15        | 3      |       |
|        |   | 2. 勘檢小組名單及資格(人)                    | 24  | 12      | 9       | 10        | 4      |       |
|        |   | 3. 勘檢實務講習紀錄：辦理勘檢講習                 | ×   | ○       | ×       | ○         | ×      |       |
|        |   | 3-1. 勘檢實務講習紀錄：是否全員出席               | ×   | ○       | ×       | ○         | ×      |       |
|        |   | 4. 勘檢實務講習課程表                       | ×   | ○       | ×       | ○         | ×      |       |
|        | 三、分期改善計畫                                      | 1. 最新之分期分區改善計畫                     | ○   | ○       | ○       | ○         | ×      |       |
|        |   | 2. 最新分期分區改善計畫同意案之會議紀錄              | ○   | ○       | ○       | ○         | ×      |       |
|        | 四、無障礙設施改善基金運用情形                               | 1. 基金帳戶收支帳目資料(元)                   | 347,735                                     | 389,831 | 557,372 | 7,227,311 | 70,000 |       |
|        |   | 2. 基金委員會小組名單(人)                    | 14  | 13      | 12      | 13        | 12     |       |
|        |   | 3. 基金委員會會議紀錄(次)                    | 0   | 1       | 0       | 1         | 0      |       |
|        | 貳、改善成果  | 一、104年改善完成案件數                      | 104年改善完成案件數(件)                              | 18      | 17      | 11        | 150    | 0     |
|        |   | 二、替代改善計畫結案率                        | 1. 103-104年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數(件)(A) | 0       | 6       | 11        | 0      | 0     |
|        |   |                                    | 2. 結案數(件)(B)                                | 0       | 6       | 11        | 0      | 0     |
|        |   |                                    | 3. 結案率：(B) / (A) × 100% = __%               | 0.00%   | 100.00% | 100.00%   | ※      | 0.00% |
|        | 註：南投縣、雲林縣、澎湖縣、金門縣之應改善完成案件(B-3、B-4類除外)已全部改善完成。 |                                    |   |         |         |           |        |       |

| 項目       | 評分指標           | 成果                                    | 偏遠及離島型 |        |         |         |         |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|          |                |                                       | 1      | 2      | 3       | 4       | 5       |
|          |                |                                       | 花蓮縣    | 臺東縣    | 澎湖縣     | 金門縣     | 連江縣     |
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則      | 1. 優良既有建築物改善案例彙編：共__案                 | 0      | 12     | 9       | 10      | 0       |
|          |                | 2. 無障礙設施設備改善通則：共__項                   | 0      | 4      | 6       | 5       | 0       |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會 | 1. 辦理法令說明會，並於無障礙專區網頁公開課程資料：共__場       | 0      | 1      | 0       | 2       | 0       |
|          |                | 2. 法令說明會場次人數超過100人者，檢附簽到相關資料：共__場     | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
|          | 三、建管人員培訓率      | 1. 核定人數__人(A)                         | 6      | 6      | 5       | 12      | 4       |
|          |                | 2. 培訓人數__人(B)                         | 5      | 5      | 5       | 12      | 4       |
|          |                | 3. 培訓率：(B) / (A) × 100% = __ %        | 83.33% | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報  | 公共建築物無障礙生活環境缺失通報方式(種)                 | 4      | 2      | 1       | 4       | 2       |
|          | 五、積極作為         | 1. 辦理優良無障礙建築物評選                       | ×      | ×      | ×       | ×       | ×       |
|          |                | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率                      | ×      | ○      | ○       | ×       | ×       |
|          |                | 提供300平方公尺以上餐廳清冊(間)                    | ×      | 20     | 4       | 10      | ×       |
|          |                | 其他積極作為(項)                             | 0      | 1      | 1       | 2       | 1       |
|          |                | 2. 104年改善完成案件數達標準以上加分：104年改善完成案件數共__件 | ×      | ×      | ×       | 150     | ×       |
|          |                | 3. 改善成果項目經正式行文說明獲同意者，給予加權             | ×      | ×      | ×       | ×       | ×       |

### 三、業務考核項目成果

#### (一) 行政措施考核成果

表 3.3.1 行政措施業務評分指標得分率統計表

| 項目         | 評分指標            | 配分 | 都會型<br>得分率 | 城鎮型<br>得分率 | 偏遠及離島<br>型得分率 | 圖例  |
|------------|-----------------|----|------------|------------|---------------|-----|
| 壹、<br>行政措施 | 一、改善諮詢及審查小組     | 9  | 100.00%    | 91.67%     | 75.56%        | 1-1 |
|            | 二、無障礙設施勘檢作業     | 8  | 93.06%     | 81.25%     | 70.00%        | 1-2 |
|            | 三、分期改善計畫        | 6  | 100.00%    | 100.00%    | 80.00%        | 1-3 |
|            | 四、無障礙設施改善基金運用情形 | 3  | 96.30%     | 79.17%     | 66.67%        | 1-4 |
|            | 分數小計            | 26 | 97.44%     | 88.94%     | 73.85%        |     |

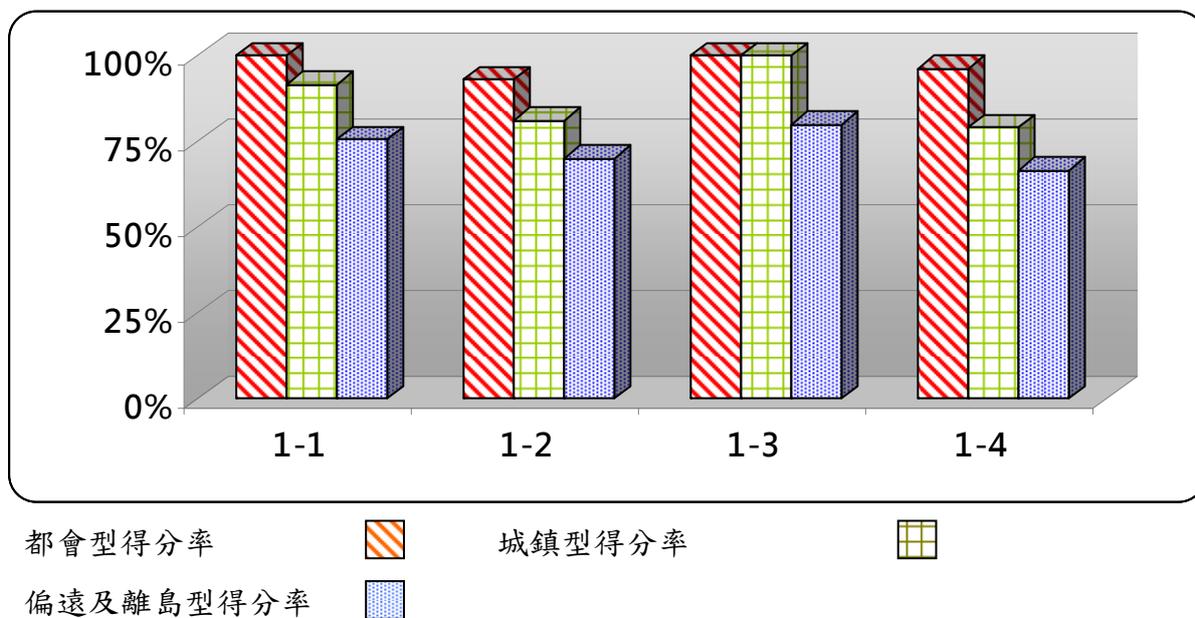


圖 3.3.1 行政措施業務評分指標得分率統計圖

#### 1、改善諮詢及審查小組

諮詢小組遴聘身心障礙者團體比例項目，花蓮縣政府、連江縣政府身心障礙者團體所佔比例未達 40%。肢體、視覺、聽覺障礙者等每種障別之需求不同，7 個單位在聘任改善諮詢及審查小組委員時缺少部份障別；諮詢小組會議紀錄項目，考核按照都會型甲組、都會型乙組、城鎮型、偏遠及離島型等類別區分評分標準，共計 17 個單位達到本項目滿分標準。

## 2、無障礙設施勘檢作業

無障礙設施勘檢作業中，104 年公共建築物勘檢案件總清冊項目，各單位資料完整；勘檢實務講習紀錄項目，除宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、澎湖縣及連江縣政府未辦理勘檢實務講習；勘檢實務講習中，共計 7 個單位之勘檢小組委員未能全員到課。

## 3、分期改善計畫

分期分區改善計畫項目，除連江縣政府，各單位皆完成分期分區改善計畫並檢附相關同意案之會議紀錄。

## 4、無障礙設施改善基金運用情形

基金帳戶收支帳目資料項目，新竹市政府基金為公務預算逐年編列經費，其餘各單位皆有基金運作資料；基金委員會小組名單項目，新竹市及嘉義縣政府人數不足；基金委員會會議紀錄，開會次數位達 4 次以上者共計 13 個單位（偏遠及離島型單位皆未超過 1 次），本子項目多數單位未能達成目標，為基金運用情形主要扣分原因。

### （二）改善成果考核成果

表 3.3.2 改善成果業務評分指標得分率統計表

| 項目             | 評分指標               | 配分 | 都會型<br>得分率 | 城鎮型<br>得分率 | 偏遠及離島<br>型得分率 | 圖例  |
|----------------|--------------------|----|------------|------------|---------------|-----|
| 貳、<br>改善<br>成果 | 一、104 年改善完成案件<br>數 | 30 | 76.67%     | 58.33%     | 50.67%        | 2-1 |
|                | 二、替代改善計畫結案<br>率    | 10 | 82.22%     | 65.00%     | 56.00%        | 2-2 |
|                | 分數小計               | 40 | 78.06%     | 60.00%     | 52.00%        |     |

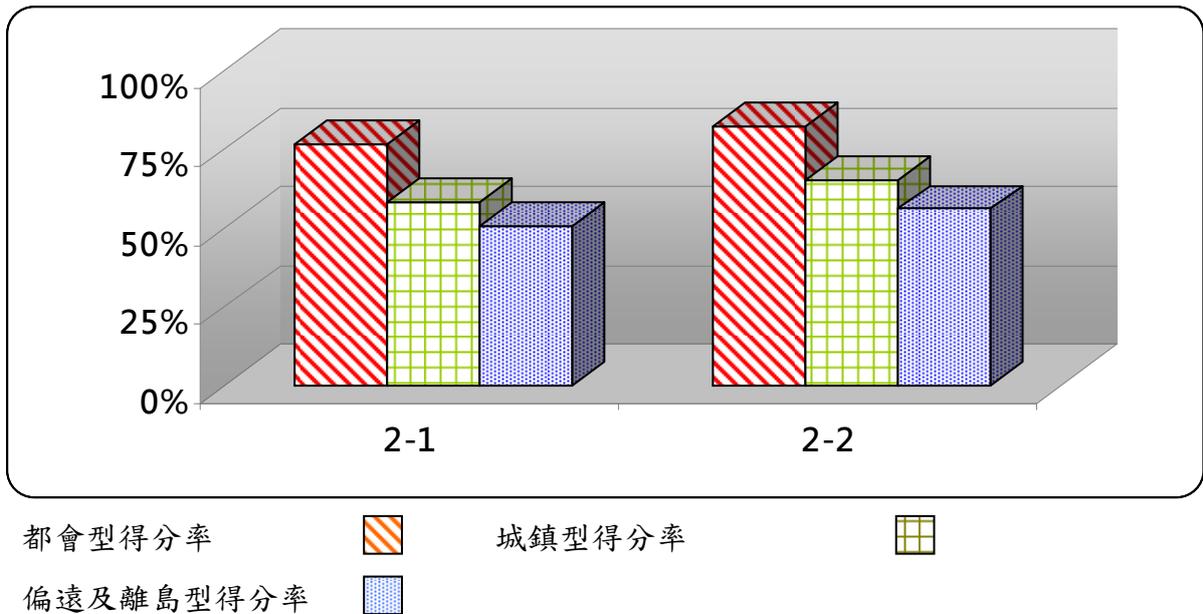


圖 3.3.2 改善成果業務評分指標得分率統計圖

### 1、104 年改善完成案件數

104 年改善完成案件數項目，考核按照都會型甲組、都會型乙組及城鎮型、偏遠及離島型等類別區分評分標準，10 個單位達到滿分 30 分，都會型得分率為甲乙組合併計算，由於本項目為本督導核心工作之一，配分最高，執行成效差距直接影響業務督導成果，共有 12 個單位達成得分 18 分以上（約 64% 得分率），基隆市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣及連江政府等未達成，應加強辦理。

### 2、替代改善計畫結案率

替代改善計畫完成率項目，9 個單位達到滿分，彰化縣、嘉義縣、花蓮縣及連江縣政府得分率未達 60%，其中花蓮縣政府結案件數為 0 件，連江縣政府未召開諮詢小組會議，應加強改善。

### (三) 其他積極作為考核成果

表 3.3.3 其他積極作為業務評分指標得分率統計表

| 項目       | 評分指標           | 配分 | 都會型<br>得分率 | 城鎮型<br>得分率 | 偏遠及離島<br>型得分率 | 圖例  |
|----------|----------------|----|------------|------------|---------------|-----|
| 參、其他積極作為 | 一、案例彙編及通則      | 12 | 88.89%     | 56.25%     | 60.00%        | 3-1 |
|          | 二、無障礙生活環境法令說明會 | 4  | 80.56%     | 50.00%     | 15.00%        | 3-2 |
|          | 三、建管人員培訓率      | 2  | 100.00%    | 100.00%    | 100.00%       | 3-3 |
|          | 四、無障礙生活環境缺失通報  | 2  | 100.00%    | 93.75%     | 90.00%        | 3-4 |
|          | 五、積極作為         | 14 | 65.87%     | 38.30%     | 35.71%        | 3-5 |
|          | 分數小計           | 34 | 79.74%     | 52.90%     | 48.82%        |     |

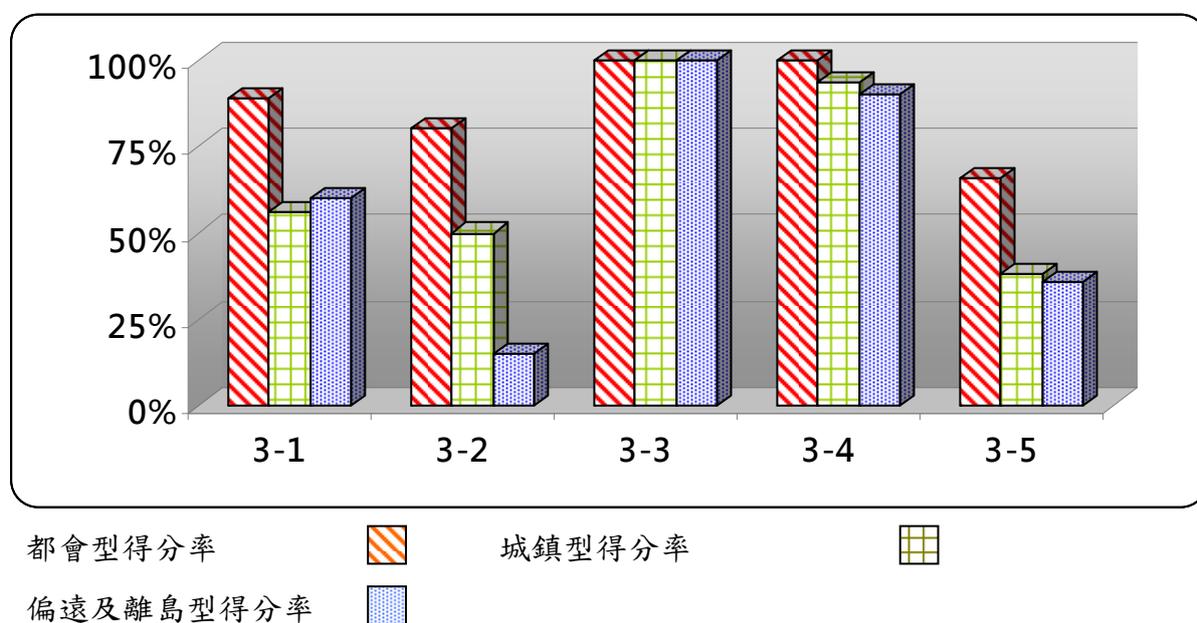


圖 3.3.3 其他積極作為業務評分指標得分率統計圖

#### 1、案例彙編及通則

案例彙編及通則為本次考核新增項目，計有 15 個單位達到滿分 12 分（都會型甲組全數滿分），基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣及連江縣政府等無任何案例彙編及通則，應盡速補完並刊登於無障礙專區網頁。

#### 2、無障礙生活環境法令說明會

原無障礙生活環境宣導項目於本次考核改為無障礙生活環境法令說明會，著重於辦理法令說明部分，並應將課程資料公開於無障礙專區網頁，單純配合其他單位辦理宣導活動或製作成果專輯、手冊、各類文宣或小贈品等不納入計分。基隆市政府、宜蘭縣政府成績未能得滿分 6 分其餘各單位皆積極完成宣導工作。

### 3、建管人員培訓率

全部 22 個受考核單位皆達到滿分 2 分，辦理成效良好。

### 4、無障礙生活環境缺失通報

無障礙生活環境缺失通報項目是供可隨時通報公共建築物無障礙生活環境缺失情形方式，僅宜蘭縣及澎湖縣政府未能提供 2 種以上缺失通報方式，其餘各單位皆達到滿分。

### 5、積極作為

積極作為項目是為鼓勵各單位推動無障礙業務，辦理優良無障礙建築物評選、訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率、提供營業面積 300 平方公尺以上餐廳清冊、其他積極作為（以 104 年內完成之建築基地內及騎樓相關項目為原則，提供無障礙捐款帳戶、交通巡查及取締停車位占用等不列入得分）、104 年改善完成案件數額外增加數量等皆採計分數；達成滿分 14 分的單位計有台北市、新北市及金門縣政府等 3 個單位，未達 7 分（50%得分率）的單位共計 12 單位，基隆市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、花蓮縣及連江縣政府得分偏低。各受考核單位積極作為得分狀況詳如下表：

表 3.3.4 其他積極作為得分項目表

| 受考核單位 | 項次           | 策進作為<br>(項次1：辦理評選、訂有巡查機制及頻率、提供餐廳清冊，項次2：104年改善完成案件數達標準以上加分，項次3：改善成果經同意者加權，未註明：其他) |
|-------|--------------|--|
| 台北市   | 2            | 104年改善完成案件數共492件，增加(492-200)/20=14.6分  |
|       |              | 公有建築物(機關學校)無障礙設施複查計畫。  |
|       |              | 臺北市104年度學校無障礙環境設計規劃研習會。  |
|       |              | 臺北市歷年騎樓改善成果彙整。   |
|       |              | 訂定臺北市公共廁所視覺障礙者引導設施設計準則。  |
|       |              | 臺北市公共建築物無障礙設施設置宣導手冊。   |
|       |              | 臺北市高齡友善城市計畫宣導手冊。   |
|       |              | 臺北市公共建築物無障礙法令輯要。   |
|       |              | 臺北市原有住宅無障礙設施改善費用補助申請手冊。  |
| 新北市   | 1            | 辦理優良無障礙建築物評選：計劃於104年核定，活動於105年3月底前辦理完成   |
|       | 1            | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率   |
|       | 1            | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       | 2            | 104年公共建築物改善完成案件清冊共224件，增加(224-200)/20=1.2分。                                      |
|       |              | 辦理104新北市活躍樂齡論壇研討會  |
|       |              | 辦理104年度新北市政府機車退出騎樓專案   |
|       |              | 補助104年度無障礙宣導短片製作(由無障礙基金撥款)   |
|       |              | 辦理104年度無障礙宣導繪本電子書製作(由無障礙基金撥款)  |
|       |              | 辦理104年度新北市優良公寓大廈評選活動計畫-內含行動不便(無障礙設施之管理維護)  |
|       |              | 印製建築物無障礙設施設計規範   |
|       |              | 印製公共建築物無障礙生活環境宣導手冊   |
| 桃園市   | 1            | 辦理優良無障礙建築物評選：辦理優良無障礙公寓大廈評選。  |
|       | 1            | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率   |
|       | 1            | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
| 台中市   | 1            | 辦理優良無障礙建築物評選：臺中市無障礙友善環境評選活動  |
|       | 1            | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率   |
|       | 1            | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |              | 臺中市建築物無障礙設施勘檢及替代改善計畫審查作業收費標準   |
|       |              | 既有公共建築物無障礙設施檢查暨輔導執行計畫檢查記錄表   |
|       |              | 新建公共建築物無障礙設施設備圖說加審表  |
|       |              | 核發友善無障礙設施標誌  |
|       |              | 舉辦優良無障礙建築物觀摩講習   |
|       |              | 建築物無障礙設施改善(修繕)補助   |
|       | 成立臺中市無障礙促進小組 |  |
| 台南市   | 1            | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |              | 公車轉運站(麻豆站、關廟站)無障礙設施優化—設置「公車路線無障礙點字板」   |
|       |              | 騎樓暢通計畫—舉辦騎樓暢通競賽  |
|       |              | 印製「我愛無障礙餐廳指南手冊」宣傳無障礙餐廳   |
|       |              | 2015國際身心障礙者日設攤辦理無障礙法令宣導  |

| 受考核單位 | 項次  | 策進作為<br>(項次1:辦理評選、訂有巡查機制及頻率、提供餐廳清冊,項次2:104年改善完成案件數達標準以上加分,項次3:改善成果經同意者加權,未註明:其他) |
|-------|---|--|
| 高雄市   | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       | 2   | 104年改善完成案件數共320件,增加 $(320-200)/20=6$ 分   |
|       |   | 「無障礙業務宣導手冊」,由104年「高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金預算」書,印刷裝訂與廣告費項下支應                            |
|       |   | 新建公共建築物領得使用執照後無障礙設備與設施複檢機制   |
|       |   | 全國首創-「高雄市建築物設置無障礙設施勘檢費及替代改善計畫審查費收費標準」  |
|       | 宣導:高雄國際馬拉松設攤位宣導無障礙、受旅館公會之邀宣傳無障礙法規、至金門台南分享無障礙成果、配合衛生局辦理「健康聯盟」宣傳活動,設攤位宣傳無障礙、2015高雄國際建材大展宣導無障礙通用設計規範 |  |
| 基隆市   | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |   | 辦理104年度基隆市優良公寓大廈評選   |
|       |   | 基隆市無障礙生活環境宣導摺頁   |
| 新竹市   | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |   | 104年度建築物無障礙設施與設備改善清查、複查-勞務契約書、勘檢清冊   |
|       |   | 104年度補助改善無障礙校園環境實施計畫(無障礙基金-自籌款)  |
|       |   | 機關學校辦理無障礙設施設備改善經費(無障礙基金-自籌款)   |
| 嘉義市   | 1   | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率:104年度新取得使用執照複查作業。   |
|       | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |   | 無障礙文宣品-高齡友善商店貼紙、環保筷、原子筆、騎樓整平宣導摺頁。  |
|       |   | 修訂嘉義市公共建築行動不便者使用設施查核紀錄表  |
|       |   | 修訂嘉義市無障礙設施及設備改善計畫表   |
|       | 本府提報105年度無障礙住宅設計基準及獎勵辦法示範計畫案  |  |
| 宜蘭縣   | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
| 新竹縣   | 1   | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率:104年度新竹縣公共建築物無障礙環境分類、分期、分區改善執行計畫訂有無障礙巡查機制及巡察頻率。                 |
|       | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       | 2   | 104年改善完成案件數共179件,增加 $(179-120)/16=3.6$ 分   |
|       |   | 無障礙生活環境缺失通報與諮詢案件統計表。   |
|       | 有關六福村主題樂園之無障礙整體規劃案,於會議中討論並邀集本府委員辦理現地會勘並提供寶貴意見,該業者完成友善遊樂園<無障礙暢遊手冊>,舉凡電動輪椅充電站、專人導引遊園服務等相關配套措施。      |  |
| 苗栗縣   | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |   | 提供無障礙生活環境APP,俾利民眾隨時查詢有提供無障礙環境之便利商店與加油站位置   |
| 彰化縣   | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
| 南投縣   | 1   | 辦理優良無障礙建築物評選:依104年第4次審查會議提案二決議,辦理優良無障礙建築物評選並刊登於南投縣無障礙生活網。                        |
|       | 1   | 訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率:依第22次基金會議提案一決議,公共建築物無障礙設施巡查機制及複查頻率三種態樣原則。                       |
|       | 1   | 提供300平方公尺以上餐廳清冊。   |
|       |   | 編印建築物無障礙宣導摺頁。  |
|       |   | 觀光處提供「通用化友善客房指南手冊」供本縣旅遊民宿旅館參考運用並鼓勵建置友善旅遊環。                                       |
|       |   | 本縣辦理高齡友善商店認證計畫,以旅館、餐廳、金融機構及便利商店為主軸,倘通過者則由主辦單位正式函文核發證書乙只,並公布於本府衛生局網站。             |
|       | 本府無障礙生活網站可下載自主檢查表,於新建築物或變更使用執照無障礙設施設備竣工勘驗申請書,需檢附監造建築師簽證之自主檢查表,俾利業辦。                               |  |

| 受考核單位 | 項次 | 策進作為<br>(項次1:辦理評選、訂有巡查機制及頻率、提供餐廳清冊,項次2:104年改善完成案件數達標準以上加分,項次3:改善成果經同意者加權,未註明:其他)         |
|-------|----|--|
| 雲林縣   | 1  | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       | 2  | 104年改善完成案件數為156件,增加 $(156-120)/16=2.3$ 分   |
|       |    | 高齡友善餐廳認證   |
|       |    | 無障礙餐廳合格名單刊登於身心障礙協會月報   |
|       |    | 新建建築物無障礙設施設備優良建築物公告於網路公民參考與閱覽  |
| 嘉義縣   |    | 於本府無障礙網站公告:公告餐廳與其他公共建築物列管清冊。   |
| 屏東縣   | 1  | 提供本縣300平方公尺以上餐廳清冊。   |
|       |    | 製作無障礙宣導折頁。   |
|       |    | 委託本縣建築師公會研擬餐廳、旅館無障礙設施改善個案諮詢。   |
|       |    | 訂定發佈「屏東縣無障礙設施勘檢作業收費標準」。  |
|       |    | 建置本縣提供無障礙設施之加油站福利地圖。   |
| 臺東縣   | 1  | 訂有無障礙設施巡查機制。   |
|       | 1  | 300平方公尺以上餐廳清冊。   |
|       |    | 訂定臺東縣建築物設置無障礙設施勘檢及替代改善計畫審查收費標準,並於105年5月16日施  |
| 澎湖縣   | 1  | 訂有無障礙設施巡查機制。   |
|       | 1  | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       |    | 諮詢改善小組會議結論發布新聞稿  |
| 金門縣   | 1  | 提供300平方公尺以上餐廳清冊  |
|       | 2  | 104年改善完成案件數為150件,增加 $(150-60)/8=11.25$ 分   |
|       |    | 要求縣轄所屬單位如廁所全為蹲式馬桶,應評估部分改為坐式馬桶,以符合身心障礙者及行動不便者使用需求,進而營造友善生活環境。                             |
|       |    | 為營造金門縣健康城市與高齡友善城市,跨局處整合各單位示範計畫及執行成果,已達國際指標為方向邁進  |
|       |    | 參加第七屆臺灣健康城市暨高齡友善城市獎項評選,期藉由選拔方式,宣導相關高齡友善城市議題與成果,作為各縣市推動學習典範<br>積極辦理有愛.無礙-金門縣建築物無障礙活環境推動計畫 |
| 連江縣   |    | 104年編列經費印製建築物無障礙設計規範供民眾參閱。   |



## 肆、實地現場考核

- 一、實地現場考核內容
- 二、實地現場考核紀錄
- 三、督導考核總成績
- 四、實地現場考核成果



## 肆、實地現場考核

### 一、實地現場考核內容

實地現場考核由9月8日起至11月1日期間辦理（督導行程表詳附件十三），「公共建築物及騎樓無障礙環境優化計畫（105-108年）實地現場考核評分規則」內容如下所示：

- （一）實地現場考核共計考核一件新建公共建築物、三件既有公共建築物改善案件及一條100公尺連續騎樓路段為準。
- （二）實地現場考核前，受考核單位須備齊相關資料向考核小組做行程說明及案件之建築物概況及設施項目，經由委員確認同意後，進行實地現場考核。
- （三）現場考核部由委員針對受考核之建築物其無障礙設施是否符合法令規定外，另針對整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計項目進行加分考核，考核結果由委員進行評分，召集人、共同召集人或副召集人確認後，當場宣佈該場次考核總分。
- （四）實地現場考核總分為100分。
- （五）直轄市、縣市政府考核建築物配分說明如下：

表 4.1.1 直轄市、縣市政府考核建築物配分說明表

| 考核建築物 | 配分  | 備註說明   |
|-------|-----|--|
| 建築物一  | 20  | 自選103、104年度新建公共建築物   |
| 建築物二  | 15  | 指定103、104年度既有公共建築物改善案件                                     |
| 建築物三  | 20  | 指定103、104年度既有公共建築物改善案件                                     |
| 建築物四  | 20  | 指定103、104年度既有公共建築物改善案件                                     |
| 騎樓路段  | 10  | 指定103、104年度一條100公尺連續騎樓路段<br>騎樓整平路段滿分給予15分<br>騎樓順平路段滿分給予10分 |
| 加分項目  | 20  | 每項加分最高可得5分   |
| 分數小計  | 100 |  |

- （六）建築圖說評分：

1. 新建公共建築物應依內政部 100.5.2 營署建管字第 1000803049 號訂定，自中華民國 100.07.01 生效之「公共建築物建造執照無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項表」規定檢附相關圖說，現場未提供相關書圖文件供考核者扣 5 分。
2. 「無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項表評分表」每項缺失扣 1 分。

(七) 現場設備設施評分：

1. 現場設備設施採倒扣方式與加分方式併行。
2. 倒扣方式，既有建築物其無障礙設施每項缺失扣 1 分，最多可扣 15 分；新建建築物無障礙設施每項缺失扣 2 分，最多可扣 15 分；倘有已依規定設置，惟待改善或需改善之項目亦得視實際情形酌予扣分。
3. 加分方式，設備設施項目已依規定設置，且整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計項目，視實際情形酌予加分，每項加分項目最高可得 5 分。

(八) 騎樓整平評分：

1. 騎樓整平路段如未達 100 公尺者，以 0 分計算；但如有特殊情節者，可敘明原因，不受 100 公尺之限制。
2. 騎樓整平或順平路段如遭違建封閉無法通行者，以 0 分計算。
3. 未依無障礙通路規定留設 1.3 公尺寬度供行動不便者使用者，扣 3 分。
4. 委員可依現場實際情形，酌予給分。

(九) 既有公共建築物改善案件，如該建築物有部設施依「既有公共建築物無障礙設施替代改計畫作業程序及認定原則」報經改善諮詢及審查小組審核通過者，請受考核單位填具評分表「作業程序及認定原則或替代改善說明」欄，填寫原由備齊相關資料受考；如未有任何說明即依設計規範內容評分，現場不接受補充說明。

## 二、實地現場考核紀錄

本（105）年度無障礙生活環境業務督導實地現場考核紀錄彙整如下所示：

表 4.2.1 臺北市政府實地現場考核紀錄

|  |  |
|--|--|
| 受督導單位：臺北市政府  | 督導日期：105 年 09 月 09 日                         |
| 副召集人：高文婷<br>督導委員：詹政達、陳淑玲、蔡崑茂   | 出席單位：<br>營建署建管組：陳雅芳<br>衛福部：謝若涵<br>交通部觀光局：謝孟榛 |
| 會勘缺失記錄   |  |
| <p>1. 興隆公營住宅（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 時代國際飯店股份有限公司（既有建築物）：<br/>無意見。</p> <p>3. 臺北市私立老人長期照顧中心（既有建築物）：<br/>無意見。</p> <p>4. 財政部臺北國稅局松山分局（既有建築物）：<br/>（1）樓梯/扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。</p> <p>5. 臺北市信義區莊敬路 425 號至 477 號（騎樓）：<br/>無意見。<br/>（以下空白）</p> |  |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 興隆公營住宅                                    |        |
| 使用類別  | H類 住宿類 (H-2)                              |        |
| 執照日期  | 設計：102.04.29 完工：104.07.06<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| <b>建築圖說部份</b>   |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     |        |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

### 無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



### 督導委員建議事項

1. 平台-轉彎平台：坡道方向變換處應設置長寬各 150 公分以上之平台，該平台之坡度不得大於 1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同。
2. 建議將無障礙廁所門鎖提高。

現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 時代國際飯店股份有限公司                              |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期  | 設計：094.10.17 完工：099.01.12<br>變更：101.02.16 |



無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 建議修正無障礙廁所標誌(身心障礙專用 Disabled Restroom)。
2. 馬桶及扶手：側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。
3. 馬桶及扶手：可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。
4. 昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方 30 公分處之地板，應作 30 公分x60 公分之不同材質處理。
5. 昇降機入口的觸覺裝置：在昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各 8 公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬 6 公分、長 8 公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方 135 公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同。
6. 建議停車位下車處做斜坡道處理。

現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 臺北市私立台大老人長期照顧中心                                |
| 使用類別  | H類 住宿類 (H-1)                                   |
| 執照日期  | 設計：060.06.24      完工：064.05.26<br>變更：095.08.17 |



無障礙設施、設備部份


(1)無意見。



督導委員建議事項


1. 昇降設備：主要入口樓層標誌：主要入口樓層之昇降機應設置以下無障礙標誌。
2. 昇降設備應依規範設置點字標示。

| 現場會勘缺失說明 (四) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 財政部臺北國稅局松山分局                                   |
| 使用類別         | G類 辦公、服務類 (G-2)                                |
| 執照日期         | 設計：066.08.05      完工：069.06.12<br>變更：000.00.00 |

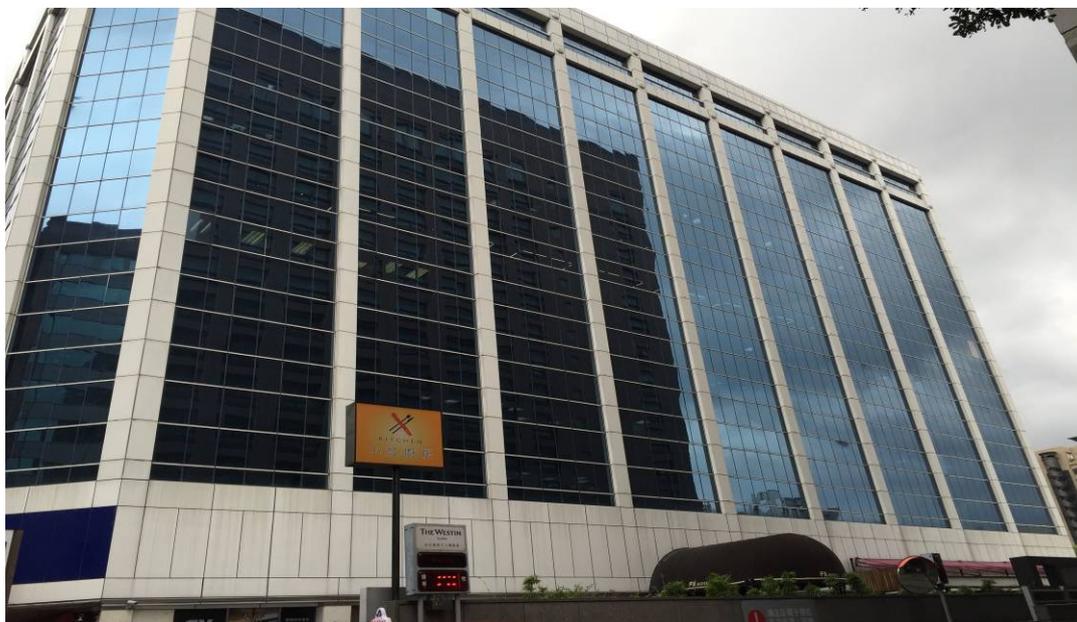

#### 現場會勘缺失說明

(1) 樓梯/扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。

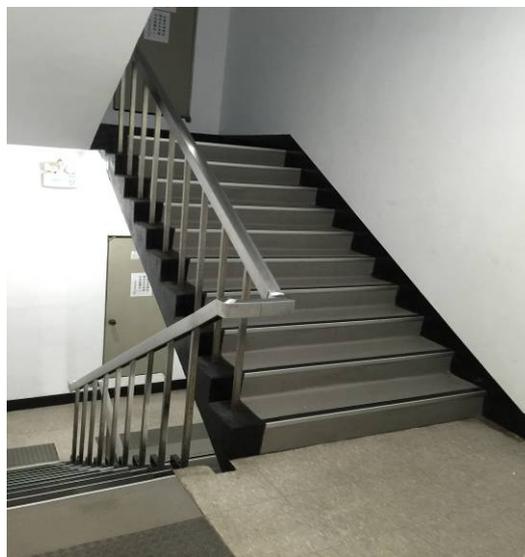

#### 督導委員建議事項

1. 昇降設備：昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方 30 公分處之地板，應作 30 公分x60 公分之不同材質處理。
2. 建議 4 樓應設置無障礙標誌。
3. 廁所：側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                        |
|------|------------------------|
| 縣市別  | 臺北市政府                  |
| 騎樓路段 | 臺北市信義區莊敬路 425 號至 477 號 |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |      |      |       |      |    |
| 備 註   |      |      |       |      |    |

表 4.2.2 新北市政府實地現場考核紀錄

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 受督導單位：新北市政府   | 督導日期：105 年 09 月 08 日                  |
| 共同召集人：高文婷<br>督導委員：湯浣平、金桐、楊德明  | 出席單位：<br>交通部觀光局 江弘文<br>營建署建管組 盧昭宏、陳雅芳 |
| 會勘缺失記錄  |                                       |
| <p>1. 新北市立圖書館（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 三芳護理之家（舊名：祥寶尊榮護理之家）（既有建築物）：<br/>           (1)依據 97.10.24 內授營建管字第 0970808530 號函釋說明三「…依本辦法規定<br/>           檢討如應設置供行動不便者使用之樓梯者，其整座樓梯應符合建築技術規則<br/>           建築設計施工編第 167 條第 2 項所訂建築物無障礙設施設計規範之規定，或<br/>           依身心障礙者權益保障法第 57 條規定提具替代改善計畫。」，其他樓層樓<br/>           梯水平延伸未改善。</p> <p>3. 沐舍飯店（既有建築物）：<br/>無意見。</p> <p>4. 新北市議會議事廳大樓（既有建築物）：<br/>無意見。</p> <p>5. 新北市新莊區公園一路 72 至 94 號（騎樓）：<br/>無意見。<br/>（以下空白）</p> |                                       |

| 現場會勘缺失說明（一） |   |
|-------------|---|
| 建築物名稱       | 新北市立圖書館                                   |
| 使用類別        | D類 休閒、文教類（D-2）                            |
| 執照日期        | 設計：100.09.16 完工：104.04.10<br>變更：000.00.00 |




| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。

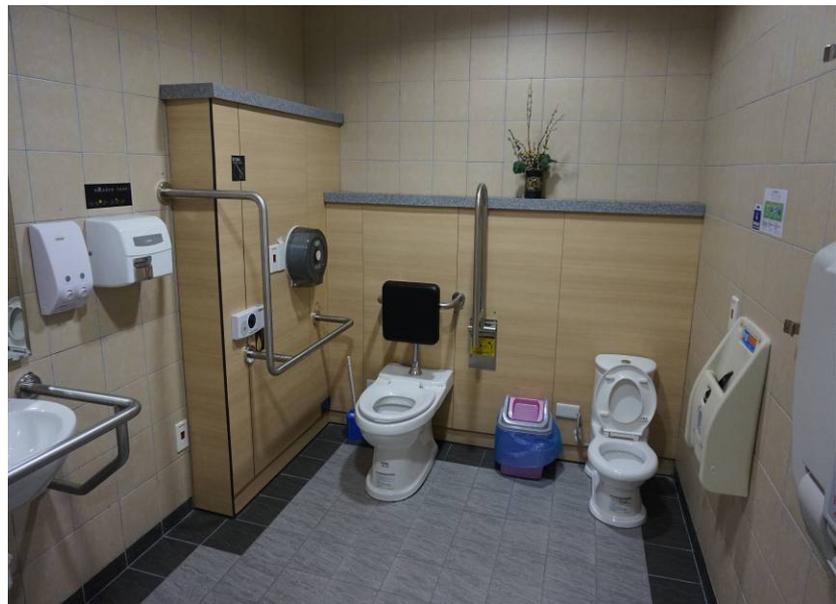

督導委員建議事項

無意見。

現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 沐舍飯店 (時尚酒店)                               |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期  | 設計：082.02.19 完工：084.09.08<br>變更：101.03.16 |



無障礙設施、設備部份

無意見。



督導委員建議事項

無意見。


### 現場會勘缺失說明 (三)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 新北市議會議視聽大樓                                |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |
| 執照日期  | 設計：089.10.24 完工：091.09.14<br>變更：000.00.00 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。

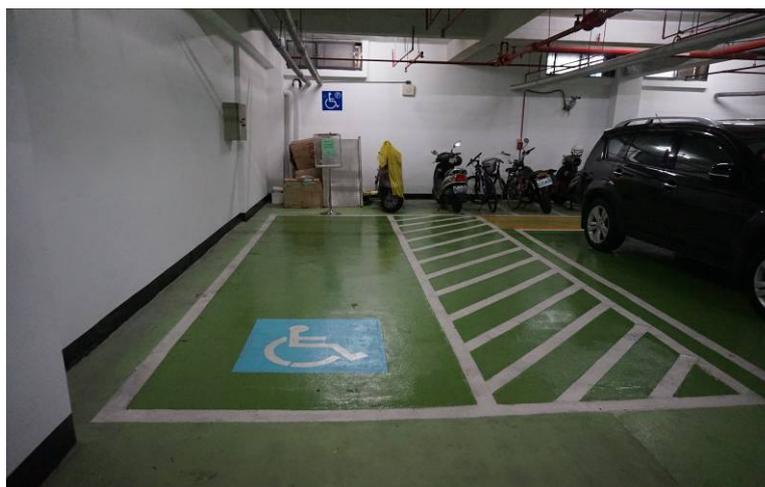

#### 督導委員建議事項

無意見。

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 三芳護理之家(舊名：祥寶尊榮護理之家)                       |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期  | 設計：069.12.26 完工：079.08.29<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1)依據 97.10.24 內  
 授營建管字第  
 0970808530 號函釋  
 說明三「…依本辦  
 法規定檢討如應設  
 置供行動不便者使  
 用之樓梯者，其整  
 座樓梯應符合建築  
 技術規則建築設計  
 施工編第 167 條第  
 2 項所訂建築物無  
 障礙設施設計規範  
 之規定，或依身心  
 障礙者權益保障法  
 第 57 條規定提具  
 替代改善計畫」，  
 其他樓層樓梯水平  
 延伸未改善。




### 督導委員建議事項

1. 引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。
2. 引導標誌-入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。
3. 引導標誌-車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於 90 公分x90 公分，停車格線之顏色應為藍色，下車區應為白色斜線，以利區別。
4. 浴室-標誌：無障礙標誌應符合圖 902.1 規定之比例。



現場會勘缺失說明 (五)

|      |                        |
|------|------------------------|
| 縣市別  | 新北市政府                  |
| 騎樓路段 | 新北市新莊區公園一路 72-96 號(騎樓) |

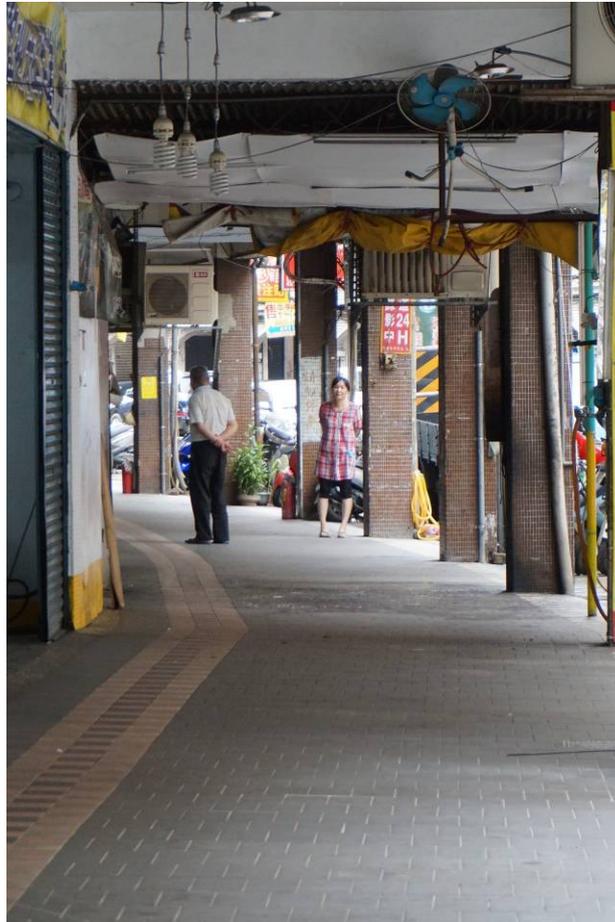

騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |      |      |       |      |    |
| 備 註   |      |      |       |      |    |

表 4.2.3 桃園市政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：桃園市政府  | 督導日期：105 年 10 月 04 日 |
| 副召集人：樂中丕<br>督導委員：柯坤男、陳淑玲、湯浣平   | 出席單位：<br>營建署建管組 羅晞廷  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| <p>1. 好市多中壢店（新建建築物）：</p> <p>（1）樓梯/警示設施-終端警示：距梯級終端 30 公分處，應設置深度不得小於 30 公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。</p> <p>2. 雲朗觀光股份有限公司桃園分公司(既有建築物)：</p> <p>（1）廁所盥洗室/引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。</p> <p>3. 衛生福利不桃園醫院(A 棟)(既有建築物)：</p> <p>無意見。</p> <p>4. 臺灣桃園農田水利會(既有建築物)：</p> <p>（1）樓梯/梯級-梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於 1.3 公分，且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於 2 公分。</p> <p>（2）廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。</p> <p>5. 桃園區中正路 101 號(騎樓)：</p> <p>無意見。</p> <p>(以下空白)</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 好市多 (中壢店)                                 |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-2)                              |
| 執照日期         | 設計：103.12.04 完工：104.08.06<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

### 現場會勘缺失說明

- (1)樓梯/警示設施-  
終端警示：距梯  
級終端 30 公分  
處，應設置深度  
不得小於 30 公  
分，顏色且質地  
不同之警示設  
施。樓梯中間之  
平台不需設置警  
示設施。



### 督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室/側邊 L 型扶手-與馬桶之距離：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶坐面距離為 27 公分。
2. 廁所盥洗室/洗面盆-高度：洗面盆上緣具地板面不得大於 80 公分。
3. 樓梯/扶手：單層扶手之上緣與地板面之距離應為 75 公分。
4. 樓梯/引導標誌：為引導行動不便者進出建築物與使用相關設施之延續與不中斷的方向引導標誌，應可清楚辨識，並與行進方向垂直。

| 現場會勘缺失說明 (二)  |  |
|---|--|
| 建築物名稱   | 雲朗觀光股份有限公司桃園分公司  |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)   |
| 執照日期  | 設計：081.04.18 完工：089.09.25<br>變更：104.06.04  |
|    |  |
| 現場會勘缺失說明  |  |
| <p>(1) 廁所盥洗室/引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。</p>   |  |
| 督導委員建議事項  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙廁所及無障礙升降機方向指引。</li> <li>2. 停車空間/入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。</li> <li>3. 廁所盥洗室/馬桶：除醫療或療養機構有特殊需求外，應使用一般型式之馬桶，馬桶不可有蓋，且應設置靠背。</li> <li>4. 廁所盥洗室/可動扶手：扶手高度應與對側扶手高度相等。</li> </ol> |  |

| 現場會勘缺失說明 (三) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 衛生福利部桃園醫院 (A 棟)                           |
| 使用類別         | F 類 衛生、福利、更生類 (F-1)                       |
| 執照日期         | 設計：082.05.01 完工：088.07.31<br>變更：104.11.13 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見



#### 督導委員建議事項

1. 樓梯/終端警示:建議將導盲磚更換為其他顏色且質地不同之警示設施。
2. 建議製作無障礙設施引導地圖。
3. 浴室/求助鈴:設置一處距地板面 35-45 公分,且按鈕應明確標示。
4. 廁所盥洗室/扶手:扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分。
5. 廁所盥洗室/求助鈴:設置一處在馬桶前緣往前 35 公分、高 35 公分處,且按鈕應明確標示。
6. 廁所盥洗室/門扣:建議更換緊急時可由外部開啟的鎖。
7. 停車空間:建議再加設離建築物更近距離的位置。

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 臺灣桃園農田水利會-新坡工作站                           |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |
| 執照日期  | 設計：052.04.01 完工：065.06.30<br>變更：104.09.08 |



### 現場會勘缺失說明

- (1) 樓梯/梯級-梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於 1.3 公分，且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於 2 公分。



(2) 廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。




#### 督導委員建議事項

1. 樓梯/水平延伸:樓梯靠牆面扶手應水平延伸 30 公分以上，並作端部防勾撞處理。
2. 升降設備/標示:垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面 200-220 公分，尺寸不得小於 15 公分。
3. 廁所盥洗室/求助鈴:應設置一處在馬桶前緣往前 35 公分、高 35 公分處，且按鈕應明確標示。
4. 廁所盥洗室/標誌:應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。
5. 停車空間/引導標誌:車道入口處級車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置；應於停車會旁設置具夜光笑果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為 40X40 公分以上，下員高度 190-200 公分。
6. 停車場至建築物之安全門之門檻以斜角處理高低差。
7. 更換入口無障礙標誌為無障礙坡道標誌。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 縣市別  | 桃園市政府                |
| 騎樓路段 | 桃園市桃園區中正路 101 號起(騎樓) |

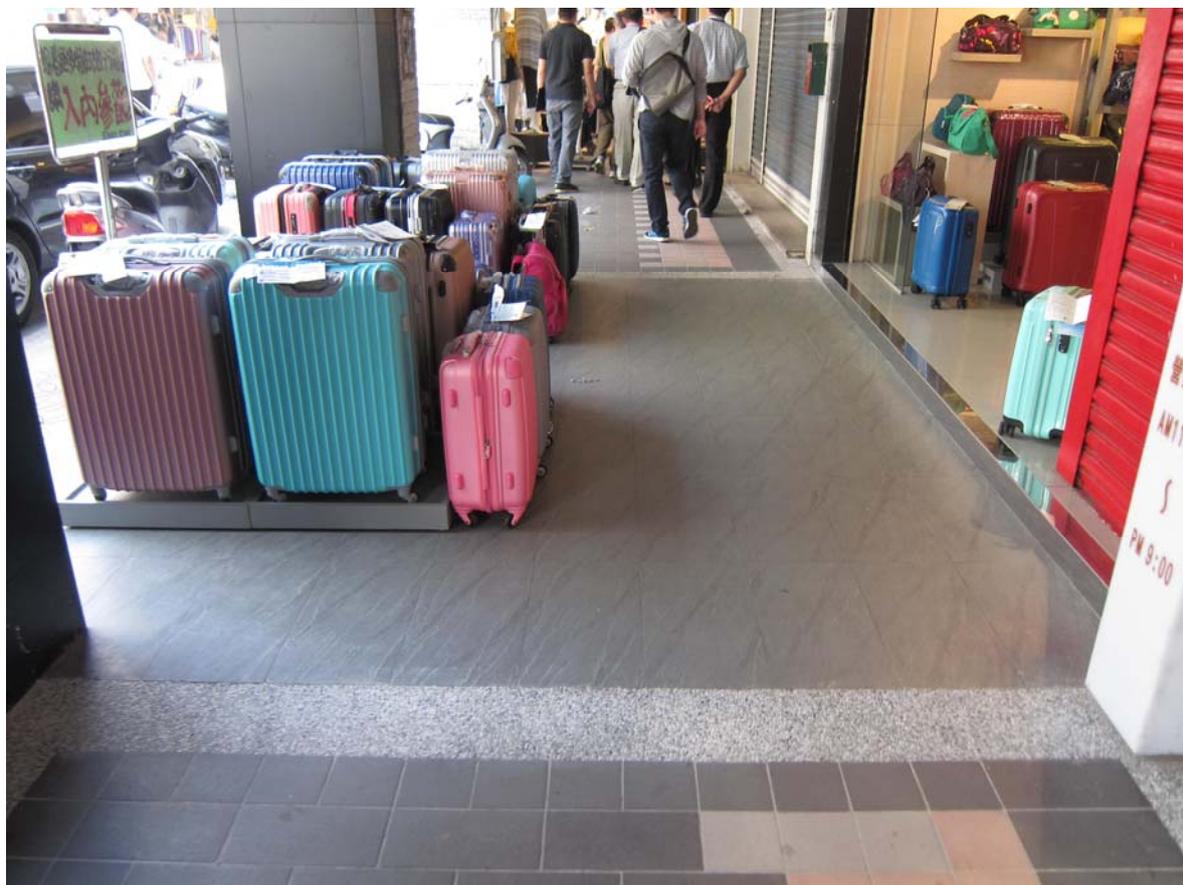

騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平   | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|--|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |  |      |       |      |    |
| 備 註   | 建議事項：<br>1. 騎樓機車違停處理，騎樓內淨寬保持在 130 公分以上。<br>2. 突出物限制：地面起 60-200 公分之範圍，不得有 10 公分以上之懸空突出物如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。 |      |       |      |    |

表 4.2.4 臺中市政府實地現場考核紀錄

|  |                         |
|--|-------------------------|
| 受督導單位：臺中市政府  | 督導日期：105 年 09 月 20 日    |
| 副召集人：樂中丕<br>督導委員：蔡再相、張木藤、陳政雄   | 出席單位：<br>營建署建管組 盧昭宏 吳惠如 |
| 會勘缺失記錄   |                         |
| <p>1. 長安醫院（新建建築物）：<br/>無意見</p> <p>2. 默契旅店（既有建築物）：<br/>無意見</p> <p>3. 台中二中體育館（既有建築物）：<br/>無意見</p> <p>4. 德康養護中心（既有建築物）：<br/>無意見</p> <p>5. 台中市中山路（綠川西街至中華路）（騎樓）：<br/>無意見</p> <p>（以下空白）</p> |                         |


| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 長安醫院                                      |
| 使用類別         | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期         | 設計：102.12.03 完工：104.10.14<br>變更：000.00.00 |



| 現場會勘缺失說明               |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 建築圖說部份                 | 不符規定項目 |  |
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |  |
|                        | 避難層出入口 |  |
|                        | 室內出入口  |  |
|                        | 樓梯     |  |
|                        | 昇降設備   |  |
|                        | 室內通路走廊 |  |
|                        | 廁所盥洗室  |  |
|                        | 浴室     |  |
| 輪椅觀眾席位                 |        |  |

## 無障礙設施、設備部份

無意見。

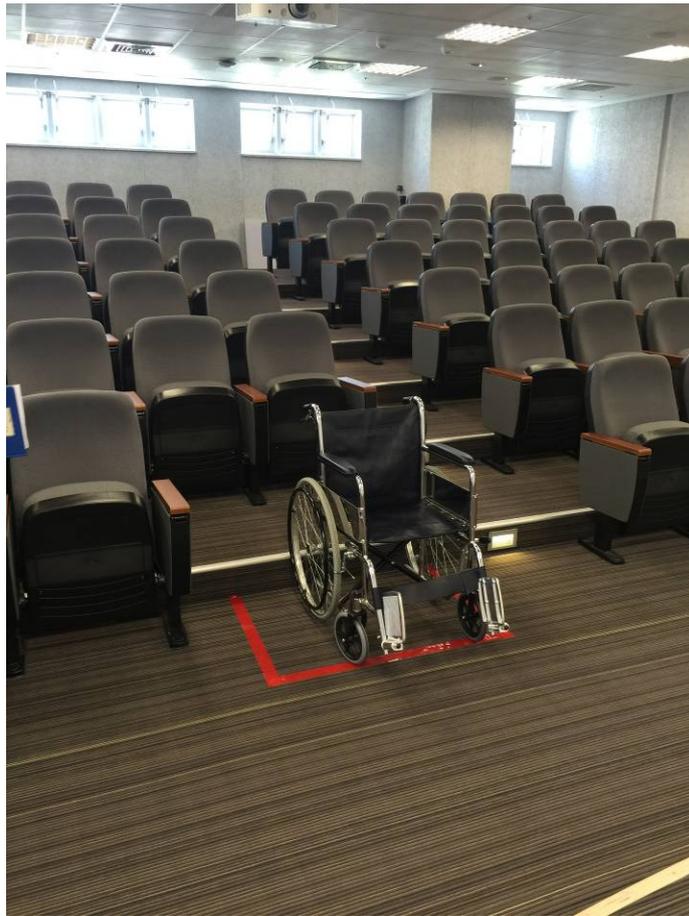

### 委員建議事項

1. 演講廳出入口：主要出入口設置有門檻，建議改善。
2. 昇降機設有點字之呼叫鈕前方 30 公分處之地板，應作 30 公分x60 公分之不同材質處理。
3. 昇降機應設置垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面 200-220 公分，尺寸不得小於 15 公分。
4. 淋浴間水龍頭位置：無座位者，可為距地板面 80-120 公分之區域；有座位者，其設置區域以距設座位之牆壁 68 公分之範圍為限。
5. 淋浴間扶手：兩側牆壁應設置水平扶手；入口之牆壁近外緣處 2 側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手。
6. 無障礙停車位：停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反差效果，下車區應為白色斜線及直線，予以區別。相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於 600 公分、寬度不得小於 550 公分，包括寬 150 公分的下車區。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 默契旅店                                      |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期         | 設計：100.12.20 完工：103.05.13<br>變更：000.00.00 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項


1. 淋浴間求助鈴：一處距地板面高 90-120 公分處；另距地板面高 35 公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。

| 現場會勘缺失說明 (三) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 臺中二中體育館  |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-4)                                |
| 執照日期         | 設計：101.11.22      完工：103.11.27<br>變更：000.00.00 |



**無障礙設施、設備部份**

無意見。

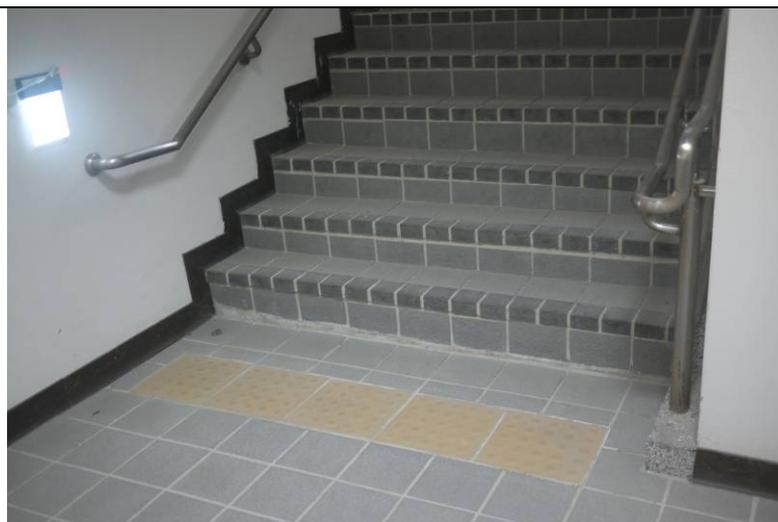

**督導委員建議事項**

1. 廁所盥洗室應採用橫向拉門，門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手。

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 德康養護中心                                    |
| 使用類別  | H類 住宿類 (H-1)                              |
| 執照日期  | 設計：076.07.08 完工：077.10.07<br>變更：089.06.21 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室之門扣建議使用撥扣式門鎖。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                  |
|------|------------------|
| 縣市別  | 臺中市政府            |
| 騎樓路段 | 臺中市中山路(綠川西街至中華路) |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |      |      |       |      |    |
| 備 註   |      |      |       |      |    |

表 4.2.5 臺南市政府實地現場考核紀錄

|   |                      |
|---|----------------------|
| 受督導單位：臺南市政府   | 督導日期：105 年 09 月 26 日 |
| 副召集人：樂中丕<br>督導委員：王武烈、詹政達、楊德明  | 出席單位：<br>營建署建管組 吳惠如  |
| 會勘缺失記錄  |                      |
| <p>1. 金城國中（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 承億文旅台南海安旅館(既有建築物)：<br/>無意見。</p> <p>3. 臨安老人養護中心(既有建築物)：<br/>無意見。</p> <p>4. 國欣護理之家(既有建築物)：<br/>無意見。</p> <p>5. 臺南市健康路 357~383 號(騎樓順平)：<br/>(1)地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。<br/>(以下空白)</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 金城國中   |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-4)                                |
| 執照日期         | 設計：101.12.28<br>完工：第一期-104.10.07、第二期-104.11.18 |



| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室之小便斗扶手建議加高。

現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 承億文旅台南海安旅店                                |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期  | 設計：072.12.07 完工：074.05.07<br>變更：104.06.29 |



無障礙設施、設備部份

無意見。



督導委員建議事項

無意見

現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 臨安老人養護中心   |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)   |
| 執照日期  | 設計：096.01.25 完工：096.12.19<br>設計：096.12.19 完工：098.07.22(增建) |



無障礙設施、設備部份

無意見。



督導委員建議事項

無意見

### 現場會勘缺失說明（四）

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 國欣護理之家                                    |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期  | 設計：097.11.28 完工：100.11.16<br>變更：000.00.00 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 無障礙坡道標誌請依規範附錄改善。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 縣市別  | 臺南市政府                |
| 騎樓路段 | 臺南市健康路 357~383 號(騎樓) |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平     | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|----------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 | ×        |      |       |      |    |
| 備 註   | 此路段為騎樓順平 |      |       |      |    |

現場會勘缺失說明 (五)

(1)地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。



(以下空白)

(以下空白)

(以下空白)

(以下空白)

表 4.2.6 高雄市政府實地現場考核紀錄

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <p>受督導單位：高雄市政府</p>   | <p>督導日期：105 年 10 月 06 日</p>          |
| <p>召集人：王安強<br/>         共同召集人：高文婷<br/>         督導委員：劉金鐘、蔡再相、金桐</p>   | <p>出席單位：<br/>         營建署建管組 陳雅芳</p> |
| <p>會勘缺失記錄</p>  |                                      |
| <p>1. 劉嘉修護理之家（新建建築物）：<br/>         無意見。</p> <p>2. 大都會飯店（既有建築物）：<br/>         無意見。</p> <p>3. 岡山國民中學（既有建築物）：<br/>         (1)樓梯/扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。</p> <p>4. 愛買高雄店（既有建築物）：<br/>         (1)廁所盥洗室/引導標誌/入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。</p> <p>5. 九如二段 332 號至松江街 31 號：<br/>         無意見。<br/>         （以下空白）</p> |                                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 劉嘉修護理之家                                   |
| 使用類別         | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期         | 設計：102.12.03 完工：104.10.27<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 | 不符規定項目 |  |
|------------------------|--------|--|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |  |
|                        | 避難層出入口 |  |
|                        | 室內出入口  |  |
|                        | 樓梯     |  |
|                        | 昇降設備   |  |
|                        | 室內通路走廊 |  |
|                        | 廁所盥洗室  |  |
|                        | 浴室     |  |
| 輪椅觀眾席位                 |        |  |

無障礙設施、設備部份

無意見



無意見



督導委員建議事項

無意見


**現場會勘缺失說明 (二)**

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 大都會飯店                                     |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期  | 設計：102.06.18 完工：081.12.02<br>變更：000.00.00 |



**無障礙設施、設備部份**

無意見。

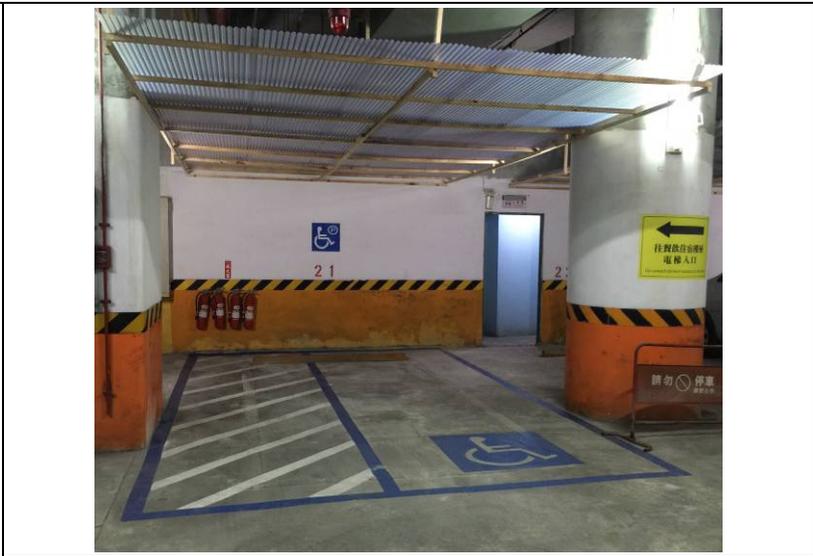

**督導委員建議事項**

1. 無障礙電梯應與一般電梯設定為不連動。

| 現場會勘缺失說明 (三) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 岡山國民中學                                    |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-4)                           |
| 執照日期         | 設計：000.00.00 完工：000.00.00<br>變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

(1)樓梯/扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。



#### 督導委員建議事項

無意見

| 現場會勘缺失說明 (四) |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 建築物名稱        | 愛買高雄店                                 |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-2)                          |
| 執照日期         | 設計：087.09.16 完工：98.12.18 變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

- (1) 廁所盥洗室/引導標誌入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。



#### 督導委員建議事項

1. 車位豎立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40公分x40公分以上，下緣高度190-200公分。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |               |
|------|---------------|
| 縣市別  | 高雄市政府         |
| 騎樓路段 | 九如二路至松江街 31 號 |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平              | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|-------------------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |                   |      |       |      |    |
| 備 註   | 建議事項：公共電話應設置警示措施。 |      |       |      |    |

表 4.2.7 基隆市政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：基隆市政府  | 督導日期：105 年 09 月 12 日 |
| 副召集人：林震富<br>督導委員：陳大榮、郭鴻鑾、張木藤   | 出席單位：<br>營建署建管組：羅晞廷  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| <p>1. 海巡署北部巡防局光復營區（新建建築物）：</p> <p>(1) 建築書圖/廁所平面圖迴轉半徑尺寸不符/全區配置圖車道、坡道動線有誤。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。</p> <p>2. 財團法人基隆市私立博愛仁愛之家(既有建築物)：</p> <p>(1) 無障礙通路/平台-端點平台：坡道起點及終點，應設置長、寬各 150 公分以上之平台，且該平台之坡度不得大於 1/50。</p> <p>(2) 停車位/車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於 90 公分x90 公分，停車格線之顏色應為藍色，下車區應為白色斜線，以利區別。</p> <p>3. 聯安護理之家(既有建築物)：</p> <p>無意見。</p> <p>4. 有限責任基隆第一信用合作社(八斗子分社)(既有建築物)：</p> <p>無意見。</p> <p>5. 基隆市中正區八斗街 2 號至 38 號(騎樓)：</p> <p>(1) 地面順平：部分地面有高低差，地面順平未處理。</p> <p>(2) 坡道處理：坡道未處理。</p> <p>(以下空白)</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 海巡署北部巡防局光復營區                              |
| 使用類別         | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |
| 執照日期         | 設計：101.09.27 完工：104.11.27<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        | ×      |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  | ×      |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

### 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/側邊 L 型扶手：  
馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。



### 督導委員建議事項

1. 無障礙室外坡道積水部分做緊急處理。
2. 全區引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。
3. 建議改善無障礙立面標誌(如電梯、樓梯、廁所)。

現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 財團法人基隆市私立博愛仁愛之家                           |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期  | 設計：072.07.11 完工：074.04.04<br>變更：000.00.00 |



現場會勘缺失說明

(1)無障礙通路/平台-  
端點平台：坡道起  
點及終點，應設置  
長、寬各 150 公分  
以上之平台，且該  
平台之坡度不得大  
於 1/50。



(2) 停車位/車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於 90 公分x90 公分，停車格線之顏色應為藍色，下車區應為白色斜線，以利區別。



#### 督導委員建議事項

1. 廁所/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。
2. 廁所/可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。
3. 浴室/鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在 90 公分以上。
4. 無障礙浴室門會夾手建議改善。
5. 廁所/扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣 1~3 公分。
6. 建議改善全區引導標誌。

現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 聯安護理之家   |
| 使用類別  | H類 住宿類 (H-1)                                   |
| 執照日期  | 設計：079.10.15      完工：081.05.19<br>變更：000.00.00 |



無障礙設施、設備部份

無意見。



督導委員建議事項

1. 建議將入口處鐵板改成活動式。
2. 建議浴室調整成洗澡椅。

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 有限責任基隆第一信用合作社(八斗子分社)                           |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-1)                                |
| 執照日期  | 設計：082.02.23      完工：084.01.20<br>變更：000.00.00 |



### 無障礙設施、設備部份

無意見。




### 督導委員建議事項

1. 無障礙廁所標誌應依規範辦理。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 縣市別  | 基隆市政府                    |
| 騎樓路段 | 基隆市中正區八斗街 2 號至 38 號 (騎樓) |

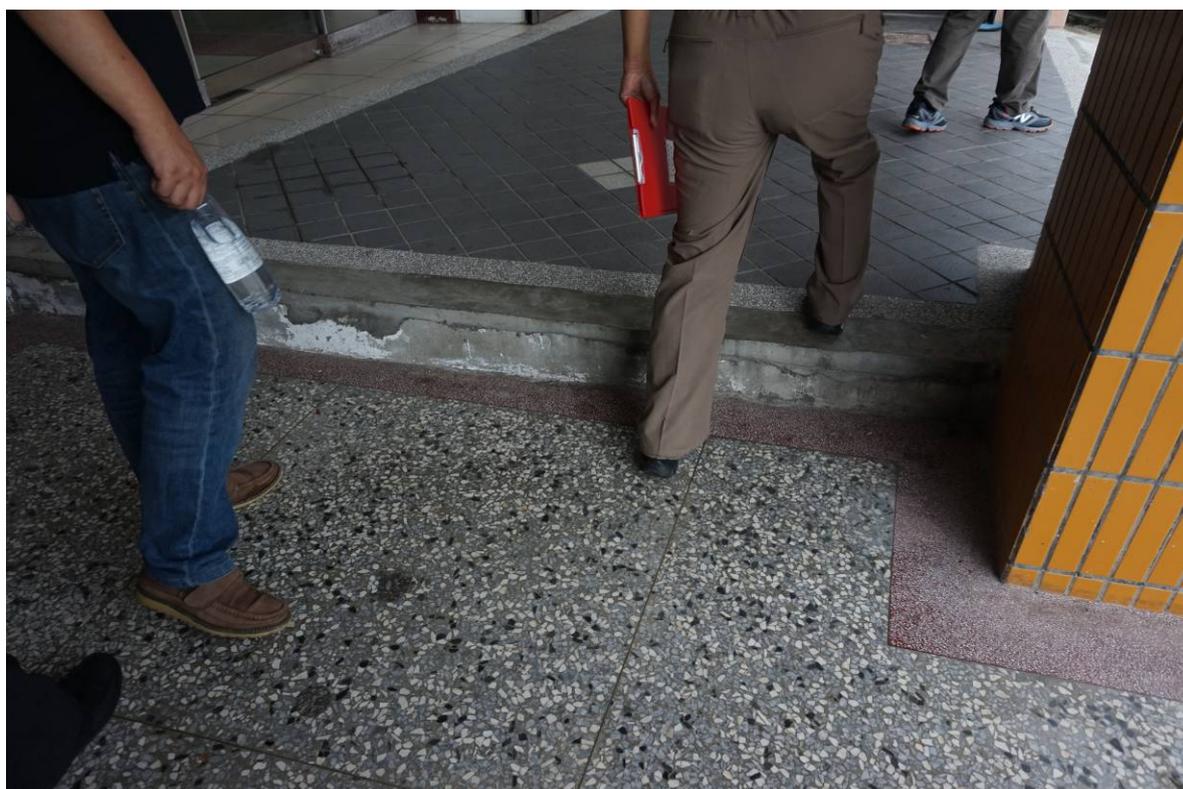

騎樓整平現場會勘項目表


| 項 目   | 地面順平  | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|---|------|-------|------|----|
| 不合格項目 | ×   | ×    |       |      |    |
| 備 註   | 建議事項：<br>1. 建議水溝蓋加網子。<br>2. 路面通行高度應有 1 米 9 淨高，有障礙物建議改善。 |      |       |      |    |

現場會勘缺失說明 (五)

(1)地面順平：部分地面有高低差，地面順平未處理。



(2)坡道處理：坡道未處理。

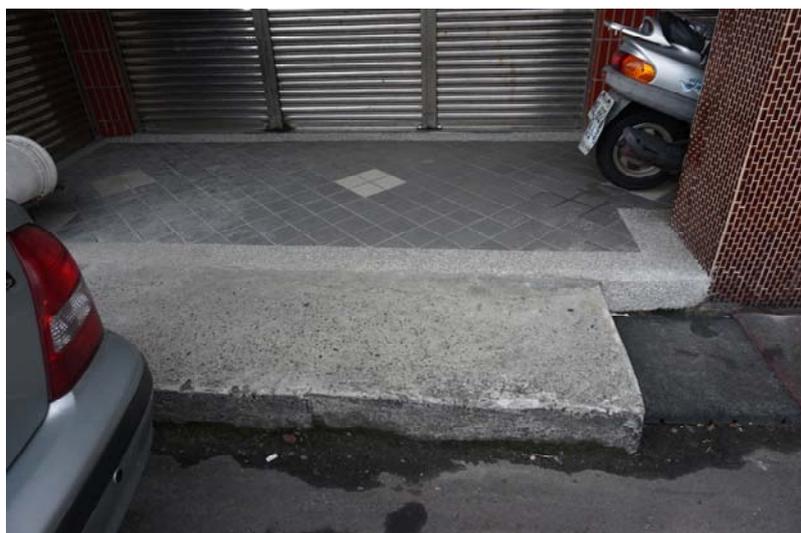

(以下空白)

(以下空白)

表 4.2.8 新竹市政府實地現場考核紀錄

|  |  |
|--|--|
| 受督導單位：新竹市政府  | 督導日期：105 年 09 月 22 日                             |
| 副召集人：林震富<br>督導委員：鄭介文、李訓良、劉金鐘   | 出席單位：<br>教育部                林正弘<br>營建署建管組    洪信一 |
| 會勘缺失記錄   |  |
| <p>1. 新竹市轉運站/國道客運（新建建築物）：</p> <p>(1) 建築書圖/各層平面圖：圖面與現況不符。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前 10 公分及馬桶座面上約 40 公分處。</p> <p>2. 西門國民小學(既有建築物)：</p> <p>(1) 坡道/平台-轉彎平台：坡道方向變換處應設置長寬各 150 公分以上之平台，該平台之坡度不得大於 1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同。</p> <p>(2) 無障礙標誌/綜合引導標誌：建築物主要入口處、沿路轉彎處、與主要通路不同及通往各項設施之設置方向指示標示。</p> <p>3. 建功高級中學(既有建築物)：</p> <p>(1) 廁所盥洗室/鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在 90 公分以上。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置緊急求助鈴，其按鈕應設置兩處，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分處，另一處在馬桶前緣往前 35 公分、高 35 公分處，且按鈕應明確標示。</p> <p>(3) 廁所盥洗室/淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 75 公分。</p> <p>(4) 廁所盥洗室/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。</p> <p>(5) 無障礙樓梯：尚未改善</p> <p>(6) 無障礙昇降設備：尚未改善</p> <p>(7) 無障礙輪椅觀眾席位：尚未改善</p> <p>(8) 無障礙停車空間：尚未改善</p> <p>4. 陶板屋(既有建築物)：</p> <p>(1) 廁所盥洗室/標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖 902.1 之無障礙標誌，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。</p> <p>5. 新竹市大同路 110 至 130 號(騎樓)：</p> <p>(1) 地面順平：部分地面有高低差，地面順平未處理。<br/>(以下空白)</p> |  |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 新竹新竹市轉運站/國道客運                             |        |
| 使用類別  | A類 公共集會類 (A-2)                            |        |
| 執照日期  | 設計：101.11.05 完工：104.03.22<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| 建築圖說部份  |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   | ×      |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     |        |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

### 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前 10 公分及馬桶座面上約 40 公分處。



### 督導委員建議事項

1. 建築物右側入口處之高底差建議修正順平，以利行走。
2. 廁所盥洗室：衛生紙設置位置不當，不易取用。
3. 廁所盥洗室/小便器-高度：小便器之突出端距地板面應為 35-38 公分。
4. 廁所盥洗室/小便器-扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面 85 公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為 65-70 公分；平行牆面之扶手上緣距地板面 120 公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為 60 公分，長度為 55 公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為 25 公分。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 西門國小                                      |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-3)                           |
| 執照日期         | 設計：084.10.18 完工：087.10.26<br>變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

(1)坡道/平台-轉彎平台：坡道方向變換處應設置長寬各150公分以上之平台，該平台之坡度不得大於1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同。



(2)無障礙標誌/綜合引導標誌：建築物主要入口處、沿路轉彎處、與主要通路不同及通往各項設施之設置方向指示標示。



#### 督導委員建議事項

1. 昇降設備昇降機入口的觸覺裝置：在昇降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各 8 公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬 6 公分、長 8 公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方 135 公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同。
2. 廁所盥洗室/鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在 90 公分以上。

### 現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 建功高級中學   |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-4)                                |
| 執照日期  | 設計：086.01.20      完工：092.12.09<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

- (1) 廁所盥洗室 / 鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在 90 公分以上。



(2) 廁所盥洗室/求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置緊急求助鈴，其按鈕應設置兩處，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分處，另一處在馬桶前緣往前 35 公分、高 35 公分處，且按鈕應明確標示。

(3) 廁所盥洗室/淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 75 公分。



(4) 廁所盥洗室/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。



(5) 無障礙樓梯：尚未改善

無障礙樓梯尚未改善-無照片

(6)無障礙昇降設備：  
尚未改善



(7)無障礙輪椅觀眾席位：  
尚未改善



(8)無障礙停車空間：  
尚未改善



督導委員建議事項

無

| 現場會勘缺失說明 (四) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 陶板屋-新竹北大分公司                               |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-3)                              |
| 執照日期         | 設計：081.08.25 完工：087.01.19<br>變更：100.12.23 |



#### 現場會勘缺失說明

- (1) 廁所盥洗室/標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖 902.1 之無障礙標誌，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。



#### 督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。
2. 廁所盥洗室/扶手：洗面盆與環繞洗臉盆之扶手間距過大，不易使用。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 縣市別  | 新竹市政府             |
| 騎樓路段 | 竹北市光明六路 89 號起(騎樓) |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 | ×    |      |       |      |    |
| 備 註   |      |      |       |      |    |

現場會勘缺失說明（五）

(1)地面順平：部分地面有高低差，地面順平未處理。



(以下空白)

(以下空白)

(以下空白)

(以下空白)

表 4.2.9 嘉義市政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：嘉義市政府  | 督導日期：105 年 09 月 23 日 |
| 副召集人：黃仁鋼<br>督導委員：陳淑玲、蔡崑茂、李訓良   | 出席單位：<br>營建署建管組 吳芷恩  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| <p>1. 億哲科技股份有限公司（新建建築物）：</p> <p>(1) 建築書圖/洗面盆高度標示錯誤。</p> <p>2. 財團法人台灣省私立嘉義博愛仁愛之家(既有建築物)：</p> <p>(1) 樓梯/警示設施-終端警示：距梯級終端 30 公分處，應設置深度不得小於 30 公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。</p> <p>(2) 昇降設備/昇降機廂-後視鏡：面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡(寬 30-35 公分，高 20 公分以上)，後視鏡之下緣距機廂地面 85 公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度大於 90 公分。</p> <p>(3) 廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。</p> <p>(4) 浴室/淋浴間-移位式淋浴間-扶手：兩側牆壁應設置水平扶手，其入口對向牆壁之水平扶手長度不得小於 45 公分，扶手上緣距地板面 75 公分；入口之牆壁近外緣處 2 側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手，其長度不得小於 60 公分。</p> <p>(5) 無障礙標誌/無障礙通路、電梯、浴室:應於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。昇降設備應設置平行牆面及突出牆面之無障礙標誌。</p> <p>3. 雲朗觀光股份有限公司嘉義分公司（既有建築物）：</p> <p>(1) 昇降設備/引導標誌-突出牆壁：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面 200-220 公分，尺寸不得小於 15 公分。</p> <p>4. 嘉義市嘉義國民中學(既有建築物)：</p> <p>(1) 廁所盥洗室/洗面盆-扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣 1~3 公分。</p> <p>5. 嘉義市中山路 114 號路段及 159 號路段(騎樓)：</p> <p>(1) 地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。</p> <p>(2) 坡道處理：坡道處理不符合無障礙設計規範坡道之坡度比。</p> <p>(以下空白)</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 億哲科技股份有限公司                                |        |
| 使用類別  | C類 工業、倉儲類 (C-2)                           |        |
| 執照日期  | 設計：103.05.06 完工：103.07.17<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| 建築圖說部份  |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     | ×      |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

### 無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



### 督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室/扶手過寬: 扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分。
2. 停車空間-引導標誌: 車道入口處應設置明顯之指引標誌, 引導無障礙停車位之方向及位置。


### 現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 財團法人台灣省私立嘉義博愛仁愛之家                         |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期  | 設計：089.05.06 完工：089.11.09<br>變更：000.00.00 |




### 現場會勘缺失說明

(1)樓梯/警示設施-終端警示：距梯級終端 30 公分處，應設置深度不得小於 30 公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。

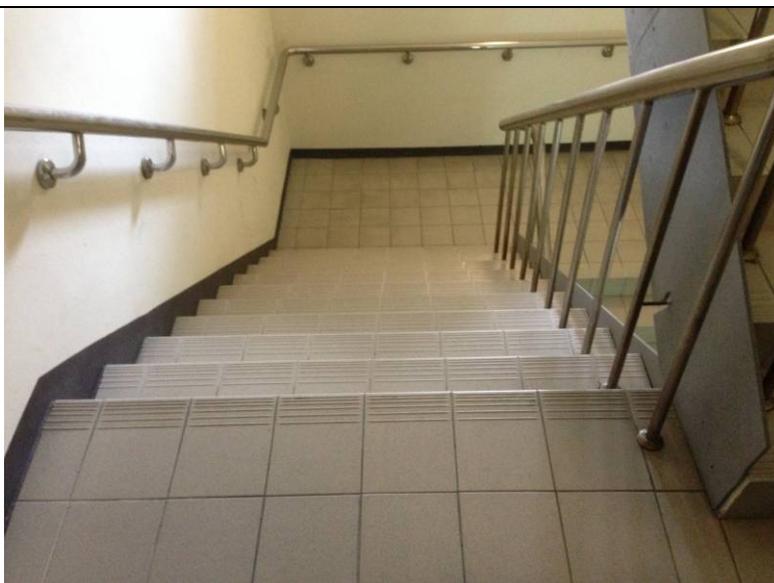

(2) 昇降設備/昇降機廂-後視鏡：面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡（寬 30-35 公分，高 20 公分以上），後視鏡之下緣距機廂地面 85 公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度大於 90 公分。

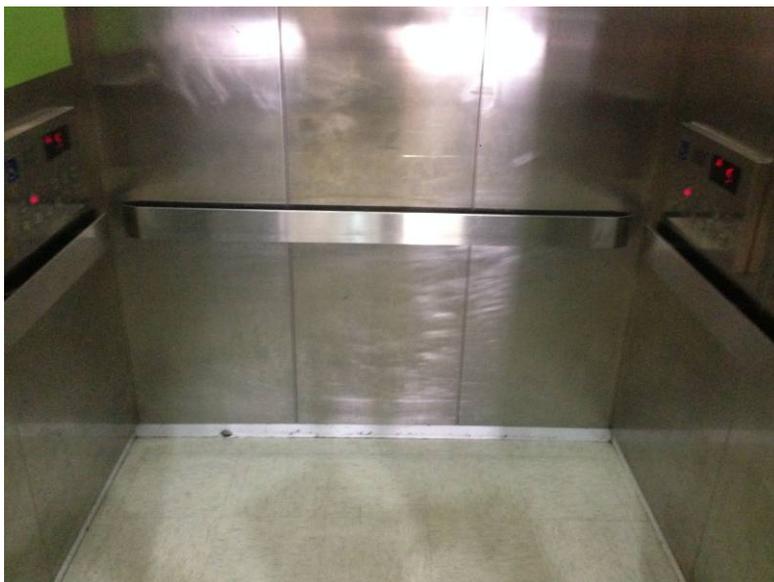

(3) 廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。



(4) 浴室/淋浴間-移位式淋浴間-扶手：兩側牆壁應設置水平扶手，其入口對向牆壁之水平扶手長度不得小於 45 公分，扶手上緣距地板面 75 公分；入口之牆壁近外緣處 2 側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手，其長度不得小於 60 公分。



(5)無障礙標誌/無障礙通路、電梯、浴室：應於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。昇降設備應設置平行牆面及突出牆面之無障礙標誌。



#### 督導委員建議事項


1. 入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙廁所及無障礙昇降機方向指引。
2. 大門進入後至安養中心之通路的順平。
3. 昇降設備引導設有點字之呼叫鈕前方 30 公分處之地板，應作 30 公分 X60 公分不同材質處理。
4. 廁所盥洗室/鏡子太小且太高：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在 90 公分以上。
5. 浴室：應設置求助鈴一處距地板高 90-120 公分處；另一處具地板面 35-45 公分處且按鈕應明確標示。

| 現場會勘缺失說明 (三) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 雲朗觀光股份有限公司嘉義分公司   |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-4)  |
| 執照日期         | 設計：087.12.08      完工：068.04.23<br>(為變始發照日期)      變更：104.05.29 |



現場會勘缺失說明

(1) 昇降設備/引導標誌-突出牆壁：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面200-220公分，尺寸不得小於15公分。

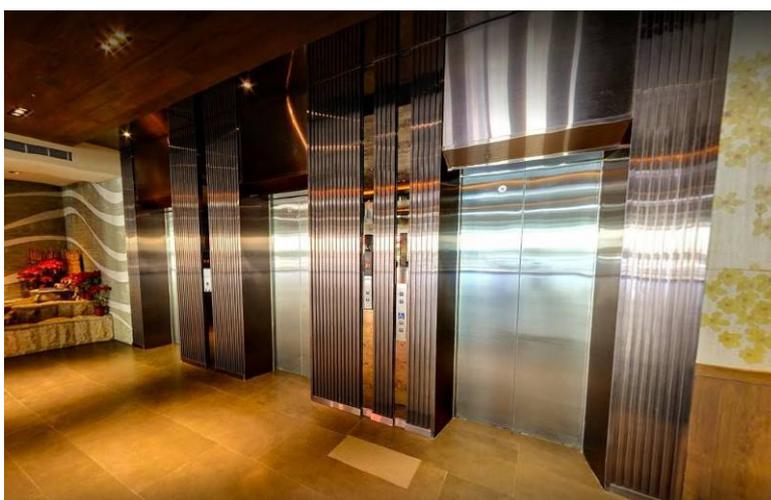

督導委員建議事項

1. 入口樓梯建議加裝扶手。
2. 廁所盥洗室/扶手寬度小於規範：扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分。
3. 室外應設置無障礙坡道引導標誌。

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 嘉義市嘉義國民中學                                      |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-4)                                |
| 執照日期  | 設計：089.12.26      完工：090.06.22<br>變更：104.05.29 |



### 現場會勘缺失說明

(1) 廁所盥洗室/洗面盆-扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1~3公分。



### 督導委員建議事項

1. 中庭木棧道空間於邊緣加設警示帶。
2. 昇降設備/鏡子高度過高。
3. 廁所盥洗室/扶手寬度大於規範：扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分。
4. 停車空間/車位豎立標誌建議移至外側。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                      |
|------|----------------------|
| 縣市別  | 嘉義市政府                |
| 騎樓路段 | 中山路 114 號路段及 159 號路段 |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平       | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 | ×          | ×    |       |      |    |
| 備 註   | 此路段為騎樓順平路段 |      |       |      |    |

現場會勘缺失說明 (五)

(1)地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。



(2)坡道處理：坡道處理不符合無障礙設計規範坡道之坡度比。



(以下空白)

(以下空白)

表 4.2.10 宜蘭縣政府實地現場考核紀錄

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 受督導單位：宜蘭縣政府   | 督導日期：105 年 09 月 20 日              |
| 副召集人：林震富<br>督導委員：謝瑤馨、蔡崑茂、黃文彬  | 出席單位：<br>營建署建管組 蔡志祥<br>交通部觀光局 李中彥 |
| 會勘缺失記錄  |                                   |
| <p>1. 宜蘭縣冬山鄉公所圖書館（新建建築物）：</p> <p>(1)樓梯/扶手與欄杆-扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。</p> <p>2. 第五季國際旅店(既有建築物)：</p> <p>(1)停車空間/通則：無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙升降機之便捷處。</p> <p>3. 南館市場(既有建築物)：</p> <p>無意見。</p> <p>4. 利澤老街(騎樓)：</p> <p>(1)地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。</p> <p>(2)其它：騎樓占用情形嚴重。</p> <p>(以下空白)</p> |                                   |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 宜蘭縣冬山鄉公所圖書館                               |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-2)                           |
| 執照日期         | 設計：102.10.04 完工：104.10.13<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

## 現場會勘缺失說明

(1) 樓梯/扶手與欄杆-扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。



## 督導委員建議事項

1. 無障礙通路：無障礙廁所門口的櫃子請移至適當位置，勿擋住通路。
2. 廁所盥洗室門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手。
3. 停車空間：格線不明顯部分請補強，另連接無障礙通路入口處請順平。
4. 無障礙標誌：全區無障礙引導標誌請依照設計規範重新檢討。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 第五季國際旅店                                   |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期         | 設計：079.12.07 完工：081.10.23<br>變更：103.XX.XX |



現場會勘缺失說明

(1) 停車空間/通則：  
無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙升降機之便捷處。



督導委員建議事項

1. 無障礙通路之扶手端不應做防勾撞處理。
2. 無障礙通路引導標誌宜再加強。
3. 昇降設備之昇降機入口應裝設觸覺裝置及顯示樓層數字。

現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 南館市場   |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-2)                                   |
| 執照日期  | 設計：066.03.19      完工：068.01.09<br>變更：000.00.00 |



無障礙設施、設備部份

無意見



督導委員建議事項

1. 樓梯警示設施尺寸請依規範改善。
2. 昇降設備之昇降機廂點字標示位置請修正至操作盤按鈕左側。
3. 廁所盥洗室之馬桶扶手及求助鈴位置請依規範調整。
4. 無障礙機車停車空間豎立及地面標誌請依規範修正。

現場會勘缺失說明 (四)

|      |       |
|------|-------|
| 縣市別  | 宜蘭縣政府 |
| 騎樓路段 | 利澤老街  |




騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 | ×    |      |       |      | ×  |
| 備 註   |      |      |       |      |    |

現場會勘缺失說明 (五)

(1)地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。

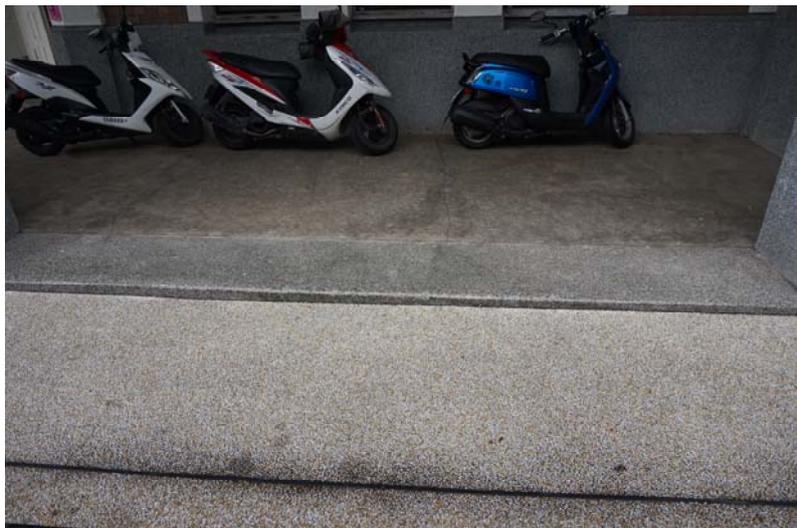

(2)其它：騎樓占用情形嚴重。



(以下空白)

(以下空白)

表 4.2.11 新竹縣政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：新竹縣政府  | 督導日期：105 年 09 月 08 日 |
| 副召集人：蘇憲民<br>督導委員：梁仁勳、郭鴻鑾、張木藤   | 出席單位：<br>營建署建管組 汪德君  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| <p>1. 新竹縣竹北市公所麻園活動中心（新建建築物）：</p> <p>(1) 廁所盥洗室/引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70 公分。</p> <p>(3) 廁所盥洗室/洗面盆/高度：洗面盆上緣距地板面不得大於 80 公分，且洗面盆下面距面盆邊緣 20 公分之範圍，由地板面量起高 65 公分及水平 30 公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。</p> <p>(4) 廁所盥洗室/一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處。</p> <p>2. 平安護理之家(既有建築物)：</p> <p>(1) 坡道/防護設施-坡道邊緣防護：高低差大於 20 公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度 5 公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外；或設置與地面淨距離不得大於 5 公分之防護桿（板）。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，鏡面的高度應在 90 公分以上。</p> <p>(3) 浴室/輪椅進入式淋浴間-扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆皆需設置扶手，距地板面高度 75 公分，距牆角 15 公分內得不設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度 75 公分之可動式扶手。</p> <p>3. 關西六福村生態度假旅館(既有建築物)：</p> <p>無意見。</p> <p>4. 新竹汽車客運(股)公司-關西總站(既有建築物)：</p> <p>無意見。</p> <p>5. 新竹縣竹北市光明六路 89 號(騎樓)：</p> <p>非騎樓整平路段，不予計分<br/>(以下空白)</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 新竹縣竹北市公所麻園活動中心                            |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-2)                           |
| 執照日期         | 設計：103.06.20 完工：104.03.04<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |


## 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。



(2)廁所盥洗室/淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70 公分。

(3)廁所盥洗室/洗面盆/高度：洗面盆上緣距地板面不得大於 80 公分，且洗面盆下面距面盆邊緣 20 公分之範圍，由地板面量起高 65 公分及水平 30 公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。

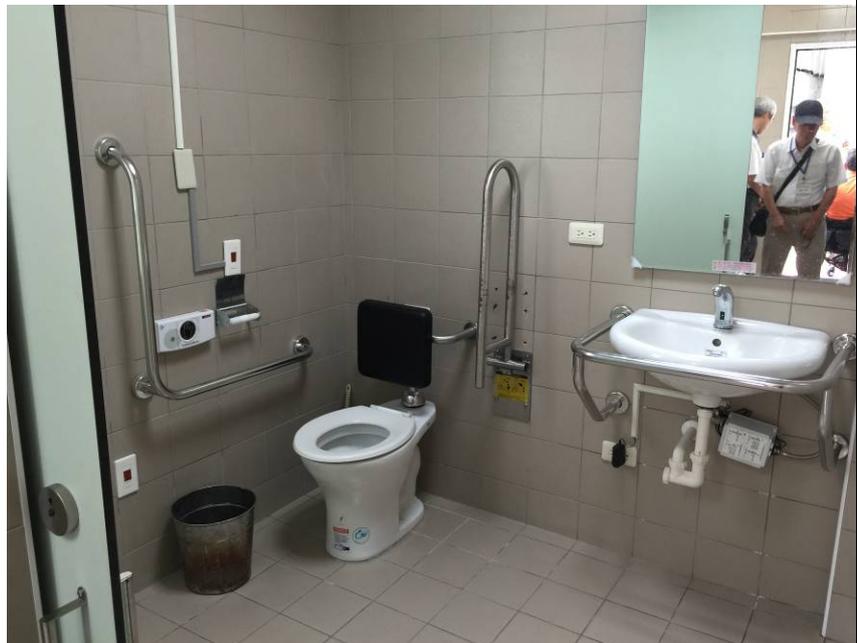

(4)廁所盥洗室/一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處。



#### 督導委員建議事項

1. 無障礙停車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於 90 公分×90 公分，停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反差效果，下車區應為白色斜線及直線，予以區別。
2. 引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。


### 現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 平安護理之家                                    |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期  | 設計：099.08.26 完工：100.10.26<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1)坡道/防護設施-坡道邊緣防護：高低差大於 20 公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度 5 公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外；或設置與地面淨距離不得大於 5 公分之防護桿（板）。

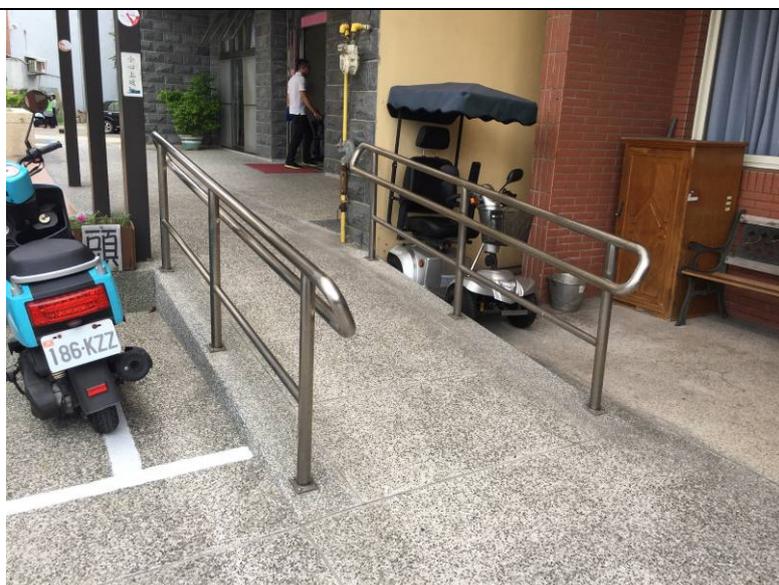

(2) 廁所盥洗室/鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，鏡面的高度應在 90 公分以上。



(3) 浴室/輪椅進入式淋浴間-扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆皆需設置扶手，距地板面高度 75 公分，距牆角 15 公分內得不設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度 75 公分之可動式扶手。



#### 督導委員建議事項

1. 入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙廁所及無障礙昇降機方向指引。


| 現場會勘缺失說明 (三)  |  |
|---|--|
| 建築物名稱   | 關西六福村生態度假旅館  |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)   |
| 執照日期  | 設計：096.06.15      完工：098.10.02<br>變更：000.00.00                                       |
|    |  |
| <b>無障礙設施、設備部份</b>   |  |
| 無意見   |  |
| <b>督導委員建議事項</b>   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 淋浴空間建議設置兩處求助鈴。</li> <li>2. 無障礙停車格線之顏色應為藍色，下車區應為白色斜線，以利區別。</li> <li>3. 建議設置機車停車位。</li> </ol> |  |

| 現場會勘缺失說明 (四) |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 建築物名稱        | 新竹汽車客運(股)公司-關西總站            |
| 使用類別         | A類 公共集會類 (A-2)              |
| 執照日期         | 舊有合法建築物<br>謄本登記日期為 60.03.18 |



無障礙設施、設備部份

無意見。

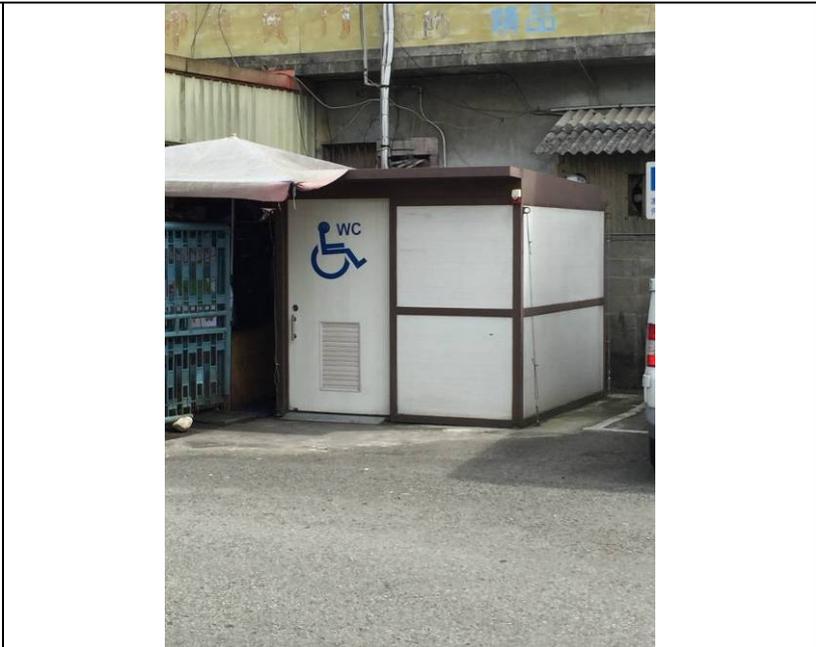

督導委員建議事項

無意見。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 縣市別  | 新竹縣政府             |
| 騎樓路段 | 竹北市光明六路 89 號起(騎樓) |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平         | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|--------------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |              |      |       |      |    |
| 備 註   | 非騎樓整平路段，不予計分 |      |       |      |    |

表 4.2.12 苗栗縣政府實地現場考核紀錄

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 受督導單位：苗栗縣政府   | 督導日期：105 年 09 月 21 日              |
| 副召集人：黃仁銅<br>督導委員：陳大榮、郭鴻鑾  | 出席單位：<br>營建署建管組 陳雅芳<br>教育部國教署 林怡君 |
| 會勘缺失記錄  |                                   |
| <p>1. 銅鑼國小附設多功能活動中心（新建建築物）：</p> <p>(1) 建築圖說部分：配置圖-引導設施。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</p> <p>(3) 建築技術規則第 167 條之 4：建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室，現場未設置。</p> <p>2. 頭份圖書館(既有建築物)：</p> <p>(1) 樓梯/扶手與欄杆/水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</p> <p>3. 竹南火車站(既有建築物)：</p> <p>(1) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</p> <p>4. 大倫國中(既有建築物)：</p> <p>(1) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</p> <p>(2) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 75 公分。</p> <p>(3) 無障礙樓梯未改善。</p> <p>(4) 無障礙昇降設備未設置。</p> <p>5. 苗栗市中正路 880~916 號(騎樓)：</p> <p>(1) 連續騎樓長度未滿 100 公尺，不予計分。<br/>(以下空白)</p> |                                   |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 銅鑼國小附設多功能活動中心                             |        |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-2)                           |        |
| 執照日期  | 設計：102.11.12 完工：104.08.27<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| 建築圖說部份  |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   | ×      |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     |        |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

## 無障礙設施、設備部份

(1) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。



(2) 建築技術規則第 167 條之 4：建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室，現場未設置。



### 督導委員建議事項

1. 樓梯防墜欄杆高度不足，建議改善。
2. 全區無障礙引導標誌不清楚，建請全面再檢討改善。
3. 無障礙廁所盥洗室馬桶兩側扶手寬度過寬，建請修正。


### 現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 頭份圖書館                                     |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-2)                           |
| 執照日期  | 設計：070.10.13 完工：072.01.20<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1)樓梯/扶手與欄杆/水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。

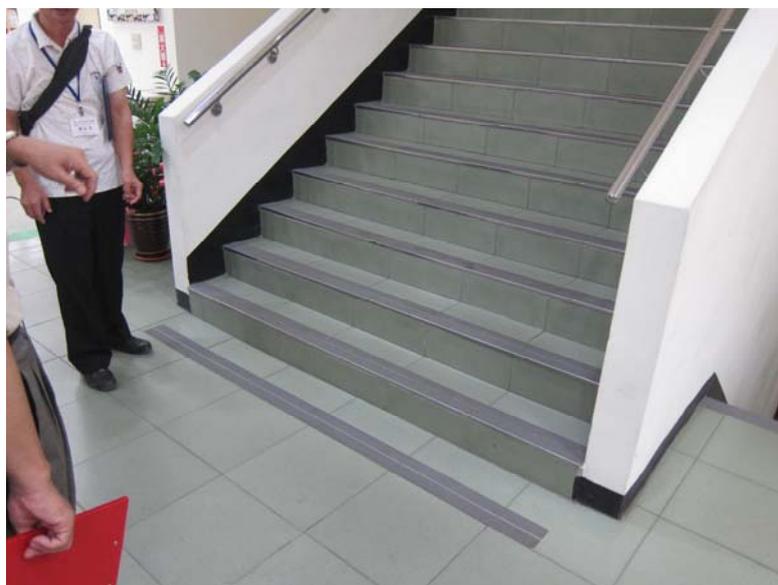

(2) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分。



#### 督導委員建議事項

1. 正門口無障礙通路建議加設扶手。
2. 樓梯警示設施請依規範改善。
3. 無障礙升降機立面標誌請補作。
4. 無障礙廁所盥洗室洗面盆扶手間隔及鏡子高度請依規範改善。
5. 無障礙廁所盥洗室門把略有夾手問題，門擋位置建議調整。
6. 廁所盥洗室之無障礙引導標誌建議加強。

### 現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 竹南火車站  |
| 使用類別  | A類 公共集會類 (A-2)                                 |
| 執照日期  | 設計：094.10.26      完工：098.08.31<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。



### 督導委員建議事項

1. 停車空間入口處標誌及格線請依規範修正，坑洞部分請填補順平。
2. 昇降設備及廁所盥洗室之無障礙引導標誌建議加強

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 大倫國中   |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-3)                                |
| 執照日期  | 設計：XXX.XX.XX      完工：073.07.17<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。



(2) 廁所盥洗室/馬桶及扶手/淨空間：淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於75公分。



(3) 無障礙樓梯未改善。



(4) 無障礙昇降設備未設置。

昇降設備建置中，無照片

#### 督導委員建議事項

1. 無障礙廁所盥洗室立面標誌及鏡子高度請依規範改善。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                  |
|------|------------------|
| 縣市別  | 苗栗縣政府            |
| 騎樓路段 | 苗栗市中正路 880~916 號 |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平                 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|----------------------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |                      |      |       |      |    |
| 備 註   | 連續騎樓長度不足 100 公尺，不予計分 |      |       |      |    |

表 4.2.13 彰化縣政府實地現場考核紀錄

|  |   |
|--|---|
| <p>受督導單位：彰化縣政府</p>   | <p>督導日期：105 年 10 月 05 日</p>                         |
| <p>副召集人：吳敏男<br/>督導委員：郭鴻鑾、陳奎宏、柯坤男</p>   | <p>出席單位：<br/>營建署建管組：陳雅芳<br/>衛福部：林芳玉<br/>國教署：楊雨璇</p> |
| <p>會勘缺失記錄</p>  |   |
| <p>1. 彰化縣警察局（新建建築物）：<br/>         (1) 廁所盥洗室/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</p> <p>2. 彰化縣秀水鄉明正國民小學(既有建築物)：<br/>         (1) 廁所盥洗室/可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</p> <p>3. 埔心老人養護中心(既有建築物)：<br/>         無意見。</p> <p>4. 彰化分局花壇分駐所(既有建築物)：<br/>         無意見。</p> <p>5. 彰化縣員林鎮中正路(永昌街至四維街)(騎樓)：<br/>         (1) 地面順平：部份路段高低差仍以階梯方式處理。<br/>         (以下空白)</p> |   |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |  |
|---|---|--|
| 建築物名稱   | 彰化縣警察局                                    |  |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |  |
| 執照日期  | 設計：103.02.13 完工：104.07.20<br>變更：000.00.00 |  |
|  |   |  |
| 建築圖說部份  | 不符規定項目                                    |  |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |  |
|   | 避難層出入口                                    |  |
|   | 室內出入口                                     |  |
|   | 樓梯  |  |
|   | 昇降設備                                      |  |
|   | 室內通路走廊                                    |  |
|   | 廁所盥洗室                                     |  |
|   | 浴室  |  |
| 輪椅觀眾席位  |   |  |

## 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分。



## 督導委員建議事項

1. 建議室外坡道扶手不用做水平延伸。
2. 廁所/引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。
3. 停車位/入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。
4. 圖說詳圖標示不清如廁所、樓梯、坡道等建議改善。


### 現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 彰化縣秀水鄉明正國民小學                              |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-3)                           |
| 執照日期  | 設計：073.07.31 完工：074.03.06<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1) 廁所盥洗室/可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。

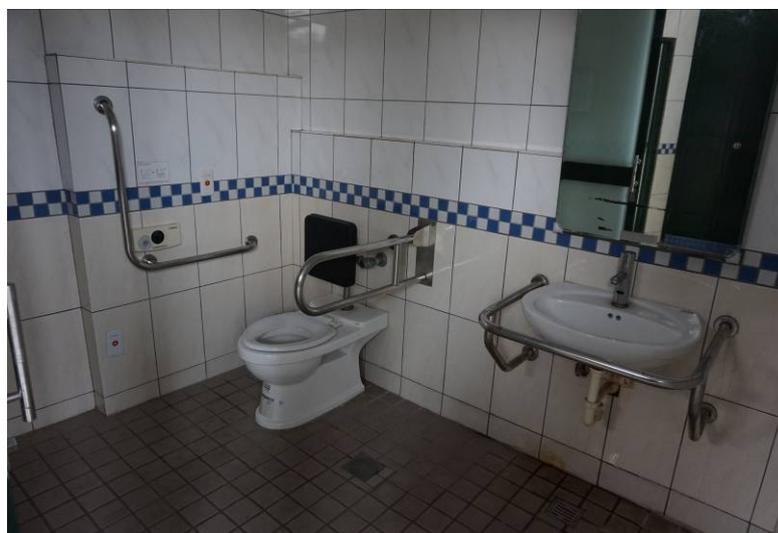

### 督導委員建議事項

1. 停車位/車位豎立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為 40 公分×40 公分以上，下緣高度 190-200 公分。
2. 室外通路/室外通路設計-室外通路警示設施特別規定：室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視障者使用，應依 305.1 設置終端警示設施，其寬度不得小於 130 公分或該階梯寬度。
3. 洗面盆/扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗面盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣 1-3 公分。
4. 廁所門會夾手建議改善。
5. 無障礙電梯標誌太低建議改善。
6. 教室門與室外通路有高低差建議改善。
7. 樓梯與室外通路有高低差建議改善。
8. 室外通路無連接至操場建議改善。
9. 建議水溝蓋改方向或加鐵絲網。
10. 樓梯樑下高度不足 1 米 9，樓梯扶手應避免設置於樑下。

| 現場會勘缺失說明 (三)   |  |
|--|--|
| 建築物名稱  | 埔心老人養護中心   |
| 使用類別   | H 類 住宿類 (H-1)  |
| 執照日期   | 設計：000.00.00      完工：088.12.03<br>變更：000.00.00                                       |
|   |  |
| <b>無障礙設施、設備部份</b>  |  |
| 無意見。   |  |
| <b>督導委員建議事項</b>  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廁所上方懸掛殘障專用標誌建議拿掉。</li> <li>2. 廁所/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。</li> <li>3. 廁所/可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。</li> <li>4. 建議廁所設置緊急求助鈴標示。</li> <li>5. 建議室外坡道設置服務鈴標示。</li> </ol> |  |

### 現場會勘缺失說明（四）

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 彰化分局花壇分駐所                                 |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |
| 執照日期  | 設計：076.11.21 完工：078.01.19<br>變更：000.00.00 |



### 無障礙設施、設備部份

無意見。



### 督導委員建議事項

1. 建議改善停車位下車區方向以利行動不便者方便進出。
2. 廁所/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。
3. 廁所/可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。

現場會勘缺失說明（五）

|      |                        |
|------|------------------------|
| 縣市別  | 彰化縣政府                  |
| 騎樓路段 | 彰化縣員林鎮中正路（永昌街至四維街）（騎樓） |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平   | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|--|------|-------|------|----|
| 不合格項目 | ×  |      |       |      |    |
| 備 註   | 1. 此路段為騎樓順平路段。<br>2. 建議事項：建議招牌高度應距地面 190 公分。 |      |       |      |    |

現場會勘缺失說明（五）

(1)地面順平：部份  
路段高低差仍以  
階梯方式處理。



(以下空白)

(以下空白)

(以下空白)

(以下空白)

表 4.2.14 南投縣政府實地現場考核紀錄

|   |                      |
|---|----------------------|
| 受督導單位：南投縣政府   | 督導日期：105 年 10 月 03 日 |
| 副召集人：樂中丕<br>督導委員：李訓良、楊德明、林敏哲  | 出席單位：<br>營建署建管組 洪信一  |
| 會勘缺失記錄  |                      |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鯉潭派出所（新建建築物）：<br/>    無意見</li> <li>2. 集集晴海旅館（既有建築物）：<br/>    無意見</li> <li>3. 吉康護理之家（既有建築物）：<br/>    無意見</li> <li>4. 異人館咖啡屋草屯店（既有建築物）：<br/>    無意見</li> <li>5. 草屯鎮太平路二段育英街口至碧山路口東側(騎樓)<br/>    無意見<br/>    (以下空白)</li> </ol> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 鯉潭派出所                                     |
| 使用類別         | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |
| 執照日期         | 設計：102.08.08 完工：103.06.13<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 | 不符規定項目 |  |
|------------------------|--------|--|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |  |
|                        | 避難層出入口 |  |
|                        | 室內出入口  |  |
|                        | 樓梯     |  |
|                        | 昇降設備   |  |
|                        | 室內通路走廊 |  |
|                        | 廁所盥洗室  |  |
|                        | 浴室     |  |
| 輪椅觀眾席位                 |        |  |

無障礙設施、設備部份

無意見



無意見



督導委員建議事項

1. 構造詳圖之室外通路無障礙坡道應標註尺寸大小。

### 現場會勘缺失說明 (二)

|       |                              |              |
|-------|------------------------------|--------------|
| 建築物名稱 | 集集晴海旅館                       |              |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                 |              |
| 執照日期  | 設計：000.00.00<br>變更：000.00.00 | 完工：095.06.02 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項


1. 無障礙室外通路地面應平整、堅固、防滑。
2. 可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度與馬桶前端相等，並確實固定於牆上。

| 現場會勘缺失說明 (三) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 吉康護理之家                                    |
| 使用類別         | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期         | 設計：000.00.00 完工：075.12.31<br>變更：085.05.24 |



無障礙設施、設備部份

無意見

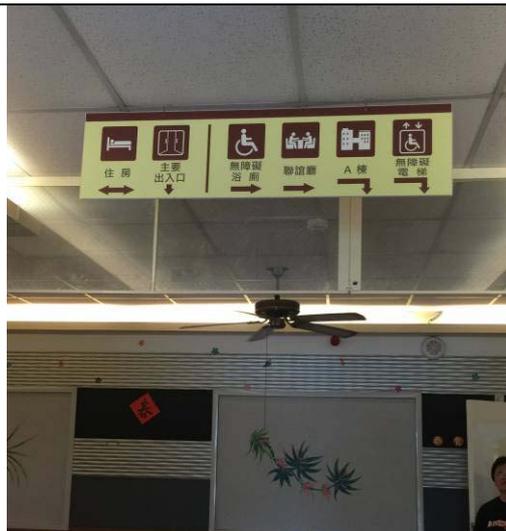

督導委員建議事項

無意見

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 異人館咖啡屋草屯店                                      |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-3)                                   |
| 執照日期  | 設計：000.00.00      完工：101.03.30<br>變更：000.00.00 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見




#### 督導委員建議事項

1. 車位豎立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40公分x40公分以上，下緣高度190-200公分。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |              |
|------|--------------|
| 縣市別  | 南投縣政府        |
| 騎樓路段 | 草屯鎮太平路二段育英街口 |

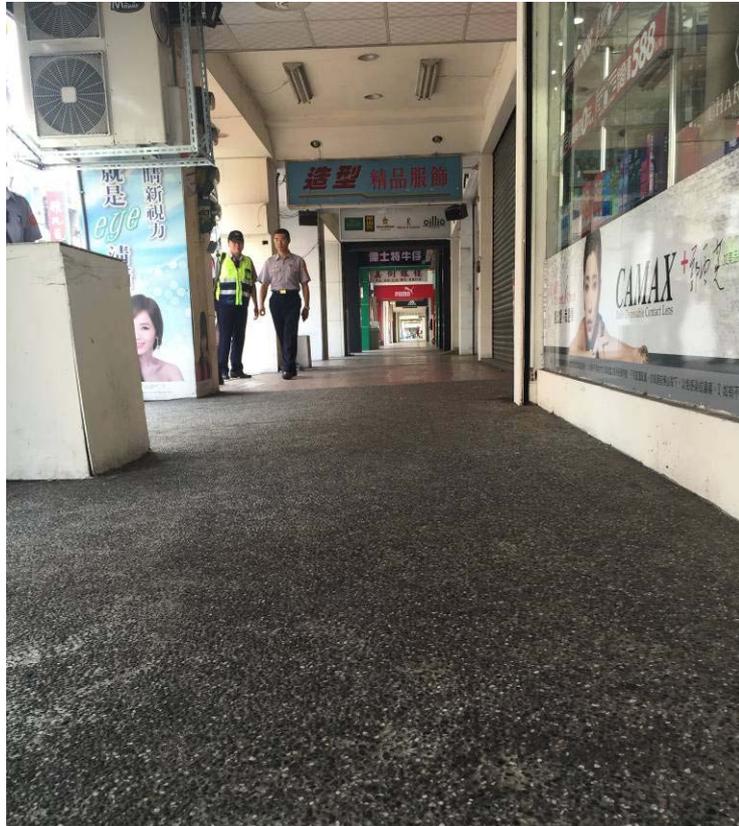

騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平  | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|---|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |   |      |       |      |    |
| 備 註   | 1. 此路段為騎樓順平路段。<br>2. 建議事項：騎樓兩端坡道處理須符合無障礙設計規範坡道之坡度比。<br>3. 建議事項：坡道上方之水溝格柵須符合無障規範之室外通路之相關規定。<br>4. 建議事項：牆壁上突出物須做警示措施。 |      |       |      |    |

表 4.2.15 雲林縣政府實地現場考核紀錄

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <p>受督導單位：雲林縣政府</p>  | <p>督導日期：105 年 09 月 26 日</p> |
| <p>副召集人：蘇憲民<br/>督導委員：陳政雄、鄭淑勻、劉金鐘</p>  | <p>出席單位：<br/>營建署建管組 吳芷恩</p> |
| <p>會勘缺失記錄</p>   |                             |
| <p>1. 中華郵政股份有限公司（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 莿桐鄉大美國民小學（既有建築物）：<br/>無意見。</p> <p>3. 虎尾鎮立圖書館（既有建築物）：<br/>(1)樓梯/扶手與欄杆-水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸 30 公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。</p> <p>4. 育仁醫院（既有建築物）：<br/>(1)廁所盥洗室/洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣 1~3 公分。</p> <p>5. 騎樓：<br/>未提供騎樓整平、順平路段，不予計分。</p> <p>（以下空白）</p> |                             |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |  |
|---|---|--|
| 建築物名稱   | 中華郵政股份有限公司                                |  |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-1)                           |  |
| 執照日期  | 設計：102.11.01 完工：104.12.09<br>變更：000.00.00 |  |
|  |   |  |
| 建築圖說部份  | 不符規定項目                                    |  |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |  |
|   | 避難層出入口                                    |  |
|   | 室內出入口                                     |  |
|   | 樓梯  |  |
|   | 昇降設備                                      |  |
|   | 室內通路走廊                                    |  |
|   | 廁所盥洗室                                     |  |
|   | 浴室  |  |
| 輪椅觀眾席位  |   |  |

無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



督導委員建議事項

1. 室外通路設計/引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 荊桐鄉大美國民小學                                 |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-3)                           |
| 執照日期         | 設計：096.01.09 完工：097.08.08<br>變更：000.00.00 |



**無障礙設施、設備部份**

無意見



**督導委員建議事項**

1. 廁所盥洗室/沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前 10 公分及馬桶座面上約 40 公分處，建議增設。

### 現場會勘缺失說明 (三)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 虎尾鎮立圖書館                                   |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (B-4)                           |
| 執照日期  | 設計：083.05.11 完工：084.11.21<br>變更：100.06.24 |



### 現場會勘缺失說明

(1)樓梯/扶手與欄杆-  
水平延伸：樓梯兩  
端扶手應水平延伸  
30 公分以上，並  
作端部防勾撞處  
理，扶手水平延  
伸，不得突出於走  
道上；另中間連續  
扶手，於平台處得  
不需水平延伸。



### 督導委員建議事項

1. 室外通路/坡道：地面應選擇防滑材質。
2. 廁所盥洗室/鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在 90 公分以上。現設置之傾斜鏡面斜度過大，建議修正。
3. 廁所盥洗室/引導標誌：建議往前設置至較顯眼之位置。
4. 建議增設無障礙服務台。

| 現場會勘缺失說明 (四) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 育仁醫院                                      |
| 使用類別         | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期         | 設計：082.09.21 完工：085.09.11<br>變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

- (1) 廁所盥洗室/洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1~3公分。



#### 督導委員建議事項

1. 室外通路/坡道：地面應選擇防滑材質。
2. 樓梯/扶手：1樓靠牆之扶手建議修正為L行之支撐架，以防擋手。
3. 浴室/門：5樓浴室門建議增設水平扶手，以利使用者開關門。

表 4.2.16 嘉義縣政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：嘉義縣政府  | 督導日期：105 年 09 月 12 日 |
| 副召集人：吳敏男<br>督導委員：林俊福、王武烈、梁仁勳   | 出席單位：<br>營建署建管組 蔡瑞艇  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| <p>1. 國立中正大學（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 國立東石高級中學（既有建築物）：<br/>           (1) 廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。</p> <p>3. 嘉義縣消防局-朴子分隊（既有建築物）：<br/>           (1) 廁所盥洗室/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。<br/>           (2) 停車空間/單一停車位：汽車停車位長度不得小於 600 公分、寬度不得小於 350 公分，包括寬 150 公分的下車區。</p> <p>4. 朴子衛生所（既有建築物）：<br/>           (1) 廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。<br/>           (2) 廁所盥洗室/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。</p> <p>5. 無（騎樓）：<br/>           未提供騎樓整平、順平路段，不予計分。<br/>           （以下空白）</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 國立中正大學                                    |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-4)                           |
| 執照日期         | 設計：101.06.01 完工：104.11.03<br>變更：000.00.00 |




| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

無障礙設施、設備部份

無意見



無意見

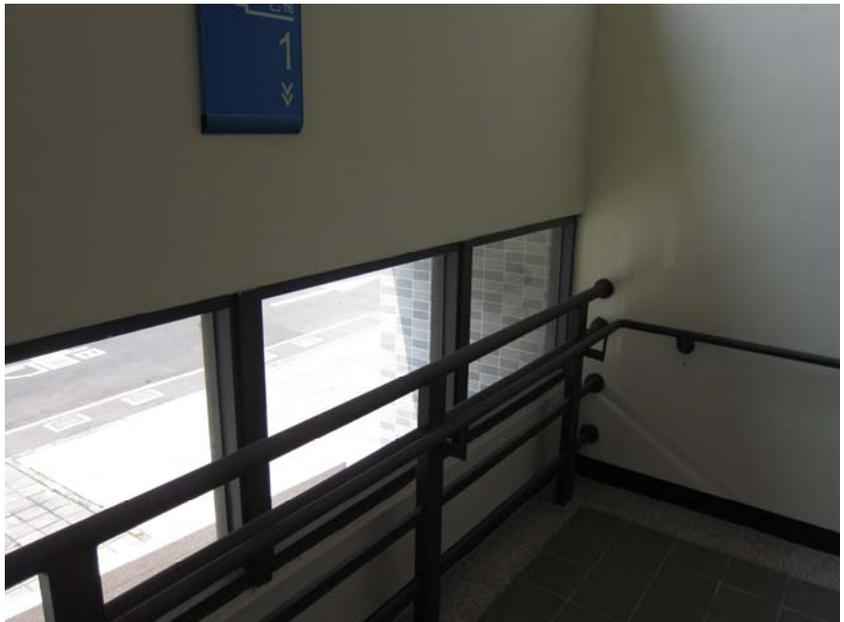

督導委員建議事項

1. 一般男女廁所標誌立體化方便視障人士辨識。
2. 廁所盥洗室/門: 靠牆之一側應於距門把 3-5 公分處設置門擋, 以防止夾手。
3. 輪椅觀眾席位劃設標線。
4. 講台應設置坡道標示。
5. 入口附近水溝蓋隔柵更換為開口不大於 1.3 公分。

| 現場會勘缺失說明 (二) |                              |
|--------------|------------------------------|
| 建築物名稱        | 國立東石高級中學                     |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-4)              |
| 執照日期         | 設計：084.12.12    完工：087.01.20 |
|              | 設計：087.03.18    完工：087.12.21 |



**現場會勘缺失說明**

(1)廁所盥洗室/扶手-側邊L型扶手：馬桶側面牆壁應裝置L型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27公分。



**督導委員建議事項**

1. 無障礙通路/坡道:地面應平整(不得設置導盲磚)、增設服務鈴及標誌。
2. 樓梯/防護緣:梯級末鄰接牆壁部分,應設置高出梯級5公分以上之防護緣。
3. 廁所盥洗室/入口引導:應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示,如主要走道與廁所開門方向平行,則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。
4. 廁所盥洗室/門把、門擋:門把距門邊應保持6公分,靠牆一側並應於距門把3-5公分處設置門擋,以防止夾手;建議將更換為撥扣式或其他易於使用之鎖。

現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 嘉義縣消防局-朴子分隊                                    |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                                |
| 執照日期  | 設計：095.10.17      完工：097.04.15<br>變更：000.00.00 |



現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/門:廁所盥洗室空間應採用橫向拉門,出入口之淨寬不得小於80公分,且門把距門邊應保持6公分,靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋,以防止夾手;門扇得設於牆之內外側。



(2)停車空間/單一停車位：汽車停車位長度不得小於 600 公分、寬度不得小於 350 公分，包括寬 150 公分的下車區。



#### 督導委員建議事項

1. 門口服務鈴設置位置太高。
2. 廁所盥洗室/扶手高度過高:側邊 L 型扶手水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分;可動扶手高度與對側之扶手高度相等。
3. 廁所盥洗室/鏡子:鏡面底端與地板面距離不得大於 90 公分;鏡子高度應在 90 公分以上。
4. 廁所盥洗室/求助鈴:其按鈕設置兩處，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分處，另一處在馬桶前緣往前 35 公分、高 35 公分處，且按鈕應明確標示。
5. 廁所盥洗室/沖水控制:可為手動或自動，手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前 10 公分及馬桶座面上約 40 公分處。


### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 朴子市衛生所   |
| 使用類別  | G類 辦工、服務類 (G-2)                                |
| 執照日期  | 設計：089.05.05      完工：091.06.26<br>變更：000.00.00 |



### 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/扶手-側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。

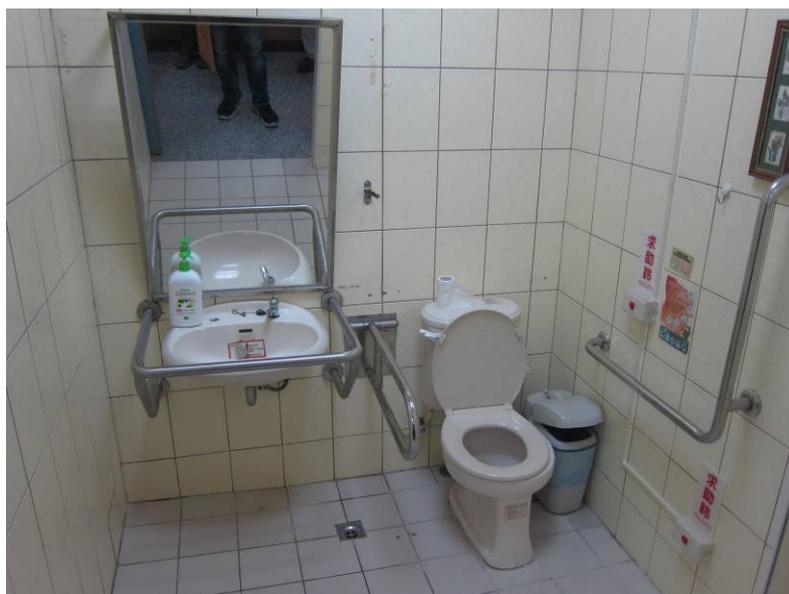

(2)廁所盥洗室/門:廁所盥洗室空間應採用橫向拉門,出入口之淨寬不得小於80公分,且門把距門邊應保持6公分,靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋,以防止夾手;門扇得設於牆之內外側。



#### 督導委員建議事項

1. 入口坡道應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌、服務鈴；樓梯應設置警示帶。
2. 戶外水溝蓋應齊平道路及基地。
3. 樓梯/水平延伸：樓梯靠牆面扶手應水平延伸30公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上。
4. 昇降設備/標示：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面200-220公分，尺寸不得小於15公分。點字更換至按鍵左邊。

表 4.2.17 屏東縣政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：屏東縣政府  | 督導日期：105 年 09 月 13 日 |
| 副召集人：樂中丕<br>督導委員：柯坤男、陳奎宏、陳政雄   | 出席單位：<br>營建署建管組 洪信一  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| <p>1. 屏東市國民運動中心（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 清淨家園老人長期照護中心(既有建築物)：<br/>(1)無障礙通路/通則/地面：通路地面應平整、堅固、防滑。</p> <p>3. 崁農老人養護中心(既有建築物)：<br/>無意見。</p> <p>4. 東港鎮公所(既有建築物)：<br/>本案為採用替代改善計畫之受考核案件，其計畫已依照程序送地方諮詢審查委員會審核通過並依計畫改善完成。</p> <p>5. 屏東市復興路 2 號至 40 號(騎樓)<br/>無意見。<br/>(以下空白)</p> |                      |

| 現場會勘缺失說明（一） |   |
|-------------|---|
| 建築物名稱       | 屏東市國民運動中心                                 |
| 使用類別        | D類 休閒、文教類（D-1）                            |
| 執照日期        | 設計：102.01.03 完工：104.07.06<br>變更：000.00.00 |



| 現場會勘缺失說明（一）            |        |  |
|------------------------|--------|--|
| 建築圖說部份                 | 不符規定項目 |  |
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |  |
|                        | 避難層出入口 |  |
|                        | 室內出入口  |  |
|                        | 樓梯     |  |
|                        | 昇降設備   |  |
|                        | 室內通路走廊 |  |
|                        | 廁所盥洗室  |  |
|                        | 浴室     |  |
| 輪椅觀眾席位                 |        |  |

## 無障礙設施、設備部份

無意見



無意見



### 委員建議事項

1. 無障礙坡道扶手設置-端部處理：扶手端部應作防勾撞處理，並視需設置可供視障者辨識之資訊或點字。
2. 無障礙廁所高差：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。

| 現場會勘缺失說明 (二) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 清淨家園老人長期照護中心                                   |
| 使用類別         | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                             |
| 執照日期         | 設計：091.09.02      完工：092.12.22<br>變更：000.00.00 |



現場會勘缺失說明

(1)無障礙通路/通則/地面：通路地面應平整、堅固、防滑。



委員建議事項

1. 無障礙廁所之高差：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。

現場會勘缺失說明 (三)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 崁農老人養護中心                                      |
| 使用類別  | H類 住宿類 (H-1)                                  |
| 執照日期  | 設計：09005.07      完工：092.05.24<br>變更：000.00.00 |



無障礙設施、設備部份

無意見



委員建議事項

無意見

| 現場會勘缺失說明 (四) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 東港鎮公所  |
| 使用類別         | G類 辦公、服務類 (G-2)                                |
| 執照日期         | 設計：060.10.28      完工：062.10.20<br>變更：000.00.00 |



現場會勘缺失說明

本案為採用替代改善計畫之受考核案件，其計畫已依照程序送地方諮詢審查委員會審核通過並依計畫改善完成。



委員建議事項

無意見

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                    |
|------|--------------------|
| 縣市別  | 屏東縣政府              |
| 騎樓路段 | 屏東市復興路 2 號至 40 號騎樓 |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平                                    | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|---|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |   |      |       |      |    |
| 備 註   | 1. 此路段為騎樓順平路段。<br>2. 建議事項：人行道上的水溝蓋請加細網。 |      |       |      |    |

表 4.2.18 花蓮縣政府實地現場考核紀錄

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 受督導單位：花蓮縣政府   | 督導日期：105 年 09 月 21 日             |
| 副召集人：吳敏男<br>督導委員：鄭淑勻、湯浣平、林敏哲  | 出席單位：<br>營建署建管組 汪德君<br>衛生福利部 王秋萍 |
| 會勘缺失記錄  |                                  |
| <p>1. 衛生福利部東區老人之家（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 新城鄉新城火車站（新建建築物）：<br/>(1)既有建築物改為新建建築物，圖說部分不計分。<br/>(2)建築物未依規定應設置無障礙停車位。</p> <p>3. 南平火車站（新建建築物）：<br/>(1)既有建築物改為新建建築物，圖說部分不計分。<br/>(2)現場無障礙設備設施無意見。</p> <p>4. 壽豐火車站（新建建築物）：<br/>(1)既有建築物改為新建建築物，本地點未現勘故不計分。</p> <p>5. 花蓮市林森路口（中山路博愛街口）：<br/>無意見。<br/>(以下空白)</p> |                                  |

| 現場會勘缺失說明 (一) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 衛生福利部東區老人之家                               |
| 使用類別         | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期         | 設計：102.04.29 完工：105.03.01<br>變更：000.00.00 |



| 建築圖說部份                 |        | 不符規定項目 |
|------------------------|--------|--------|
| 配置圖(比例尺大小不限)           |        |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)         |        |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手  |        |
|                        | 避難層出入口 |        |
|                        | 室內出入口  |        |
|                        | 樓梯     |        |
|                        | 昇降設備   |        |
|                        | 室內通路走廊 |        |
|                        | 廁所盥洗室  |        |
|                        | 浴室     |        |
| 輪椅觀眾席位                 |        |        |

## 無障礙設施、設備部份

無意見



無意見



### 督導委員建議事項


1. 建議室外通路無障礙坡道入口處增設服務鈴。
2. 無障礙廁所：
  - (1) 建議以馬桶水箱代替靠背。
  - (2) 建議撥扣式門鎖加裝 8 公分撥桿。
3. 建議無障礙浴室採用乾濕分離。
4. 建議一樓入口處設置垂直牆面無障礙標誌。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 新城鄉新城火車站                                  |
| 使用類別         | A類 公共集會類 (A-2)                            |
| 執照日期         | 設計：101.10.08 完工：104.08.13<br>變更：000.00.00 |



**現場會勘缺失說明**

- (1)既有建築物改為新建建築物，圖說部分不計分。
- (2)建築物未依規定設置無障礙停車位。

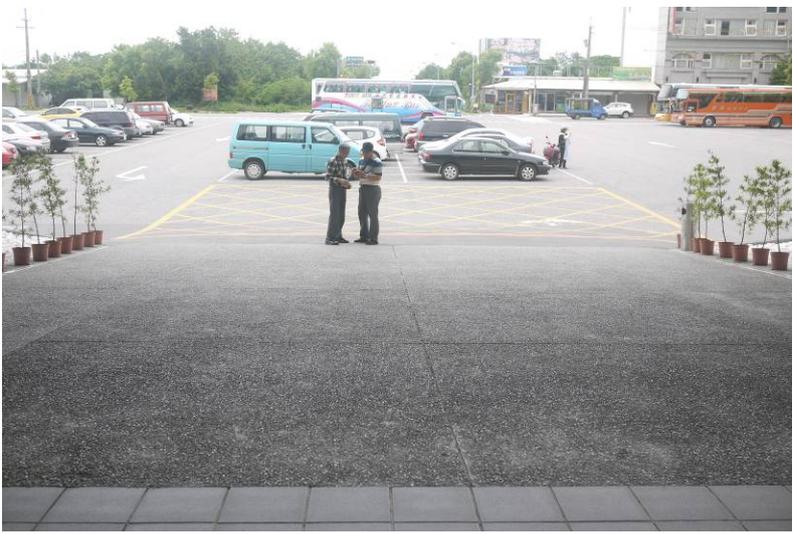

**督導委員建議事項**

無意見

| 現場會勘缺失說明 (三) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 南平火車站                                     |
| 使用類別         | A 類 公共集會類 (A-2)                           |
| 執照日期         | 設計：101.08.20 完工：104.04.24<br>變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

- (1) 既有建築物改為新建建築物，圖說部分不計分。
- (2) 現場無障礙設備設施無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 無障礙樓梯與自行車道坡道需分開設置。
2. 求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置緊急求助鈴，其按鈕應設置兩處，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分處，另一處在馬桶前緣往前 35 公分、高 35 公分處，且按鈕應明確標示。
3. 停車位地面：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質的砂或石礫，高低差不得大於 0.5 公分，坡度不得大於 1/50。
4. 入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。

現場會勘缺失說明 (四)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 壽豐火車站                                     |
| 使用類別  | A類 公共集會類 (A-2)                            |
| 執照日期  | 設計：102.03.29 完工：104.08.13<br>變更：000.00.00 |



現場會勘缺失說明

(1)既有建築物改為新建建築物，本地點未現勘故不計分。



督導委員建議事項

無意見

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                  |
|------|------------------|
| 縣市別  | 花蓮縣政府            |
| 騎樓路段 | 花蓮市林森路口(中山路博愛街口) |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平 | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |      |      |       |      |    |
| 備 註   |      |      |       |      |    |

表 4.2.19 臺東縣政府實地現場考核紀錄

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 受督導單位：臺東縣政府   | 督導日期：105 年 09 月 13 日              |
| 副召集人：吳敏男<br>督導委員：陳大榮、鄭淑勻、謝瑤馨  | 出席單位：<br>營建署建管組：蔡瑞艇<br>交通部觀光局：夏道彰 |
| 會勘缺失記錄  |                                   |
| <p>1. 凱旋星光酒店股份有限公司（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 台東桂田璽悅酒店(既有建築物)：<br/>           (1)無障礙通路/設計原則-引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。<br/>           (2)停車空間/車位豎立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為 40 公分x40 公分以上，下緣高度 190-200 公分。</p> <p>3. 歐鄉牛排館(既有建築物)：<br/>無意見。</p> <p>4. 東霸王餐廳（既有建築物）：<br/>無意見。</p> <p>5. (騎樓)：<br/>未提供騎樓整平、順平路段，不予計分<br/>(以下空白)</p> |                                   |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 凱旋星光酒店股份有限公司                              |        |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                              |        |
| 執照日期  | 設計：102.11.07 完工：104.10.29<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| 建築圖說部份  |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     |        |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

## 無障礙設施、設備部份

無意見。



### 督導委員建議事項

1. 建議入口處斜坡道上水溝蓋做安全處理。
2. 廁所/小便器/高度：小便器之突出端距地板面應為 35-38 公分。小便器頂部距樓地板面為 100-120 公分。
3. 廁所/小便器/扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面 85 公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為 65-70 公分；平行牆面之扶手上緣距地板面 120 公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為 60 公分，長度為 55 公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為 25 公分。
4. 建議無障礙客房廁所門加門檔。
5. 樓梯/樓梯設計-樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達 190 公分部份應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視障者之設施)。
6. 樓梯/樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退至少一階。但扶手符合平順轉折，且平台寬度符合規定者，不在此限。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨距離應不得小於 190 公分。
7. 建議樓梯加立面標誌。
8. 建議停車位加懸掛式標誌。
9. 停車場入口處斜坡版有高低差，建議改為固定式。
10. 建議無障礙設施設備圖說應與現場設置相符。


### 現場會勘缺失說明 (二)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 台東桂田璽悅酒店                                  |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期  | 設計：082.12.16 完工：089.03.28<br>變更：103.10.02 |



### 現場會勘缺失說明

(1) 無障礙通路/設計原則-引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。

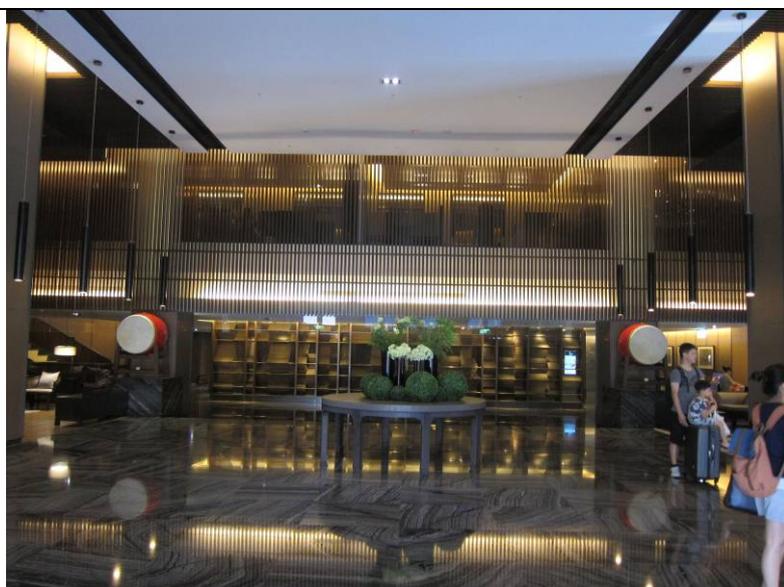

(2) 停車空間/車位豎立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為 40 公分×40 公分以上，下緣高度 190-200 公分。



### 督導委員建議事項

1. 大廳室內通路有高低差建議加無障礙立牌標誌。
2. 電梯/升降機呼叫鈕：梯廳及門廳內的呼叫鈕之中心線高度應距樓地板面 110 公分，呼叫鈕左邊應設置點字。呼叫鈕最小的尺寸應為長寬各 2 公分以上；或直徑 2 公分以上。
3. 電梯/升降機入口的觸覺裝置：在升降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各 8 公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬 6 公分、長 8 公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方 135 公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同。
4. 電梯/扶手：機廂內至少兩側牆面應設置扶手，扶手之設置應符合 207 節之規定。
5. 電梯/後視鏡：面對機廂之後側壁應設置安全玻璃之後視鏡（若後側壁為鏡面不銹鋼或類似材質得免之）或懸掛式之廣角鏡（寬 30-35 公分，高 20 公分以上），後視鏡之下緣距機廂地面 85 公分，寬度不得小於出入口淨寬，高度大於 90 公分。
6. 廁所/側邊 L 型扶手：馬桶側面牆壁應裝置 L 型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。
7. 廁所/可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於 15 公分。
8. 廁所/小便器/扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面 85 公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為 65-70 公分；平行牆面之扶手上緣距地板面 120 公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為 60 公分，長度為 55 公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為 25 公分。
9. 廁所/洗面盆/扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣 1~3 公分。
10. 建議往停車場入口處設置活動式斜坡板。
11. 建議改善全區引導標誌(如廁所、電梯、停車位等)。
12. 室外通路/設計原則-坡度：地面坡度不得大於 1/15，超過者須依 206 規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台，該平台之坡度不得大於 1/50。
13. 建議室外坡道加服務鈴標示。
14. 建議改善室外通路水溝蓋方向。
15. 建議調整全區燈光亮度。

### 現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 歐鄉牛排館  |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-3)                                   |
| 執照日期  | 設計：077.05.25      完工：078.01.19<br>變更：092.10.16 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 建議入口處斜坡道有高低差做處理。
2. 廁所/標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖 902.1 之無障礙標誌，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。

| 現場會勘缺失說明 (四) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 東霸王餐廳  |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-3)                                   |
| 執照日期         | 設計：085.02.05      完工：085.06.14<br>變更：000.00.00 |



無障礙設施、設備部份

無意見。



督導委員建議事項

1. 廁所門把會夾手建議改善。
2. 建議將廁所內上方加封板。
3. 建議牆上設置無障礙廁所標誌。

表 4.2.20 澎湖縣政府實地現場考核紀錄

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <p>受督導單位：澎湖縣政府</p>   | <p>督導日期：105 年 10 月 05 日</p> |
| <p>副召集人：樂中丕<br/>督導委員：楊檔巖、林敏哲、鄭介文</p>   | <p>出席單位：<br/>營建署建管組 蔡瑞艇</p> |
| <p>會勘缺失記錄</p>  |                             |
| <p>1. 文澳國小體育館（新建建築物）：<br/>無意見。</p> <p>2. 雅霖大飯店(既有建築物)：<br/>(1)建築技術規則建築設計施工編第 167 條之 7：建築物使用類組為 B-4 組者，其客房數十六間以上一百間以下者，至少應設置一間無障礙客房，超過一百間者，超過部分每增加一百間及其餘數，應增加一間無障礙客房（本地點客房總數 104 間，無障礙客房數量 1 間）。</p> <p>3. 勝國大飯店(既有建築物)：<br/>(1)建築技術規則建築設計施工編第 167 條之 7：建築物使用類組為 B-4 組者，其客房數十六間以上一百間以下者，至少應設置一間無障礙客房，超過一百間者，超過部分每增加一百間及其餘數，應增加一間無障礙客房（本地點客房總數 130 間，無障礙客房數量 1 間）。<br/>(2)無障礙客房衛浴空間已依據替代改善計畫改善，但現場身障者仍無法進入使用，請重新檢討替代改善計畫之合理性。</p> <p>4. 海洋渡假村(既有建築物)：<br/>(1)廁所盥洗室/廁所/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。</p> <p>5. 無(騎樓)：<br/>未提供騎樓整平、順平路段，不予計分。</p> <p>(以下空白)</p> |                             |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |  |
|---|---|--|
| 建築物名稱   | 文澳國小體育館                                   |  |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-2)                           |  |
| 執照日期  | 設計：102.12.24 完工：104.12.11<br>變更：000.00.00 |  |
|  |   |  |
| 建築圖說部份  | 不符規定項目                                    |  |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |  |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |  |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |  |
|   | 避難層出入口                                    |  |
|   | 室內出入口                                     |  |
|   | 樓梯  |  |
|   | 昇降設備                                      |  |
|   | 室內通路走廊                                    |  |
|   | 廁所盥洗室                                     |  |
|   | 浴室  |  |
| 輪椅觀眾席位  |   |  |

無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



督導委員建議事項

1. 無障礙廁所盥洗室請補作立面標誌。
2. 無障礙廁所盥洗室求助鈴無反應，建請改善。
3. 停車空間與無障礙通路之標誌相互錯置，建請修正。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 雅霖大飯店                                     |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-4)                              |
| 執照日期         | 設計：XXX.XX.XX 完工：098.07.23<br>變更：103.XX.XX |



#### 現場會勘缺失說明

(1) 建築技術規則 建築設計施工編第 167 條之 7：建築物使用類組為 B-4 組者，其客房數十六間以上一百間以下者，至少應設置一間無障礙客房，超過一百間者，超過部分每增加一百間及其餘數，應增加一間無障礙客房（本地點客房總數 104 間，無障礙客房數量 1 間）。



#### 督導委員建議事項

1. 一樓升降設備警示帶位置請依規範調整，九樓升降設備警示帶請補作。
2. 無障礙廁所盥洗室之門把夾手問題、門鎖形式、求助鈴數量建請依規範改善。
3. 無障礙廁所盥洗室之馬桶至兩側扶手不等距，建請改善。
4. 無障礙客房浴室之馬桶側邊淨空間不足 70 公分及洗面盆下方未符合膝蓋淨容納空間規定，建請改善。
5. 無障礙客房求助鈴數量未符規定，建請改善。

現場會勘缺失說明 (三)

|       |  |
|-------|--|
| 建築物名稱 | 勝國大飯店  |
| 使用類別  | B類 商業類 (B-4)   |
| 執照日期  | 設計：067. XX. XX      完工：084. 05. 03<br>變更：000. 00. 00 |



現場會勘缺失說明

(1) 建築技術規則建築設計施工編第 167 條之 7：建築物使用類組為 B-4 組者，其客房數十六間以上一百間以下者，至少應設置一間無障礙客房，超過一百間者，超過部分每增加一百間及其餘數，應增加一間無障礙客房（本地點客房總數 130 間，無障礙客房數量 1 間）。



(2)無障礙客房衛浴空間已依據替代改善計畫改善，但現場身障者仍無法進入使用，請重新檢討替代改善計畫之合理性。



**督導委員建議事項**

無意見。

| 現場會勘缺失說明 (四) |  |
|--------------|--|
| 建築物名稱        | 海洋渡假村  |
| 使用類別         | B類 商業類 (B-4)                                   |
| 執照日期         | 設計：XXX.XX.XX      完工：096.10.01<br>變更：000.00.00 |



現場會勘缺失說明

(1) 廁所盥洗室/廁所/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。



督導委員建議事項

1. 昇降設廂後視鏡位置過高，建請調整。
2. 廁所盥洗室馬桶側邊淨空間不足，建請改善。

表 4.2.21 金門縣政府實地現場考核紀錄

|  |                      |
|--|----------------------|
| 受督導單位：金門縣政府  | 督導日期：105 年 10 月 24 日 |
| 共同召集人：高文婷<br>督導委員：李訓良、王武烈、詹政達  | 出席單位：<br>營建署建管組 陳雅芳  |
| 會勘缺失記錄   |                      |
| 1. 金門縣尚義機場-西側擴建案（新建建築物）：<br>無意見。<br><br>2. 金門縣尚義航空站-宿舍(既有建築物)：<br>無意見。<br><br>3. 衛福部金門醫院-衛生行政綜合醫療大樓(既有建築物)：<br>無意見。<br><br>4. 動植物防疫所(既有建築物)：<br>無意見。<br><br>5. 金門縣金湖鎮自強路段(騎樓)：<br>無意見。<br><br>(以下空白) |                      |


| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 金門縣尚義機場-西側擴建案                             |        |
| 使用類別  | A類 公共集會類 (A-2)                            |        |
| 執照日期  | 設計：100.03.25 完工：103.01.24<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| 建築圖說部份  |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     |        |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。

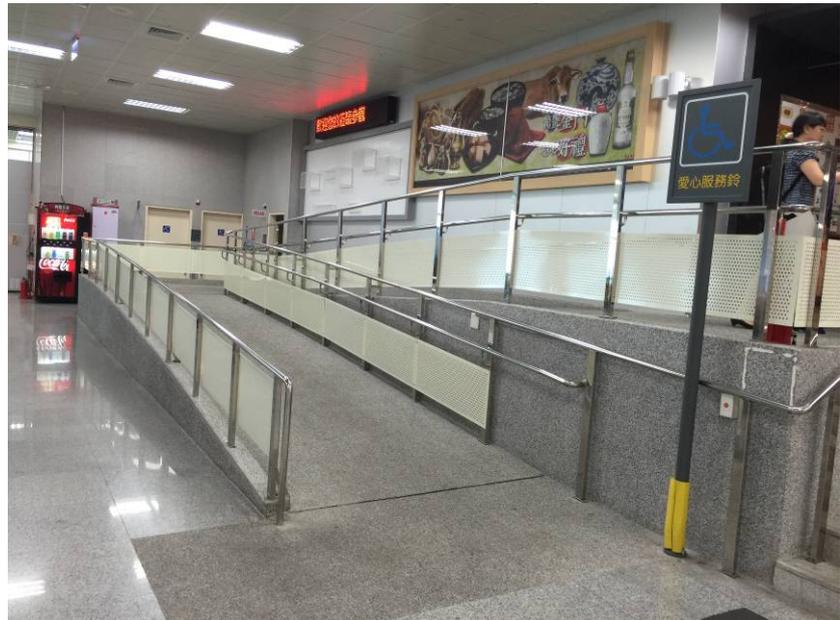

督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室-門：門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手。

| 現場會勘缺失說明 (二) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 金門縣尚義航空站-宿舍                               |
| 使用類別         | H類 住宿類 (H-2)                              |
| 執照日期         | 設計：099.03.26 完工：100.06.13<br>變更：000.00.00 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 廁所盥洗室/馬桶及扶手-淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於 70 公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於 60 公分，馬桶前緣淨空間不得小於 70 公分。(建議以新規範修正)
2. 無障礙標誌：建議通盤檢討與調整全區無障礙標誌。

### 現場會勘缺失說明 (三)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 衛福部金門醫院-衛生行政綜合醫療大樓                        |
| 使用類別  | F類 衛生、福利、更生類 (F-1)                        |
| 執照日期  | 設計：099.09.30 完工：103.01.13<br>變更：000.00.00 |



#### 無障礙設施、設備部份

無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 停車空間/引導標誌-入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。

### 現場會勘缺失說明 (四)

|       |   |
|-------|---|
| 建築物名稱 | 動植物防疫所                                    |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |
| 執照日期  | 設計：090.03.29 完工：091.05.20<br>變更：000.00.00 |



### 無障礙設施、設備部份

無意見。



無意見。



#### 督導委員建議事項

1. 昇降設備/昇降機廂：建議將機廂內之燈光調亮。
2. 昇降設備/昇降機廂：建議將機廂內之語音聲音調大。
3. 昇降設備/昇降機廂-點字標示：應設於一般操作盤（直式操作盤）按鈕左側。
4. 昇降設備/引導標誌-昇降機引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方 30 公分處之地板，應作 30 公分x60 公分之不同材質處理。
5. 廁所盥洗室/求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置兩處緊急求助鈴，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分，另在距地板面高 35 公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。
6. 廁所盥洗室/可動扶手：螺絲有鬆脫現象，請鎖緊。
7. 廁所盥洗室/馬桶：建議將馬桶蓋拿除。
8. 無障礙標誌：建議通盤檢討與調整全區無障礙標誌。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |                |
|------|----------------|
| 縣市別  | 金門縣政府          |
| 騎樓路段 | 金門縣金湖鎮自強路段(騎樓) |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平                           | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|--------------------------------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |                                |      |       |      |    |
| 備 註   | 建議事項：地面順平部分可與道路一併規劃，使坡度更為平緩好走。 |      |       |      |    |

表 4.2.22 連江縣政府實地現場考核紀錄

|  |  |
|--|--|
| <p>受督導單位：連江縣政府</p>   | <p>督導日期：105 年 11 月 01 日</p>                    |
| <p>副召集人：高文婷<br/>督導委員：楊檔巖、謝瑤馨、吳建忠</p>   | <p>出席單位：<br/>營建署建管組陳雅芳、蔡瑞艇、蔡志祥<br/>國教署 賴怡婷</p> |
| <p>會勘缺失記錄</p>  |  |
| <p>1. 馬祖郵政大樓（新建建築物）：</p> <p>(1)廁所盥洗室/廁所/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。</p> <p>(2)入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。</p> <p>2. 塘岐國小（既有建築物）：<br/>無意見</p> <p>3. 福沃公廁（既有建築物）：</p> <p>(1)廁所盥洗室/廁所/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側</p> <p>4. 馬祖圖書館（既有建築物）：</p> <p>(1)廁所盥洗室/廁所/求助鈴/位置：廁所盥洗室內應設置兩處緊急求助鈴，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分，另在距地板面高 35 公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。</p> <p>(2)建築物未依規定應設置無障礙停車位。</p> <p>5. 塘岐村人行步道<br/>連江縣無法定騎樓，以加權方式計分<br/>(以下空白)</p> |  |

| 現場會勘缺失說明 (一)  |   |        |
|---|---|--------|
| 建築物名稱   | 馬祖郵政大樓                                    |        |
| 使用類別  | G類 辦公、服務類 (G-2)                           |        |
| 執照日期  | 設計：101.04.19 完工：104.12.09<br>變更：000.00.00 |        |
|  |   |        |
| <b>建築圖說部份</b>   |   | 不符規定項目 |
| 配置圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)  |   |        |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一)  | 坡道及扶手                                     |        |
|   | 避難層出入口                                    |        |
|   | 室內出入口                                     |        |
|   | 樓梯  |        |
|   | 昇降設備                                      |        |
|   | 室內通路走廊                                    |        |
|   | 廁所盥洗室                                     |        |
|   | 浴室  |        |
| 輪椅觀眾席位  |   |        |

### 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/廁所/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。



(2)入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。



### 督導委員建議事項

1. 建議室外通路水溝蓋加裝鐵絲網。
2. 無障礙樓梯，距梯級終端 30 公分處，應設置深度 30-60 公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。
3. 昇降設備應設置語音系統以報知樓層數、行進方向及開關情形。

| 現場會勘缺失說明 (二)  |  |
|---|--|
| 建築物名稱   | 塘岐國小   |
| 使用類別  | D類 休閒、文教類 (D-3)  |
| 執照日期  | 設計：085.00.00      完工：095.06.02<br>變更：000.00.00                                       |
|  |  |
| <b>無障礙設施、設備部份</b>   |  |
| 無意見。  |  |
| <b>督導委員建議事項</b>   |  |
| 1. 建議改善室內通路與樓梯連接之高低差。   |  |

| 現場會勘缺失說明 (三) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 福沃公廁                                      |
| 使用類別         | G類 辦公、服務類 (G-3)                           |
| 執照日期         | 設計：000.00.00 完工：000.00.00<br>變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

(1)廁所盥洗室/廁所/門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於 80 公分，且門把距門邊應保持 6 公分，靠牆之一側並應於距門把 3-5 公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側



#### 督導委員建議事項

1. 建議無障礙廁所設置撥扣式門鎖。
2. 建議馬桶扶手依規範改善。

| 現場會勘缺失說明 (四) |   |
|--------------|---|
| 建築物名稱        | 馬祖圖書館                                     |
| 使用類別         | D類 休閒、文教類 (D-2)                           |
| 執照日期         | 設計：000.00.00 完工：000.00.00<br>變更：000.00.00 |



#### 現場會勘缺失說明

|   |            |
|---|------------|
| <p>(1)廁所盥洗室/廁所/求助鈴/位置：廁所盥洗室內應設置兩處緊急求助鈴，一處在距離馬桶前緣往後 15 公分、馬桶座位上 60 公分，另在距地板面高 35 公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。</p> |            |
| <p>(2)建築物未依規定應設置無障礙停車位。</p>   | <p>無照片</p> |

### 督導委員建議事項

1. 無障礙通路設單道扶手者，地面至扶手上緣高度為 75 公分；設雙道扶手者，高度分別為 85 公分、65 公分。
2. 無障礙樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度 75-85 公分之扶手或雙道扶手（高 65 公分及 85 公分），除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台（或樓板）間之高差在 20 公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。
3. 無障礙廁所應設置 L 型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35 公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於 70 公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為 27 公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為 27 公分。

現場會勘缺失說明 (五)

|      |        |
|------|--------|
| 縣市別  | 連江縣政府  |
| 騎樓路段 | 塘岐村人行道 |



騎樓整平現場會勘項目表

| 項 目   | 地面順平             | 坡道處理 | 水溝蓋方向 | 鋪面材質 | 其他 |
|-------|------------------|------|-------|------|----|
| 不合格項目 |                  |      |       |      |    |
| 備 註   | 連江縣無法定騎樓，以加權方式計分 |      |       |      |    |

### 三、實地現場考核成果

實地現場考核成果就實地現場考核評分疑義、建築圖說部份、無障礙設施、設備部份及騎樓整平共四部份做說明。

(一) 實地現場考核評分疑義：相關疑義經 105 年 10 月 24 日研商 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場考核評分事宜會議決議辦理方式如下：

1. 台中市政府-台中二中體育館、高雄市政府-岡山國中活動中心：就該棟建築物作考核評分範圍。
2. 苗栗縣政府-大倫國中、新竹市政府-建功高中：因無指定範圍可作區隔，以校園全區作為考核評分範圍，考量學校類建築物改善經費之特殊情形，未改善之項目每項扣 1 分。
3. 屏東縣政府-東港鎮公所及澎湖縣政府-勝國大飯店採用替代改善計畫之受考核案件，其計畫已依照程序送地方諮詢審查委員會審核通過並依計畫改善完成者，不予扣分。
4. 花蓮縣政府新建建築物-衛福部東區老人之家同意納為本次新建建築物現勘標的，惟明年度不得再次提報；既有建築物有進行現場查勘之新城火車站、南平火車站兩案以新建建物評分標準評分，未進行現場查勘之壽豐火車站不予計分。
5. 苗栗縣政府新建建築物-銅鑼國小附設多功能活動中心雖屬 D-3 類組，但因設有游泳池及浴室（淋浴間），故應符合技規第 167 條之 4 規定設置無障礙浴室，現場未設置依規定扣 5 分。
6. 新北市政府既有建築物-三芳護理之家，依據 97.10.24 內授營建管字第 0970808530 號函釋說明三「...依本辦法規定檢討如應設置供行動不便者使用之樓梯者，其整座樓梯應符合建築技術規則建築設計施工編第 167 條第 2 項所訂建築物無障礙設施設計規範之規定，或依身心障礙者權益保障法第 57 條規定提具替代改善計畫。」，該案未經地方諮詢審查委員會認定為毋須改善可免扣分，故依據督導計畫規定扣 1 分。

(二) 建築圖說部份：

表 4.3.1 建築圖說得分彙整表

| 組別  | 單位名稱  | 得分 | 組別     | 單位名稱  | 得分 |
|-----|-------|----|--------|-------|----|
| 都會型 | 台北市政府 | 5  | 城鎮型    | 苗栗縣政府 | 4  |
|     | 新北市政府 | 5  |        | 彰化縣政府 | 5  |
|     | 桃園市政府 | 5  |        | 南投縣政府 | 5  |
|     | 台中市政府 | 5  |        | 雲林縣政府 | 5  |
|     | 台南市政府 | 5  |        | 嘉義縣政府 | 5  |
|     | 高雄市政府 | 5  |        | 屏東縣政府 | 5  |
|     | 基隆市政府 | 3  |        | 花蓮縣政府 | 5  |
|     | 新竹市政府 | 4  |        | 台東縣政府 | 5  |
|     | 嘉義市政府 | 4  |        | 澎湖縣政府 | 5  |
| 城鎮型 | 宜蘭縣政府 | 5  | 偏遠及離島型 | 金門縣政府 | 5  |
|     | 新竹縣政府 | 5  |        | 連江縣政府 | 5  |

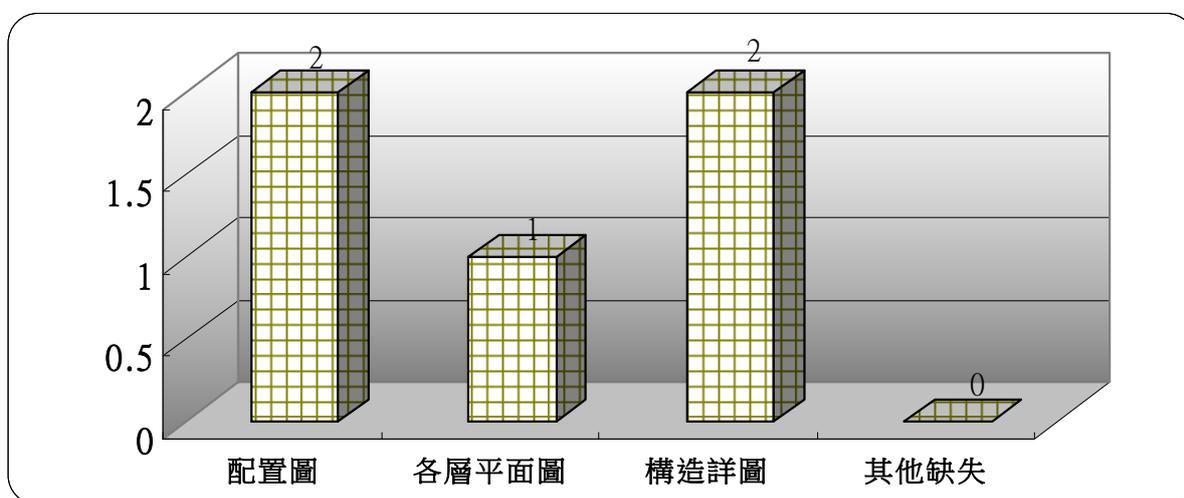


圖 4.3.1 建築圖說缺失數量統計圖


實地現場考核共計有 22 件建築物圖說（花蓮縣政府既有建築物改為新建建築物等三案之圖說不列入計分），其中計 18 件建築物圖說無缺失各得 5 分，建築物圖說缺失數量與去年比較，104 年考核 38 件建築物圖說總計 7 項缺失，105 年缺失數量減少為 5 項缺失，配置圖缺失 2 項、各層平面圖 1 項及構造詳圖缺失 5 項。

### (三) 無障礙設施、設備部份

實地現場考核評分是以無障礙設施設計規範為基礎，按各條文內容檢視評分；統計 105 年度督導每一建築物的設施設備錯誤數量彙整如下圖所示。

表 4.3.2 無障礙設施、設備部份得分（未計加分項目）彙整表

| 組別  | 單位名稱  | 得分 | 組別     | 單位名稱  | 得分    |
|-----|-------|----|--------|-------|-------|
| 都會型 | 台北市政府 | 79 | 城鎮型    | 苗栗縣政府 | 50    |
|     | 新北市政府 | 79 |        | 彰化縣政府 | 71    |
|     | 桃園市政府 | 75 |        | 南投縣政府 | 75    |
|     | 台中市政府 | 80 |        | 雲林縣政府 | 63    |
|     | 台南市政府 | 74 |        | 嘉義縣政府 | 60    |
|     | 高雄市政府 | 78 |        | 屏東縣政府 | 74    |
|     | 基隆市政府 | 73 |        | 花蓮縣政府 | 60    |
|     | 新竹市政府 | 65 |        | 台東縣政府 | 63    |
|     | 嘉義市政府 | 65 |        | 澎湖縣政府 | 61    |
| 城鎮型 | 宜蘭縣政府 | 60 | 偏遠及離島型 | 金門縣政府 | 80    |
|     | 新竹縣政府 | 51 |        | 連江縣政府 | 66.46 |

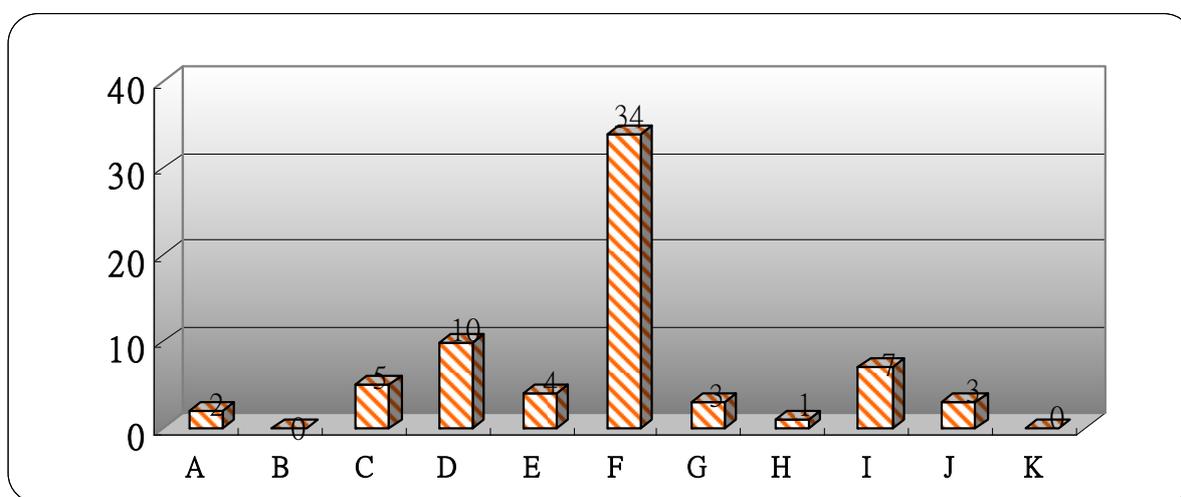

- A 標誌                      D 樓梯                      G 浴室                      J 無障礙客房  
 B 引導設施 (技規)      E 升降設備              H 輪椅觀眾席              K 其他  
 C 無障礙通路              F 廁所盥洗室              I 停車空間

圖 4.3.2 無障礙設施、設備部份缺失數量統計圖

實地現場考核以廁所盥洗室缺失最多，樓梯、停車空間、無障礙通路缺失次之。廁所盥洗室中以馬桶的活動扶手裝設位置尺寸及功能、門把設置、引導標誌等項目缺失較多。樓梯缺失以扶手設置尺寸及警示設施為主。

#### (四) 騎樓整平

表 4.3.3 騎樓整平得分彙整表

| 組別    | 單位名稱  | 得分    | 組別    | 單位名稱   | 得分    |       |
|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 都會型   | 台北市政府 | 15    | 城鎮型   | 苗栗縣政府  | 0     |       |
|       | 新北市政府 | 15    |       | 彰化縣政府  | 9     |       |
|       | 桃園市政府 | 15    |       | 南投縣政府  | 10    |       |
|       | 台中市政府 | 15    |       | 雲林縣政府  | 0     |       |
|       | 台南市政府 | 9     |       | 嘉義縣政府  | 0     |       |
|       | 高雄市政府 | 15    |       | 屏東縣政府  | 10    |       |
|       | 基隆市政府 | 13    |       | 偏遠及離島型 | 花蓮縣政府 | 15    |
|       | 新竹市政府 | 14    |       |        | 台東縣政府 | 0     |
|       | 嘉義市政府 | 8     |       |        | 澎湖縣政府 | 0     |
|       | 城鎮型   | 宜蘭縣政府 |       |        | 13    | 金門縣政府 |
| 新竹縣政府 |       | 0     | 連江縣政府 |        | 加權計算  |       |

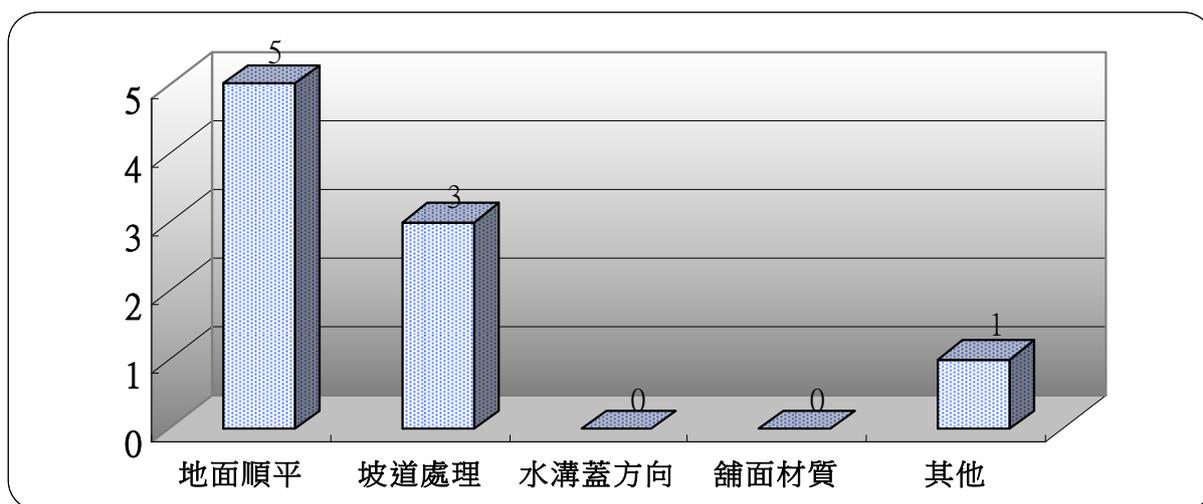


圖 4.3.3 騎樓整平缺失數量統計圖

實地現場考核共計有 17 段騎樓整平路段（含 3 段騎樓順平），雲林縣、嘉義縣、台東縣及澎湖縣未提報騎樓整平路段，連江縣因無法定騎樓，採加權計算；其中計 9 段騎樓整平路段無缺失（含 2 段騎樓順平），各得 10 分；地面順平缺失主要為部份路段高低差處理仍以階梯方式處理，坡道處理缺失為坡度不符規範規定。

#### 四、實地現場考核加分項目評分原則與參考表

實地現場考核加分項目分為「整體規劃」、「舒適貼心」及「設計創新」等三大類，相關說明如下：

- (一) 整體規劃：係指建築物全區引導設施與使用者動線合併規劃使其清楚美觀並配置完整、非屬建築物本身之軟硬體設施配合建築物使用性質規劃相關符合使用者需求之措施或服務、或建築物內相關設施之設置方式符合建築物無障礙設施設計規範附錄。
- (二) 舒適貼心：係指無障礙設施、設備數量高於法規要求。
- (三) 設計創新：係指無障礙設施、設備品質高於法規要求。

依據上述原則，彙整本年度實地現場考核之加分項目評分參考表及各受考核單位之加分項目得分如後：

表 4.4.1 實地現場考核加分項目評分參考表

| 類型                       | 案例說明  | 加分 | 備註                           |
|--------------------------|---|----|------------------------------|
| 整體<br>規劃                 | 1. 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖   | +2 |                              |
|                          | 2. 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務 | +2 | 僅符合其中一項者：1 分<br>最多 2 分       |
|                          | 3. 無障礙廁所、浴室內之衛生紙置放處、衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準        | +1 |                              |
|                          | 4. 配合建物使用性質規劃無障礙專區，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求                      | +2 | 僅符合其中一項者：1 分<br>最多 2 分       |
| 舒適<br>貼心<br>(設施數量高於法規要求) | 1. 建築物增設符合規定之無障礙廁所  | +3 | 多於兩處(部)者，每多一處(部)加 1 分；最多 5 分 |
|                          | 2. 建築物增設符合規定之無障礙升降機(無障礙樓梯)  | +3 |                              |
|                          | 3. 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位   | +2 |                              |
|                          | 4. 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示  | +2 |                              |
|                          | 5. 無障礙廁所增設沖洗設備、淋浴設備或求助鈴   | +1 |                              |
|                          | 6. 舞台、講台設有無障礙斜坡道或升降機可供行動不便人士上台  | +3 |                              |
|                          | 7. 室內出入口寬度全部大於 90 公分  | +2 | 既有建物經過改善者：3 分                |
|                          | 8. 主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴   | +1 |                              |
|                          | 9. 一般房間或廁所設有緊急求助鈴   | +1 |                              |

| 類型                       | 案例說明  | 加分 | 備註 |
|--------------------------|---|----|----|
| 設計<br>創新<br>(設施品質高於法規要求) | 1. 整體設計無障礙標誌清楚明確，加註相關必要說明。                  | +2 |    |
|                          | 2. 無障礙廁所之門鎖採長桿撥扣式之門鎖。                       | +1 |    |
|                          | 3. 求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍。                    | +1 |    |
|                          | 4. 無障礙升降機設置有固定座椅供長者使用，扣除坐椅使用空間後輪椅迴轉空間仍符合規定。 | +1 |    |
|                          | 5. 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。                         | +1 |    |
|                          | 6. 提高樓梯級高、級深之對比色或於梯鼻加設不同顏色之警示帶，方便弱視者使用。     | +1 |    |
|                          | 7. 樓梯牆面加設弱視警示帶。                             | +1 |    |
|                          | 8. 樓梯設置有三種不同高度扶手供不同年齡層使用。                   | +2 |    |
|                          | 9. 無障礙浴室設有紅外線感知器並與緊急求助鈴連動。                  | +1 |    |
|                          | 10. 無障礙停車位設有語音引導設施。                         | +1 |    |

表 4.4.2 受考核單位實地現場考核加分項目得分表

| 縣市別：台北市   |                                 | 建築物名稱：財政部台北國稅局松山分局   |                |
|---|---------------------------------|--|----------------|
| 項次  | 加分項目說明                          | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1   | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。 | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
| <br> |                                 |  |                |

| 縣市別：台北市 |  | 建築物名稱：時代國際飯店股份有限公司   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 室內出入口寬度全部大於90公分。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計十處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台北市 |  | 建築物名稱：興隆公營住宅   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 主要通路設置有緊急求助鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台北市 |  | 建築物名稱：興隆公營住宅   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 配合建物使用性質，相關設備如家具用品等設置均有考量身障者需求，廚櫃、掛衣架、桌子等設有自動升降功能。                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 每間浴室皆設有緊急求助鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台北市 |  | 建築物名稱：興隆公營住宅   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 5       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計四處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 4              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 6       | 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |


| 縣市別：新北市 |   | 建築物名稱：新北市立圖書館  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質規劃無障礙專區，相關設備如電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |     |  |                |

縣市別：新北市      建築物名稱：新北市立圖書館

| 項次 | 加分項目說明                          | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|----|---------------------------------|--|----------------|
|    | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。 | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |





2

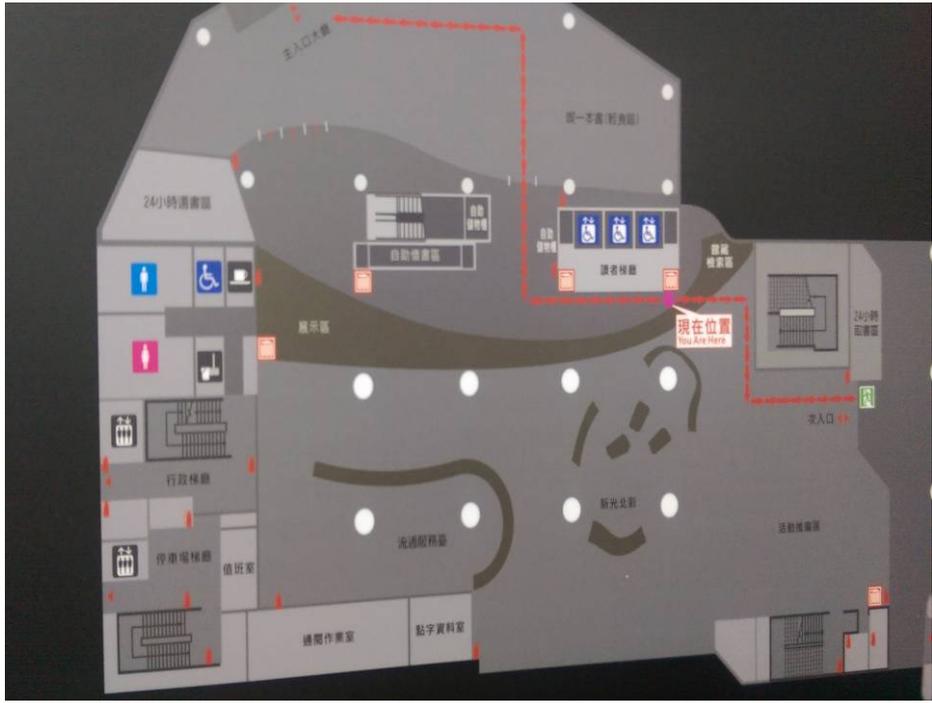

縣市別：新北市 建築物名稱：新北市立圖書館

| 項次 | 加分項目說明               | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
|----|----------------------|--|------------------|
| 3  | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計四處。 | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5                |
|    |                      |  |                  |


| 項次 | 加分項目說明              | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
|----|---------------------|--|------------------|
| 4  | 建築物增設符合規定之無障礙廁所計十處。 | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5                |
|    |                     |  |                  |
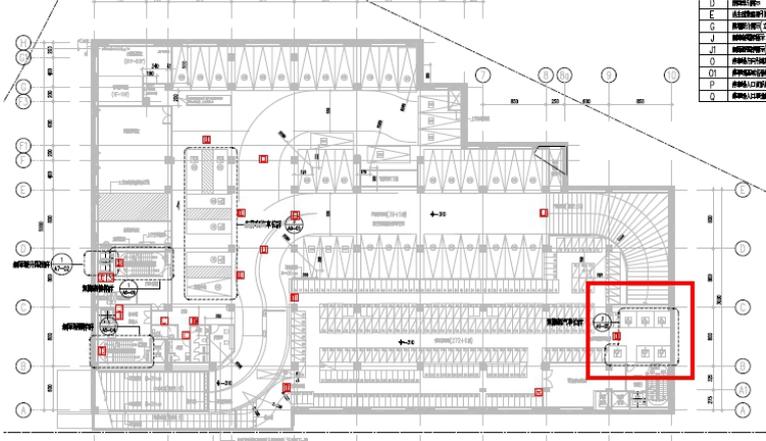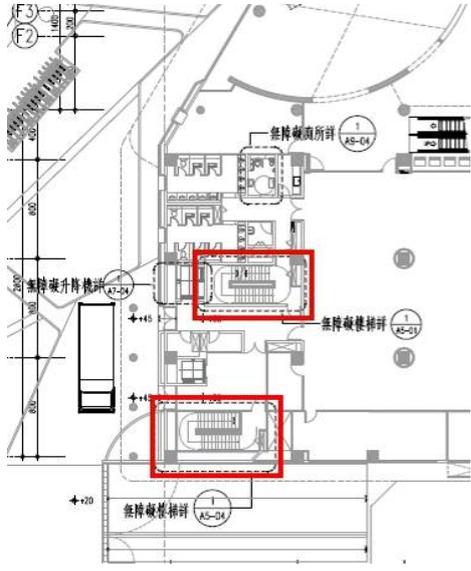
| 縣市別：新北市 |  | 建築物名稱：新北市立圖書館  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 5       | 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 6       | 建築物增設符合規定之無障礙樓梯計二處。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |   |  |                |

| 縣市別：新北市 |  | 建築物名稱：新北市立圖書館  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 7       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 8       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：新北市 |  | 建築物名稱：新北市立圖書館  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 9       | 演講廳講台設有無障礙升降平台可供身障人士上台。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 10      | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：新北市 |   | 建築物名稱：新北市立圖書館  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 11      | 配合建物使用性質，相關設備如 24 小時還書箱，高度低於 90 公分，設置均有考量身障者需求。                                     | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |
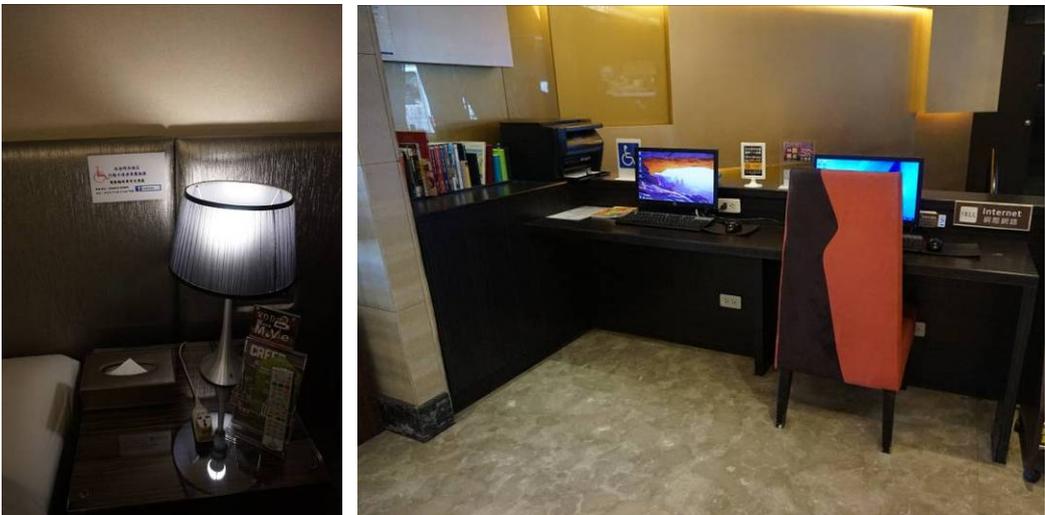
| 縣市別：新北市 |  | 建築物名稱：沐舍飯店(時尚酒店)   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。                                      | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 配合建物使用性質規劃無障礙專區，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求。                         | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：新北市 |   | 建築物名稱：沐舍飯店(時尚酒店)   |                  |
|---------|---|--|------------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 3       | 室內出入口寬度全部大於 90 公分。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2                |
|         |  |  |                  |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                  |


| 縣市別：新北市 |   | 建築物名稱：新北市議會議事廳大樓   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |


| 縣市別：新北市 |   | 建築物名稱：三芳護理之家（舊名祥寶尊榮護理之家）   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 室內出入口寬度全部大於90公分。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：桃園市 |  | 建築物名稱：雲朗觀光股份有限公司桃園分公司  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙廁所、浴室內之沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準                         | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：桃園市 |  | 建築物名稱：衛生福利部桃園醫院(A棟)  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質規劃無障礙專區，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度等設置均有考量身障者需求                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 無障礙停車位設有語音引導設施。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：桃園市 |  | 建築物名稱：衛生福利部桃園醫院(A棟)  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |     |  |                |
|         |   |  |                |
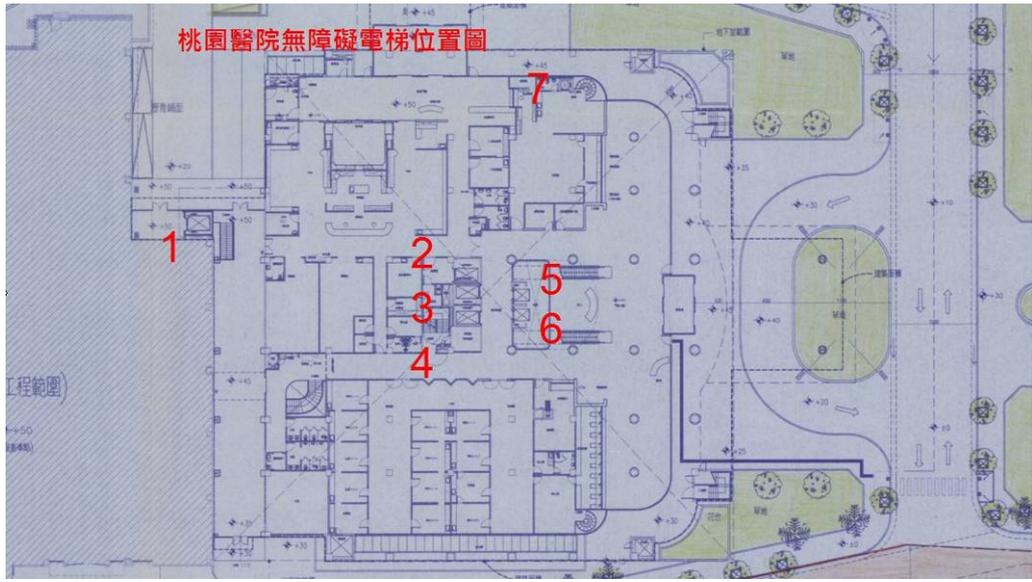
| 縣市別：桃園市 |   | 建築物名稱：衛生福利部桃園醫院(A棟)  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計七處。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

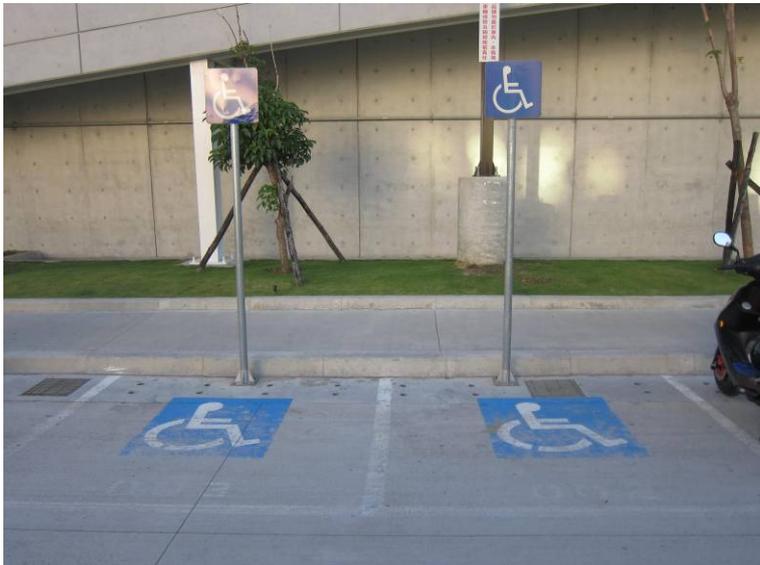
| 縣市別：桃園市 |  | 建築物名稱：好市多(中壢店)   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計五處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台中市 |  | 建築物名稱：長安醫院  |                  |
|---------|--|---|------------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型  | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 1       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            | 1                |
|         |   |   |                  |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型  | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 2       | 1. 無障礙廁所增設沖洗設備、淋浴設備或求助鈴。<br>2. 浴室天花板設有紅外線感知器。<br>3. 蓮蓬頭固定架等高度符合規範附錄之設置標準。<br>4. 求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 4<br>(1+1+1+1)   |
|         |   |   |                  |

| 縣市別：台中市 |  | 建築物名稱：長安醫院   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計四處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台中市 |  | 建築物名稱：台中二中體育館  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 樓梯設置有三種不同高度扶手供不同年齡層使用。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台中市 |   | 建築物名稱：台中二中體育館  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 無障礙廁所之門鎖採長桿撥扣式之門鎖。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |
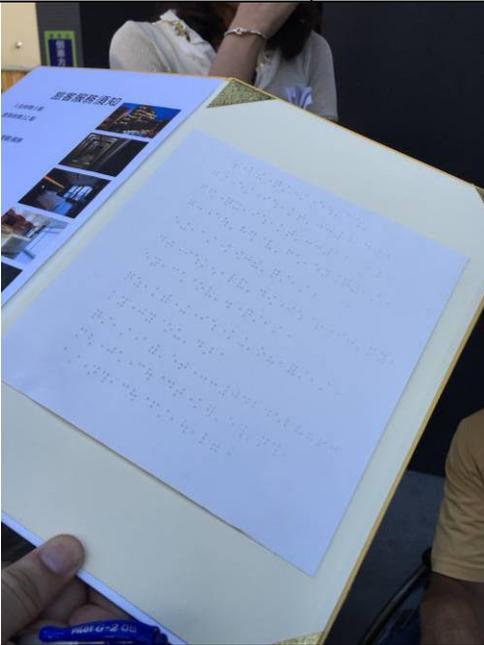
| 縣市別：台中市 |   | 建築物名稱：默契旅店   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

縣市別：台南市

建築物名稱：金城國中

項次

加分項目說明

加分類型


加分  
(每項最高5分)

1. 室內出入口寬度全部大於 90 公分
2. 建築物增設符合規定之無障礙廁所計四處。
3. 建築物增設符合規定之無障礙昇降機計四處。

- 整體規劃
- 設計創新
- 舒適貼心

12  
(2+5+5)

1

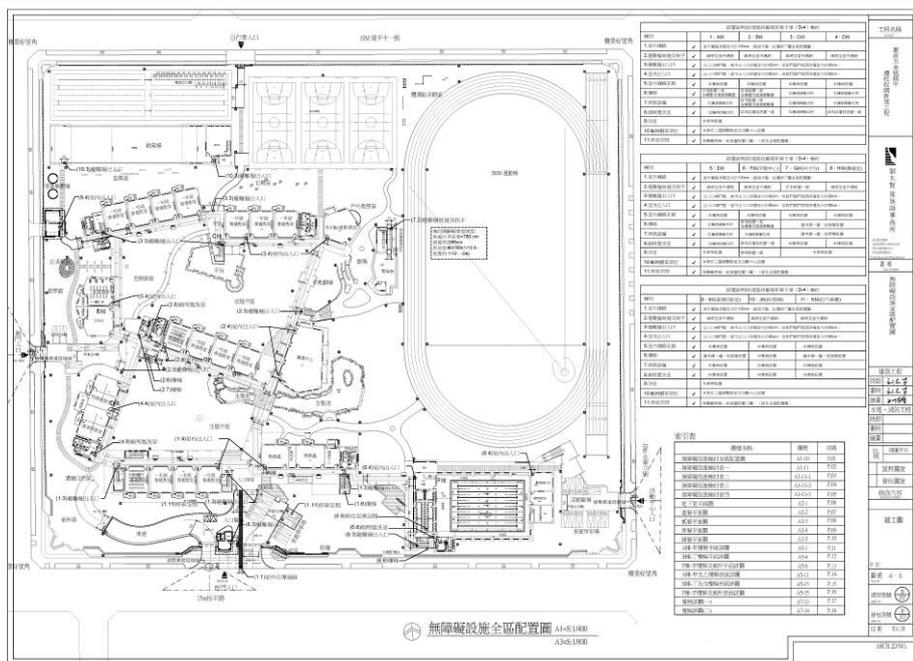

縣市別：台南市

建築物名稱：金城國中

項次

加分項目說明

加分類型

加分  
(每項最高 5 分)

全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有樓層無障礙設施配置圖。

- 整體規劃
- 設計創新
- 舒適貼心

2



2



| 縣市別：台南市 |  | 建築物名稱：金城國中   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 一般房間或廁所設有緊急求助鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 舞台、講台設有無障礙斜坡道或昇降機可供行動不便人士上台。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台南市 |  | 建築物名稱：金城國中   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 5       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 6       | 增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標誌。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台南市 |   | 建築物名稱：金城國中   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 7       | 無障礙廁所門鎖均使用長桿撥扣式之門鎖。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |


| 縣市別：台南市 |  | 建築物名稱：承億文旅台南海安旅店   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙廁所門鎖均使用長桿撥扣式之門鎖   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台南市 |  | 建築物名稱：國欣護理之家   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 4              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 室內出入口寬度全部大於 90 公分。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台南市 |  | 建築物名稱：國欣護理之家   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 無障礙廁所緊急求助鈴加練以擴大可求助範圍。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：台南市 |  | 建築物名稱：臨安養護中心   |                  |
|---------|--|--|------------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 1       | 無障礙廁所緊急求助鈴加練以擴大可求助範圍。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1                |
|         |   |  |                  |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 2       | 室內出入口寬度全部大於 90 公分。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2                |
|         |  |  |                  |

| 縣市別：台南市 |   | 建築物名稱：臨安養護中心   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |
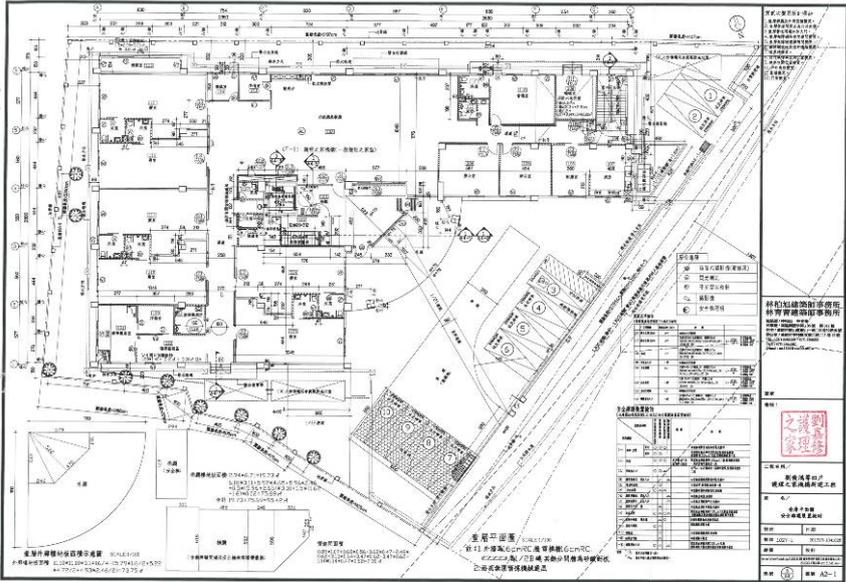
| 縣市別：高雄市 |  | 建築物名稱：劉嘉修護理之家  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物增設符合規定之無障礙廁所計五處。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 室內出入口寬度全部大於90公分。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：高雄市 |  | 建築物名稱：大都會飯店  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：高雄市 |   | 建築物名稱：大都會飯店  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 配合建物使用性質，相關設備如家具用品等設置均有考量身障者需求。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |    |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供輪椅或身障輔具出借等服務。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |    |  |                |

| 縣市別：高雄市 |  | 建築物名稱：大都會飯店  |                  |
|---------|--|--|------------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 5       | 室內出入口寬度全部大於 90 公分。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2                |
|         | <br><br>  |  |                  |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 6       | 無障礙廁所、浴室內之沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1                |
|         | <br><br><br> |  |                  |

| 縣市別：高雄市 |   | 建築物名稱：大都會飯店  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 7       | 建築物增設符合規定之無障礙廁所計一處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：高雄市 |   | 建築物名稱：愛買高雄店  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：新竹市 |   | 建築物名稱：新竹市轉運站/國道客運  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：新竹市 |   | 建築物名稱：西門國民小學   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物增設符合規定之無障礙廁所計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |


| 縣市別：宜蘭縣 |  | 建築物名稱：冬山鄉公所圖書館   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 無障礙廁所門鎖均使用長桿撥扣式之門鎖。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：宜蘭縣 |  | 建築物名稱：冬山鄉公所圖書館   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有無障礙設施配置圖。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |    |  |                |

| 縣市別：宜蘭縣 |   | 建築物名稱：第五季國際旅店  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：宜蘭縣 |                               | 建築物名稱：南館市場   |                |
|---------|-------------------------------|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明                        | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有無障礙設施配置圖。 | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |                               |  |                |
| 項次      | 加分項目說明                        | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |                               | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：新竹縣 |  | 建築物名稱：關西六福村生態度假旅館  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有無障礙設施配置圖。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
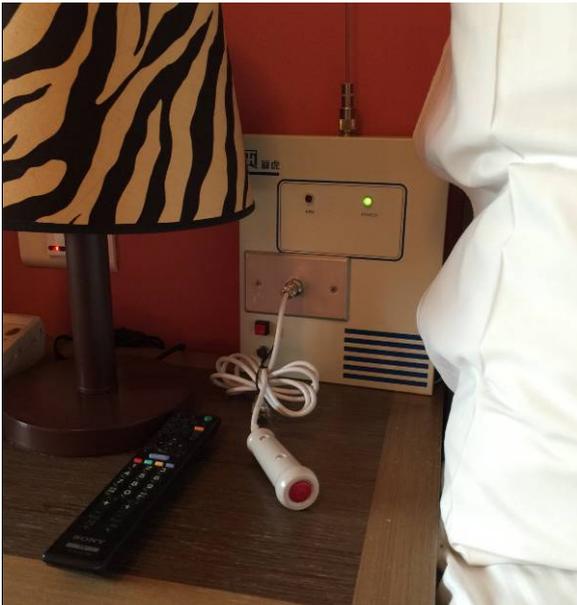
| 縣市別：新竹縣 |   | 建築物名稱：關西六福村生態度假旅館  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：苗栗縣 |                               | 建築物名稱：台鐵竹南站   |                |
|---------|-------------------------------|---|----------------|
| 項次      | 加分項目說明                        | 加分類型  | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有無障礙設施配置圖。 | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃  | 2              |
|         |                               | <input type="checkbox"/> 設計創新   |                |
|         |                               | <input type="checkbox"/> 舒適貼心   |                |
|         |                               |  |                |

縣市別：苗栗縣

建築物名稱：頭份圖書館

項次

加分項目說明

加分類型

加分  
(每項最高5分)

全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有無障礙設施配置圖。

- 整體規劃
- 設計創新
- 舒適貼心

2

1



| 縣市別：嘉義市 |  | 建築物名稱：兆品酒店   |                  |
|---------|--|--|------------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 1       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1                |
|         |   |  |                  |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 2       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供身障輔具出借服務。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2                |
|         |  |  |                  |

| 縣市別：南投縣 |  | 建築物名稱：集集晴海旅館   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙廁所、浴室內之衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準                   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 無障礙廁所增設沖洗設備、淋浴設備或求助鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：南投縣 |  | 建築物名稱：集集晴海旅館   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 配合建物使用性質，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求。                                | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：南投縣 |   | 建築物名稱：集集晴海旅館   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 5       | 主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：南投縣 |  | 建築物名稱：吉康護理之家   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機(無障礙樓梯)計二處。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 建築物增設符合規定之無障礙廁所計五處。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 5              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：南投縣 |   | 建築物名稱：吉康護理之家   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |


| 縣市別：南投縣 |   | 建築物名稱：鯉潭派出所  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：雲林縣 |  | 建築物名稱：中華郵政股份有限公司   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：雲林縣 |  | 建築物名稱：中華郵政股份有限公司   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 無障礙廁所、浴室內之衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面80至100公分，符合規範附錄之設置標準   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：雲林縣 |  | 建築物名稱：荊桐鄉大美國民小學  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙廁所增設沖洗設備、淋浴設備或求助鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 提高樓梯級高、級深之對比色或於梯鼻加設不同顏色之警示帶，方便弱視者使用。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |


| 縣市別：雲林縣 |  | 建築物名稱：荊桐鄉大美國民小學  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
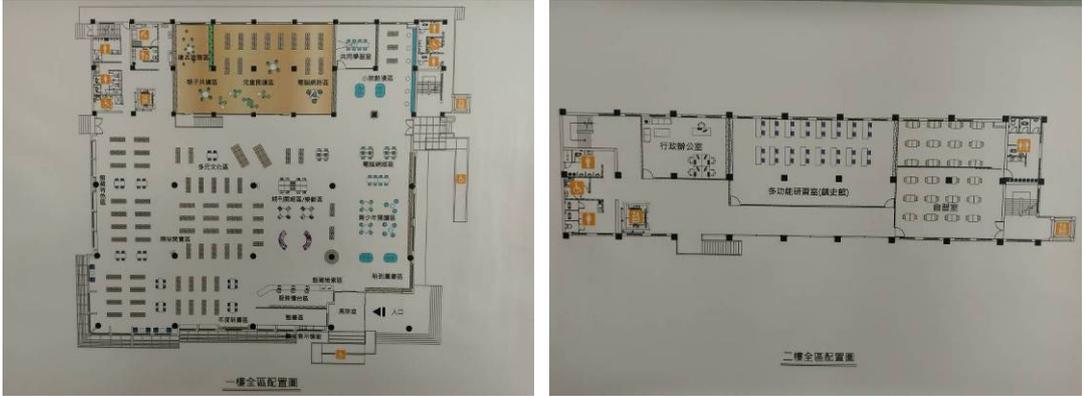
| 縣市別：雲林縣 |  | 建築物名稱：虎尾鎮立圖書館  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 提高樓梯級高、級深之對比色或於梯鼻加設不同顏色之警示帶，方便弱視者使用。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：雲林縣 |   | 建築物名稱：虎尾鎮立圖書館  |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：雲林縣 |  | 建築物名稱：育仁醫院   |                  |
|---------|--|--|------------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 1       | <p>結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務。</p>  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高 5 分) |
| 2       | <p>主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴。</p>   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1                |


| 縣市別：嘉義縣 |   | 建築物名稱：國立東石高級中學   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 樓梯牆面加設弱視警示帶。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |
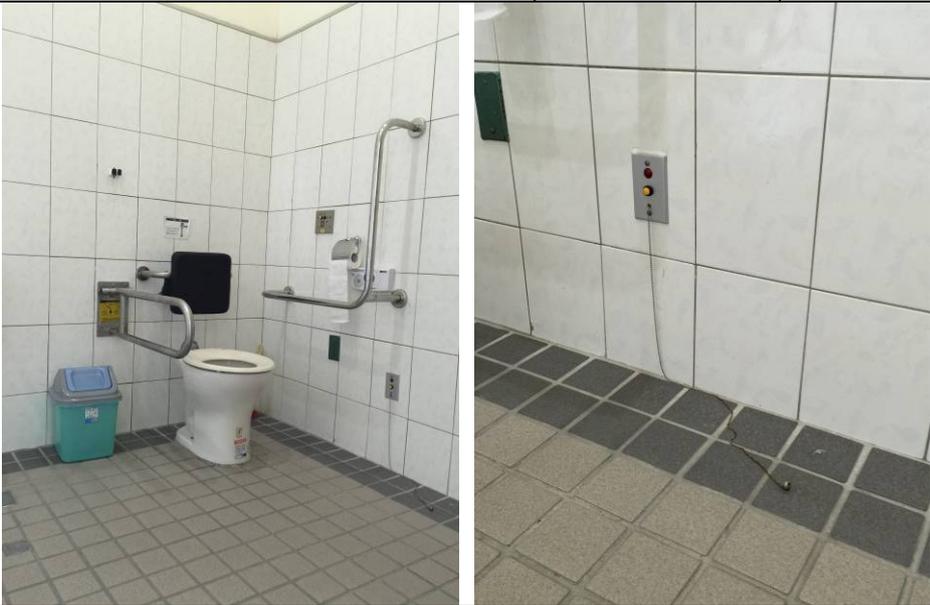
| 縣市別：屏東縣 |  | 建築物名稱：屏東市國民運動中心  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙廁所及浴室，求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 無障礙廁所增設沖洗設備、淋浴設備或求助鈴。  | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：屏東縣 |  | 建築物名稱：屏東市國民運動中心  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 建築物增設符合規定之無障礙升降機計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 3              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：屏東縣 |  | 建築物名稱：屏東市國民運動中心  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 5       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 6       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：澎湖縣 |  | 建築物名稱：雅霖大飯店  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 無障礙客房廁所盥洗室之蓮蓬頭固定架高度距地板面 80-100 公分，符合規範附錄之設置標準。                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input checked="" type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
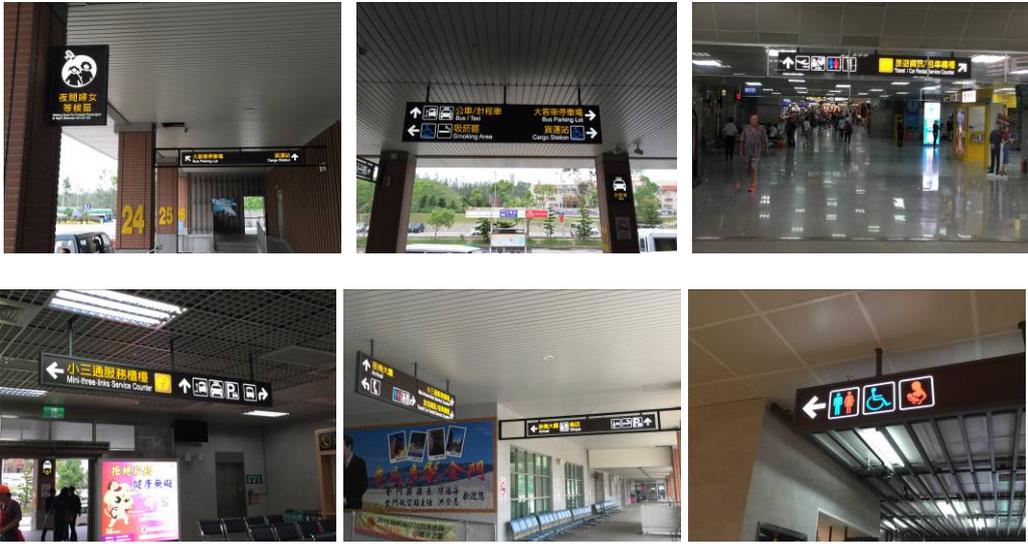
| 縣市別：金門縣 |  | 建築物名稱：尚義機場(西側擴建案)  |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位計二處。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。  | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

縣市別：金門縣

建築物名稱：衛福部金門醫院-衛生行政綜合醫療大樓

項次

加分項目說明

加分類型



加分  
(每項最高5分)

1. 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位計二處。
2. 建築物增設符合規定之無障礙升降機計七處。

- 整體規劃
- 設計創新
- 舒適貼心

7  
(2+5)

1

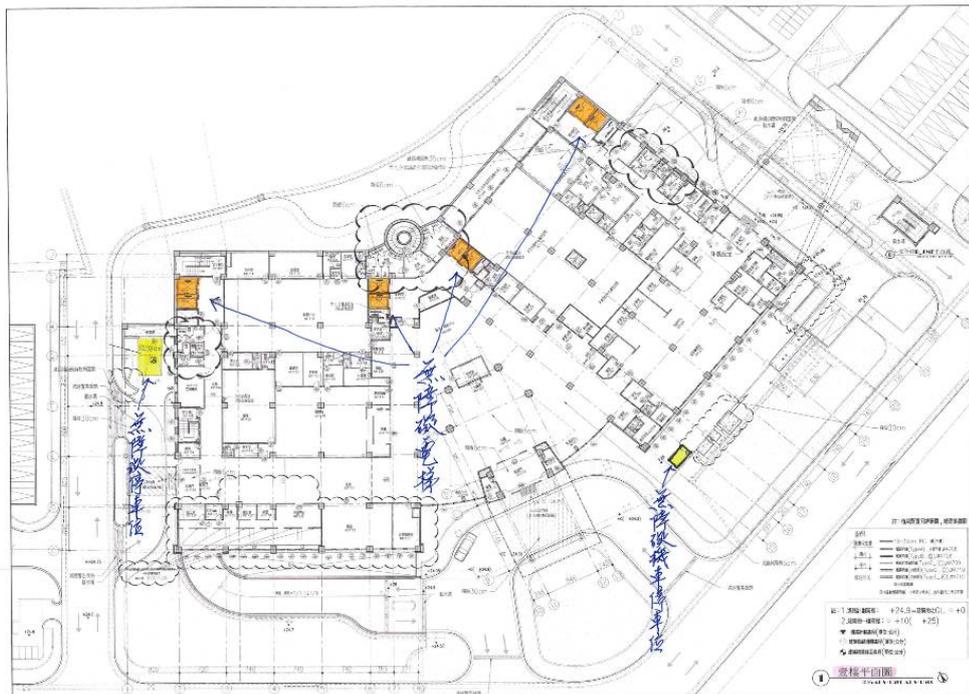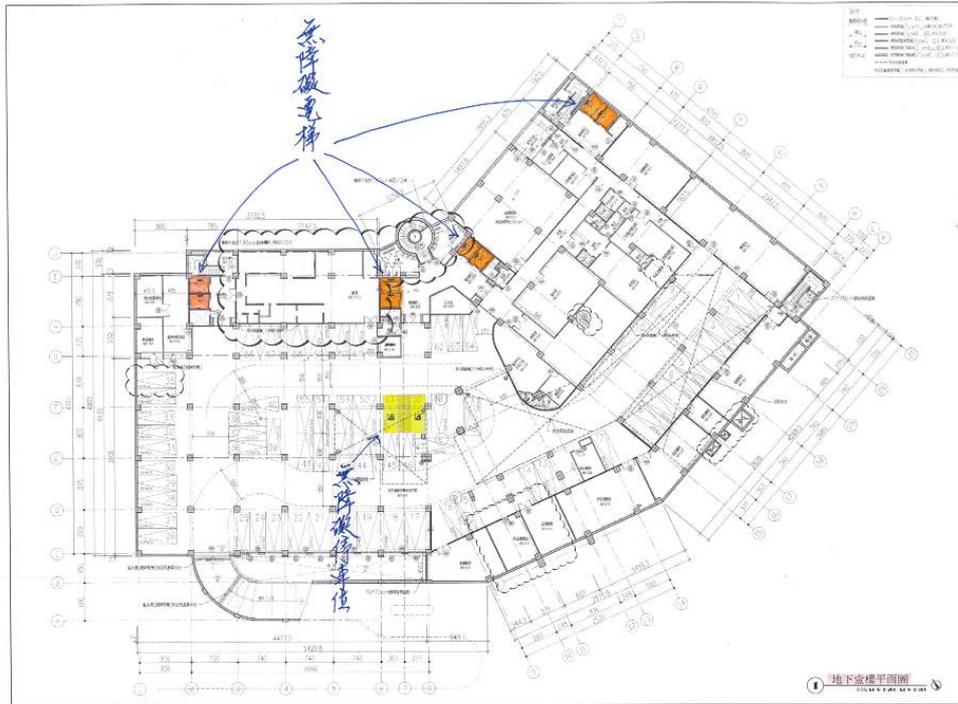

| 縣市別：金門縣 |  | 建築物名稱：衛福部金門醫院-衛生行政綜合醫療大樓   |                |
|---------|--|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 2       | 配合建物使用性質，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關等設置均有考量身障者需求。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |   |  |                |
| 項次      | 加分項目說明   | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 3       | 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示。   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input checked="" type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |

| 縣市別：金門縣 |   | 建築物名稱：衛福部金門醫院-衛生行政綜合醫療大樓   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 4       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：連江縣 |   | 建築物名稱：馬祖郵政大樓   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 1              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |

| 縣市別：連江縣 |   | 建築物名稱：塘岐國小   |                |
|---------|---|--|----------------|
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
| 1       | 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖。   | <input checked="" type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心 | 2              |
|         |  |  |                |
| 項次      | 加分項目說明  | 加分類型   | 加分<br>(每項最高5分) |
|         |   | <input type="checkbox"/> 整體規劃<br><input type="checkbox"/> 設計創新<br><input type="checkbox"/> 舒適貼心            |                |
|         |   |  |                |

## 五、督導考核總成績

### (一)督導考核總成績

表 4.5.1 105 年無障礙生活環境業務考核總成績表

| 項目<br>類組                      |                 | 都會型甲組           |       |       |       |       |       | 都會型乙組 |       |       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                               |                 | 1               | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 1     | 2     | 3     |
|                               |                 | 臺北市             | 新北市   | 桃園市   | 臺中市   | 臺南市   | 高雄市   | 基隆市   | 新竹市   | 嘉義市   |
| (業務考核項目佔30%)                  | 行政措施            | 25              | 26    | 26    | 26    | 26    | 25    | 24    | 24    | 26    |
|                               | 改善成果            | 40              | 40    | 40    | 40    | 35    | 40    | 16    | 12    | 18    |
|                               | 其他積極作為          | 34              | 34    | 27    | 33    | 26    | 32    | 10    | 22    | 26    |
| 得分合計                          |                 | 99              | 100   | 93    | 99    | 87    | 97    | 50    | 58    | 70    |
| 外扣分項目                         |                 | 0               | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 業務考核成績 A                      |                 | 99.0            | 100.0 | 93.0  | 99.0  | 87.0  | 97.0  | 50.0  | 58.0  | 70.0  |
| 實地現場考核(佔70%)                  | 建(新建)<br>圖說部份   | 5               | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 3     | 4     | 4     |
|                               |                 | 建(既有)<br>設施設備部份 | 15    | 15    | 13    | 15    | 15    | 15    | 14    | 13    |
|                               | 建(既有)<br>設施設備部份 |                 | 15    | 14    | 14    | 15    | 15    | 15    | 13    | 13    |
|                               |                 | 建(既有)<br>設施設備部份 | 15    | 15    | 15    | 15    | 15    | 14    | 15    | 7     |
|                               | 建(既有)<br>設施設備部份 |                 | 14    | 15    | 13    | 15    | 15    | 14    | 15    | 14    |
|                               |                 | 騎樓整平            |       | 15    | 15    | 15    | 15    | 9     | 15    | 13    |
| 實地現場考核小計                      |                 | 79              | 79    | 75    | 80    | 74    | 78    | 73    | 65    | 65    |
| 實地現場加分項目                      |                 | 19              | 20    | 18    | 18    | 20    | 20    | 0     | 5     | 3     |
| 實地現場考核成績 B                    |                 | 98              | 99    | 93    | 98    | 94    | 98    | 73    | 70    | 68    |
| 105年無障礙督導總成績<br>(A*30%+B*70%) |                 | 98.30           | 99.30 | 93.00 | 98.30 | 91.90 | 97.70 | 66.10 | 66.40 | 68.60 |

| 項目<br>類組                   |        | 城鎮型    |       |       |       |       |       |       |       |    |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|                            |        | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |    |
|                            |        | 宜蘭縣    | 新竹縣   | 苗栗縣   | 彰化縣   | 南投縣   | 雲林縣   | 嘉義縣   | 屏東縣   |    |
| (業務考核項目佔30%)               | 行政措施   | 18     | 24    | 21    | 24    | 26    | 25    | 22    | 25    |    |
|                            | 改善成果   | 8      | 36    | 10    | 11    | 40    | 40    | 22    | 25    |    |
|                            | 其他積極作為 | 5      | 29.6  | 7     | 9     | 31    | 27.3  | 10    | 25    |    |
| 得分合計                       |        | 31     | 89.6  | 38    | 44    | 97    | 92.3  | 54    | 75    |    |
| 外扣分項目                      |        | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |    |
| 業務考核成績 A                   |        | 31.0   | 89.6  | 38.0  | 44.0  | 97.0  | 92.3  | 54.0  | 75.0  |    |
| 實地現場考核 (佔70%)              | 建(新建一) | 圖說部份   | 5     | 5     | 4     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5  |
|                            |        | 設施設備部份 | 13    | 7     | 8     | 13    | 15    | 15    | 15    | 15 |
|                            | 建(既有二) | 設施設備部份 | 14    | 9     | 13    | 14    | 15    | 15    | 14    | 14 |
|                            | 建(既有三) | 設施設備部份 | 15    | 15    | 14    | 15    | 15    | 14    | 13    | 15 |
|                            | 建(既有四) | 設施設備部份 | 0     | 15    | 11    | 15    | 15    | 14    | 13    | 15 |
|                            | 騎樓整平   |        | 13    | 0     | 0     | 9     | 10    | 0     | 0     | 10 |
| 實地現場考核小計                   |        | 60     | 51    | 50    | 71    | 75    | 63    | 60    | 74    |    |
| 實地現場加分項目                   |        | 8      | 4     | 4     | 0     | 18    | 13    | 1     | 11    |    |
| 實地現場考核成績 B                 |        | 68     | 55    | 54    | 71    | 93    | 76    | 61    | 85    |    |
| 105年無障礙督導總成績 (A*30%+B*70%) |        | 56.90  | 65.38 | 49.20 | 62.90 | 94.20 | 80.89 | 58.90 | 82.00 |    |

| 項目                        |         | 類組     |       | 偏遠及離島型 |       |       |       |     |
|---------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|
|                           |         |        |       | 1      | 2     | 3     | 4     | 5   |
|                           |         |        |       | 花蓮縣    | 臺東縣   | 澎湖縣   | 金門縣   | 連江縣 |
| (業務考核項目佔30%)              | 行政措施    |        | 18    | 24     | 21    | 24    | 9     |     |
|                           | 改善成果    |        | 8     | 16     | 40    | 40    | 0     |     |
|                           | 其他積極作為  |        | 4     | 22     | 20    | 32    | 5     |     |
| 得分合計                      |         |        | 30    | 62     | 81    | 96    | 14    |     |
| 外扣分項目                     |         |        | 0     | 0      | 0     | 0     | -5    |     |
| 業務考核成績 A                  |         |        | 30.0  | 62.0   | 81.0  | 96.0  | 9.0   |     |
| 實地現場考核(佔70%)              | 建(新建物一) | 圖說部份   | 5     | 5      | 5     | 5     | 5     |     |
|                           |         | 設施設備部份 | 15    | 15     | 15    | 15    | 11    |     |
|                           | 建(既有物二) | 設施設備部份 | 10    | 13     | 14    | 15    | 15    |     |
|                           | 建(既有物三) | 設施設備部份 | 15    | 15     | 13    | 15    | 14    |     |
|                           | 建(既有物四) | 設施設備部份 | 0     | 15     | 14    | 15    | 9     |     |
|                           | 騎樓整平    |        | 15    | 0      | 0     | 15    | ※     |     |
| 實地現場考核小計                  |         |        | 60    | 63     | 61    | 80    | 66.46 |     |
| 實地現場加分項目                  |         |        | 0     | 0      | 2     | 15    | 3     |     |
| 實地現場考核成績 B                |         |        | 60    | 63     | 63    | 95    | 69.46 |     |
| 105年無障礙督導總成績(A*30%+B*70%) |         |        | 51.00 | 62.70  | 68.40 | 95.30 | 51.32 |     |

(二)受考核單位成績等級

表 4.5.2 105 年公共建築物無障礙生活環境業務考核成績等級表

| 類型分組   | 縣市  | 業務評分<br>(30%) | 現勘評分<br>(70%) | 總分    | 等級 |
|--------|-----|---------------|---------------|-------|----|
| 都會型    | 臺北市 | 99.00         | 98.00         | 98.30 | 特優 |
|        | 新北市 | 100.00        | 99.00         | 99.30 | 特優 |
|        | 桃園市 | 93.00         | 93.00         | 93.00 | 優等 |
|        | 臺中市 | 99.00         | 98.00         | 98.30 | 特優 |
|        | 臺南市 | 87.00         | 94.00         | 91.90 | 優等 |
|        | 高雄市 | 97.00         | 98.00         | 97.70 | 特優 |
|        | 基隆市 | 50.00         | 73.00         | 66.10 | 丙等 |
|        | 新竹市 | 58.00         | 70.00         | 66.40 | 丙等 |
|        | 嘉義市 | 70.00         | 68.00         | 68.60 | 丙等 |
| 城鎮型    | 宜蘭縣 | 31.00         | 68.00         | 56.90 | 丁等 |
|        | 新竹縣 | 89.60         | 55.00         | 65.38 | 丙等 |
|        | 苗栗縣 | 38.00         | 54.00         | 49.20 | 戊等 |
|        | 彰化縣 | 44.00         | 71.00         | 62.90 | 丙等 |
|        | 南投縣 | 97.00         | 93.00         | 94.20 | 優等 |
|        | 雲林縣 | 92.30         | 76.00         | 80.89 | 甲等 |
|        | 嘉義縣 | 54.00         | 61.00         | 58.90 | 丁等 |
|        | 屏東縣 | 75.00         | 85.00         | 82.00 | 甲等 |
| 偏遠及離島型 | 花蓮縣 | 30.00         | 60.00         | 51.00 | 丁等 |
|        | 臺東縣 | 62.00         | 63.00         | 62.70 | 丙等 |
|        | 澎湖縣 | 81.00         | 63.00         | 68.40 | 丙等 |
|        | 金門縣 | 96.00         | 95.00         | 95.30 | 特優 |
|        | 連江縣 | 9.00          | 69.46         | 51.32 | 丁等 |



## 伍、結論與建議

一、考核成果結論

二、業務推動相關作業建議



## 伍、結論與建議

### 一、考核成果結論

(一) 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導成績總結，特優等縣市共計有臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、高雄市政府及金門縣政府等 5 個單位；優等縣市共計有桃園市政府、台南市政府及南投縣政府等 4 個單位。

(二) 業務考核項目部份：

1. 行政措施：「公共建築物無障礙設施勘檢作業原則」第六條規定對聘任之勘檢人員辦理至少三個小時之勘檢實務講習部分，缺失為 7 個單位的勘檢小組委員未能全員到課；「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」第十條規定每三個月實際開會一次，尚有 9 個單位開會次數不足。
2. 改善成果：既有建築物改善為本督導核心工作之一。104 年既有建築物改善完成總件數為 2537 件。目前尚有 10 個單位改善完成件數得分率尚未達 60%以上；替代改善計畫結案率則有 4 個單位得分率尚未達 60%以上。
3. 其他積極作為：案例彙編及通則之整理有助於提高既有建築物改善之完成率且可降低建管人員之工作量，在執行落實無障礙生活環境業務推動中為一項重要之輔助工具。目前尚有 5 個單位尚未有研定案例彙編及通則之作為。

### (三) 實地現場考核部份：

1. 建築圖說部份：各受考核單位提供之建築圖說已大幅改善去年構造詳圖尺寸標示及比例不符之問題。
2. 無障礙設施、設備部份：實地現場抽查以廁所盥洗室缺失最多，樓梯、停車空間、無障礙通路缺失其次。加分項目為本次督導新增計分方式，依督導結果得分分析，仍以都會型縣市較有作為，城鎮型及偏遠離島型縣市則以南投縣、屏東縣及金門縣表現優異。
3. 騎樓整平：本次督導共計有 6 個單位未能得分，主要原因為 103、104 年未執行騎樓整平業務，故本次督導共計符合規定之騎樓路有 16 個單位（其中連江縣因無法定騎樓採加權計算），其中騎樓整平路段有 13 個單位，騎樓順平有 3 個單位。

## 二、業務推動相關作業建議

### (一) 105 年業務督導計畫：

1. 業務考核項目部分，各項業務督導工作項目受督導單位大致均能達到得分標準，惟考核事項之其他積極作為部分較引起爭議，故建議考核事項之其他積極作為能增訂評分原則說明，如積極作為以 105 年度內完成為限、以建築基地內及騎樓範圍內為限、以建管單位主辦之活動或計畫為限等，俾利受考核單位配合營建署政策目標規劃明年度無障礙相關積極作為。
2. 現場考核項目部分，建議可參考本成果報告彙整之實地現場考核加分項目相關案例及結果，於實地現場考核評分規則中增加「加分項目評分參考表」。

### (二) 業務考核項目部份：

1. 偏遠離島地區有關聽覺障礙之社福團體較少，甚至沒有該類團體，如由台灣本島聘往該地擔任委員除經費部份是一大負擔

外，委員亦不諳當地風俗民情，對於當地之無障礙設施改善建議時有爭議，因此建議離島三縣市有關諮詢小組遴聘（派）肢體、視覺、聽覺障礙等身心障礙者團體代表，應可不受限制。

2. 勘檢人員的專業知識及經驗直接影響建築物無障礙設施的品質，因此有關無障礙設施勘檢作業部份，依勘檢原則第六條規定「當地主管建築機關應對聘任之勘檢人員，辦理至少三個小時之勘檢實務講習。其講習內容如下：（一）勘檢注意事項（含勘檢實例錯誤樣態說明）。（二）勘檢程序。（三）勘檢任務。（四）其他相關事項。」，考量各受考核單位財務人力及聘任勘檢人員狀況，建議「勘檢實務講習辦理頻率可配合該單位勘檢人員任期調整，或縣市聯合辦理」亦可採認得分。
3. 部份縣市政府之基金帳戶因收支次數過少，屢遭府內主計單位要求合併於其他基金帳戶或轉為公務預算，是否符合建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法第2條：「建築物無障礙設備與設施改善基金（以下簡稱本基金）之管理及運用，除法令另有規定外，依本辦法之規定。」及第3條：「本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，並以直轄市、縣（市）政府為主管機關。」之規定，建議營建署建立統一之對應策略。
4. 有關改善完成案件認定，建議依該建築物使用執照範圍內之整幢（棟）為單位，該整幢（棟）內之應設置無障礙設備設施皆改善完成（或替代改善計畫決議免改善）者，方可列入結案清冊；學校類建築物倘無法依其使用執照界定範圍者，則認定該校園全區為改善範圍。

### （三）實地現場考核部份：

1. 為求現場考核加分項目公平，請各受考核單位於「考核當日」依據「加分項目評分參考表」提報實地現場考核加分項目；非為評分標準內之項目亦可提報，惟加分與否由營建署開會決定。

2. 有關既有建築物考核標的通知受考核單位時程，建議本年度之「考核日期 14 日前」可酌予調整，並請各受考核單位收到通知後確認考核標的之建、使照日期、適用法規要求、建築物目前使用狀況及騎樓整平相關完工資料證明等回復營建署(加分項目資料應一併進行整理)，俾利署內辦理實地現場考核相關事宜，並於考核日期 7 日前將不再接受考核標的變更之申請。

## 陸、附件

- 一、105 年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表
- 二、105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考核評分表
- 三、無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 102 年版)
- 四、無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 97 年版)
- 五、105-106 年內政部營建署建築物無障礙生活環境業務督導小組名單
- 六、實地現場考核行程表
- 七、無障礙生活環境業務考核會議議程
- 八、改善諮詢及審查小組名冊範例
- 九、建築物勘檢案件總清冊範例
- 十、公共建築無障礙設備設施勘檢小組名冊範例
- 十一、分期分區改善計畫表範例
- 十二、無障礙設備與設施改善基金管理委員會名冊範例
- 十三、推動公共建築物無障礙生活環境相關法規
- 十四、實地現場抽查日期變更相關公文
- 十五、研商 105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查行前說明會議會議紀錄
- 十六、研商 105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查評分事宜會議紀錄
- 十七、105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導檢討會會議紀錄



# 陸、附件

## 一、105年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表

表 6.1 105年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表

### 105年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表

聯絡人：  
聯絡電話：

受督導單位：

| 項次          | 考核項目        | 各項配分 | 自評分數 | 考核分數 | 辦理成果  | 評分標準  |
|-------------|-------------|------|------|------|---|---|
| 壹、行政措施(26分) | 一、改善諮詢及審查小組 | 9    |      |      | <p><input type="checkbox"/> 1. 改善諮詢及審查小組名單及資格(3分)</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 諮詢小組選聘身心障礙者團體<br/>比例：審查諮詢小組委員：全部共_____位<br/>(A)。</p> <p>肢體、視覺、聽覺障礙者團體代表：_____位(B)。</p> <p>比例：<math>(B)/(A) \times 100\% = \frac{\quad}{\quad} \%</math><br/>(不得小於40%)。(3分)</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 諮詢小組會議紀錄(3分)</p> | <p>說明：</p> <p>1. 依既有公共建築物無障礙設施改善計畫作業程序及認定原則(以下簡稱改善作業原則)第七條規定：七、公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組應具備下列資格之一：<br/>(一) 取得內政部營建署於中華民國九十七年七月一日以後委託辦理之公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓講習結業證書。(二) 曾擔任內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務督導小組委員連續三年以上。(三) 曾擔任各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關勘檢小組委員連續三年以上。(四) 相關專業領域之專家學者。</p> <p>2. 比照「身心障礙者權益保障法」第十條規定，審查諮詢小組委員應選聘(派)肢體、視覺、聽覺障礙等身心障礙者團體代表，其比例不得小於40%。故請提供改善諮詢及審查小組名單及符合資格相關證明文件(如範例一)。(如該受督導單位應改善建築物全部改善完成者，仍應組成改善諮詢及審查小組)</p> <p>3. 提供諮詢小組會議紀錄：<br/>※都督型甲組：6次以上(含)者得3分，5次得2分，4次得1分，3次(含)以下不給分。<br/>※都會型乙組、城鎮型：4次以上(含)4次者得3分，3次得2分，2次得1分，1次(含)以下不給分。</p> |

| 項次          | 考核項目            | 各項配分 | 自評分數 | 考核分數 | 辦理成果   | 評分標準  |
|-------------|-----------------|------|------|------|--|---|
|             |                 |      |      |      |  | ※偏遠及離島型及特設主管建築機關：2次以上(含)者得3分，1次(含)得2分。<br>※如受督導單位應改善案件已全數改善完成者，故未召開會議或召開次數不足，本項分數仍可加權至總分計算)   |
| 壹、行政措施(26分) | 二、無障礙設施<br>勘檢作業 | 8    |      |      | <input type="checkbox"/> 1. 104年公共建築物勘檢案件總清冊(2分)<br><input type="checkbox"/> 2. 勘檢小組名單及資格(2分)<br><input type="checkbox"/> 3. 勘檢實務講習簽到紀錄(2分)<br><input type="checkbox"/> 4. 勘檢實務講習課程表(2分) | 說明：<br>1. 依公共建築物無障礙勘檢作業原則(以下簡稱勘檢原則)第二條規定：適用範圍如下：(一)申請新建及增建使用執照之公共建築物。(二)申請變更使用執照提具替代改善計畫之公共建築物。(三)依身心障礙者權益保障法第五十七條第三項規定辦理無障礙設施替代改善計畫之公共建築物。故請提供104年建築物勘檢案件總清冊(如範例二)。<br>2. 依勘檢原則第五條規定：勘檢人員應具備下列資格之一：<br>(一)取得內政部營建署於中華民國九十七年七月一日以後委託辦理之公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓講習結業證書。(二)曾擔任內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務督導小組委員連續三年以上。<br>(三)曾擔任各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關勘檢小組委員連續三年以上。故請提供勘檢小組人員名單及符合資格相關證明文件(如範例三)。<br>3. 依勘檢原則第六條規定：當地主管建築機關應對聘任之勘檢人員，辦理至少三個小時之勘檢實務講習，其講習內容如下：<br>(一)勘檢注意事項(含勘檢實例錯誤樣態說明)。(二)勘檢程序。(三)勘檢任務。(四)其他相關事項。故請提供實務講習簽到表、相關資料及課程表。 |

| 項次 | 考核項目            | 各項配分     | 自評分數 | 考核分數 | 辦理成果  | 評分標準  |
|----|-----------------|----------|------|------|---|---|
|    | 三、分期改善計畫        | <u>6</u> |      |      | <input type="checkbox"/> 1. <u>最新之分期分期改善計畫(3分)</u><br><input type="checkbox"/> 2. <u>最新分期分期改善計畫同意案之會議紀錄(3分)</u>   | <p>說明：</p> <p>1. 提供最新之分期分期改善計畫，如逾四年以上未修正計畫者，酌予扣分。(如範例四)</p> <p>2. 提供經諮詢審查小組會議通過最新之分期分期改善計畫會議紀錄。</p> <p>3. 法令依據：既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則。</p>   |
|    | 四、無障礙設施改善基金運用情形 | <u>3</u> |      |      | <input type="checkbox"/> 1. <u>基金帳戶收支帳目資料(1分)</u><br><input type="checkbox"/> 2. <u>基金委員會小組名單(1分)</u><br><input type="checkbox"/> 3. <u>基金委員會會議紀錄(1分)</u> | <p>說明：</p> <p>1. 依建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法(以下簡稱基金管理法)第七條規定：基金管理委員會，置主任委員一人，委員十二人至十四人，由主管機關就機關內及其他有關機關、身心障礙團體代表、專家學者聘任之。故請提供基金管理委員會名單(如範例五)。</p> <p>2. 依基金管理法第十條規定：每三個月開會一次，故應檢附4次以上會議紀錄。請提供基金委員會會議紀錄。(未達4次者不給分)</p> <p>3. 特設主管建築機關本項目採加權計分。</p> |



| 項次 | 考核項目        | 各項配分      | 自評分數   | 考核分數 | 辦理成果   | 評分標準  |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |
|----|-------------|-----------|--------|------|--|---|----|-------|-----------|--------|----|-------|-------|-------|---|-------|-------|-----|--|-------|-------|-----|--|-------|-------|-----|--|-------|-------|------|
|    | 二、替代改善計畫結案率 | 10        |        |      | <p>1. 103-104 年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數：_____件</p> <p>2. 結案數：_____件(B)。</p> <p>結案率：<math>(B)/(A) \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}}\%</math>。(5分)</p> | <p>說明：</p> <p>1. 103-104 年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過總件數：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>組別</th> <th>都會型甲組</th> <th>都會型乙組及城鎮型</th> <th>偏遠及離島型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件數</td> <td>50 以上</td> <td>25 以上</td> <td>10 以上</td> </tr> <tr> <td>分</td> <td>41-49</td> <td>21-24</td> <td>8-9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>31-40</td> <td>16-20</td> <td>6-7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21-30</td> <td>11-15</td> <td>3-5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 以下</td> <td>10 以下</td> <td>2 以下</td> </tr> </tbody> </table> <p>審核通過總件數為 0 件者不給分</p> <p>2. 結案率：<br/> 85% 以上給 5 分， 84-80% 給 4 分，<br/> 79-75% 給 3 分， 74-60% 給 2 分，<br/> 59-50% 給 1 分， 49% 以下 0 分。<br/> A: 103 年提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核通過而改善期限於 104 年 12 月 31 日以前完成結案之案件總數。<br/> B: 104 年 12 月 31 日以前完成結案之案件數。<br/> ※ 應結案之案件數低於評分標準，但案件全部改善完成者給 30 分。<br/> ※ 列管應改善案件使用類組僅餘 B-3、B-4 者，可正式行文說明，此項目另於其他積極作為計分。<br/> ※ 請提供改善計畫審核通過清冊，清冊需載明改善完成核備公文號；改善完成案件數以建築物為計算單位。(如範例二)</p> | 組別 | 都會型甲組 | 都會型乙組及城鎮型 | 偏遠及離島型 | 件數 | 50 以上 | 25 以上 | 10 以上 | 分 | 41-49 | 21-24 | 8-9 |  | 31-40 | 16-20 | 6-7 |  | 21-30 | 11-15 | 3-5 |  | 20 以下 | 10 以下 | 2 以下 |
| 組別 | 都會型甲組       | 都會型乙組及城鎮型 | 偏遠及離島型 |      |  |   |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |
| 件數 | 50 以上       | 25 以上     | 10 以上  |      |  |   |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |
| 分  | 41-49       | 21-24     | 8-9    |      |  |   |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |
|    | 31-40       | 16-20     | 6-7    |      |  |   |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |
|    | 21-30       | 11-15     | 3-5    |      |  |   |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |
|    | 20 以下       | 10 以下     | 2 以下   |      |  |   |    |       |           |        |    |       |       |       |   |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |     |  |       |       |      |

| 項次            | 考核項目                   | 各項配分      | 自評分數 | 考核分數 | 辦理成果   | 評分標準  |
|---------------|------------------------|-----------|------|------|--|---|
|               | 一、 <u>案例彙編及通則</u>      | <u>12</u> |      |      | <input type="checkbox"/> 1. 優良既有建築物改善案例彙編(8分)<br><input type="checkbox"/> 2. 無障礙設施設備改善通則(4分) | 說明：<br>1. 彙整當年度既有建築物優良改善案例於無障礙專區網頁刊登者，每案1分。<br>2. 擬訂無障礙設施設備改善通則，該通則經由改善諮詢及審查小組會議通過，並於無障礙專區網頁刊登者（採用此通則改善項目可免提送改善諮詢及審查小組會議），每項通則1分。 |
|               | 二、 <u>無障礙生活環境法令說明會</u> | <u>4</u>  |      |      | 列舉：  | 說明：<br>1. 辦理法令說明會，並於無障礙專區網頁公開課程資料。每完成一場得1分<br>2. 如法令說明會場次人數超過100人者，檢附簽到相關資料，每場得2分   |
|               | 三、 <u>建管人員培訓率</u>      | <u>2</u>  |      |      | 建管人員培訓率：<br>核定人數：_____人(A)。<br>培訓人數：_____人(B)。<br>培訓率： $(B)/(A) \times 100\% = \text{—}\%$   | 說明：<br>1. 建管人員培訓率100-80%給2分，79-60%給1分，59%以下0分<br>2. 請提供建管人員編制名冊及培訓證號。   |
|               | 四、 <u>無障礙生活環境缺失通報</u>  | <u>2</u>  |      |      | 公共建築物無障礙生活環境缺失通報方式   | 說明：<br>1. 供可隨時通報公共建築物無障礙生活環境缺失情形方式，依實際辦理情形給分。<br>2. 各項通報方式請檢附相關資料證明。  |
| 參、其他積極作為(34分) |                        |           |      |      |  |   |

| 項次 | 考核項目   | 各項配分 | 自評分數 | 考核分數 | 辦理成果 | 評分標準   |
|----|--------|------|------|------|------|--|
|    | 五、積極作為 | 14   |      |      | 列舉：  | <p>說明：</p> <p>1. 如辦理優良無障礙建築物評選(3分)、訂有無障礙設施巡查機制及巡查頻率(2分)、提供300平方公尺以上餐廳清冊(2分)、其他積極作為，請檢附相關資料證明，依實際辦理成果給分。</p> <p>2. 104年改善完成案件數改善案件下列規定者得給分</p> <p>* 都會型甲組：改善案件達200件以上者，每增加20件得1分。</p> <p>* 都會型乙組、城鎮型：改善案件達120件以上者，每增加16件得1分。</p> <p>* 偏遠及離島型及特設主管建築機關：改善案件達60件以上者，每增加8件得1分。</p> <p>3. 如貳、改善成果項目，經正式行文說明獲同意者，以該項目實際得分與該項目配分之差額視事實情況給予加權，做為積極作為之加分，其加分之結果可不受配分14分之限制。(案例說明：某偏遠及離島型縣市，其考核年度內之改善結案數為12件，表定配分為30分，實際得分為6分，經正式行文說明獲同意該項目得以實際得分與該項目配分之差額百分之八十計算，其積極作為可得分數計算為<math>(30-6)*0.8=11.2</math>分)</p> |
| 合計 |        | 100  |      |      |      |  |

## 二、105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考核評分表

表 6.2 105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考核評分表

### 實地現場考核評分紀錄（新建或增建建築物）

| 單位：○○○政府 |                             | 105 年 00 月 00 日                 |                               |                                |                                |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 項次       |                             | 建築物一                            |                               |                                | 分數                             |
| 現場名稱     |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 新建或增建建築物 |                             | 配分 20 分                         |                               |                                |                                |
| 項目       | 建築書圖 5 分                    | <input type="checkbox"/> 無障礙通路  | <input type="checkbox"/> 樓梯   | <input type="checkbox"/> 昇降設備  | <input type="checkbox"/> 廁所盥洗室 |
| 缺失<br>編號 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 項目       | <input type="checkbox"/> 浴室 | <input type="checkbox"/> 輪椅觀眾席位 | <input type="checkbox"/> 停車空間 | <input type="checkbox"/> 無障礙標誌 | <input type="checkbox"/> 無障礙客房 |
| 缺失<br>編號 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分<br>項目 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分       |                             |                                 |                               |                                |                                |

其他建議事項紀錄

### 實地現場考核評分紀錄（既有公共建築物）

| 單位：○○○政府 |                             | 105 年 00 月 00 日                 |                               |                                |                                |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 項次       | 建築物二                        |                                 |                               |                                | 分數                             |
| 現場名稱     |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 既有公共建築物  |                             | 配分 15 分                         |                               |                                |                                |
| 項目       |                             | <input type="checkbox"/> 無障礙通路  | <input type="checkbox"/> 樓梯   | <input type="checkbox"/> 昇降設備  | <input type="checkbox"/> 廁所盥洗室 |
| 缺失<br>編號 | /                           |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 項目       | <input type="checkbox"/> 浴室 | <input type="checkbox"/> 輪椅觀眾席位 | <input type="checkbox"/> 停車空間 | <input type="checkbox"/> 無障礙標誌 | <input type="checkbox"/> 無障礙客房 |
| 缺失<br>編號 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分<br>項目 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分       |                             |                                 |                               |                                |                                |

其他建議事項紀錄

### 實地現場考核評分紀錄（既有公共建築物）

| 單位：○○○政府 |                             | 105 年 00 月 00 日                 |                               |                                |                                |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 項次       | 建築物三                        |                                 |                               |                                | 分數                             |
| 現場名稱     |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 既有公共建築物  |                             | 配分 15 分                         |                               |                                |                                |
| 項目       |                             | <input type="checkbox"/> 無障礙通路  | <input type="checkbox"/> 樓梯   | <input type="checkbox"/> 昇降設備  | <input type="checkbox"/> 廁所盥洗室 |
| 缺失<br>編號 | /                           |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 項目       | <input type="checkbox"/> 浴室 | <input type="checkbox"/> 輪椅觀眾席位 | <input type="checkbox"/> 停車空間 | <input type="checkbox"/> 無障礙標誌 | <input type="checkbox"/> 無障礙客房 |
| 缺失<br>編號 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分<br>項目 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分       |                             |                                 |                               |                                |                                |

其他建議事項紀錄

### 實地現場考核評分紀錄（既有公共建築物）

| 單位：○○○政府 |                             | 105 年 00 月 00 日                 |                               |                                |                                |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 項次       | 建築物四                        |                                 |                               |                                | 分數                             |
| 現場名稱     |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 既有公共建築物  |                             | 配分 15 分                         |                               |                                |                                |
| 項目       |                             | <input type="checkbox"/> 無障礙通路  | <input type="checkbox"/> 樓梯   | <input type="checkbox"/> 昇降設備  | <input type="checkbox"/> 廁所盥洗室 |
| 缺失<br>編號 | /                           |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 項目       | <input type="checkbox"/> 浴室 | <input type="checkbox"/> 輪椅觀眾席位 | <input type="checkbox"/> 停車空間 | <input type="checkbox"/> 無障礙標誌 | <input type="checkbox"/> 無障礙客房 |
| 缺失<br>編號 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 扣分       |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分<br>項目 |                             |                                 |                               |                                |                                |
| 加分       |                             |                                 |                               |                                |                                |

其他建議事項紀錄

### 實地現場考核評分紀錄

| 單位:○○○政府 |  | 105年__00__月__00__日 |
|----------|--|--------------------|
| 項次       | 騎樓整平   | 分數                 |
| 現場<br>名稱 | <input type="checkbox"/> 騎樓整平(配分15分)<br><input type="checkbox"/> 騎樓順平(配分10分) |                    |
| 考核項目     | 缺失項目   | 扣分                 |
| 地面順平     |  |                    |
| 坡道處理     |  |                    |
| 鋪面材質     |  |                    |
| 水溝蓋方向    |  |                    |
| 其 他      |  |                    |

其他建議事項紀錄

# 105 年公共建築物及騎樓無障礙環境實地現場考核評分總表

○○○政府

| 考核地點   | 名稱 | 分數 |
|--|----|----|
| 建築物一   |    |    |
| 建築物二   |    |    |
| 建築物三   |    |    |
| 建築物四   |    |    |
| <input type="checkbox"/> 騎樓整平<br><input type="checkbox"/> 騎樓順平 |    |    |
| <b>實地現場考核總成績</b>   |    |    |
|  |    |    |
| <b>召集人、共同召集人、副召集人、委員簽名</b>                                     |    |    |
|  |    |    |
|  |    |    |

### 三、無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範102年版)

表 6.3 無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範102年版)

| 受督導單位：         |     | 督導委員：  |       | 年 | 月  | 日   |    |
|----------------|-----|--|-------|---|----|-----|----|
| 公共建築物名稱        |     | 編號   | 應標示事項 |   | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 應標示圖樣種類        |     | 編號   | 應標示事項 |   | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 配置圖(比例尺大小不限)   | A01 | 方位、室外通路(含高程、引導標誌位置、淨寬、排水方向)、室外停車空間(含無障礙停車位)、避難層出入口(含坡道、引導標誌)、基地及建築物高程。   |       |   |    |     |    |
| 各層平面圖(比例尺大小不限) | A02 | 避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊(含高程、坡度、寬度、迴轉空間)、無障礙樓梯位置、昇降設備(含引導設施、輪椅迴轉空間、機廂尺寸)、廁所盥洗室(含迴轉空間)、浴室(含高程)、輪椅觀眾席位(含位置、尺寸及數量)、室內停車空間(含無障礙停車位及引導標誌位置)。                                       |       |   |    |     |    |
| 坡道及扶手          | A03 | 高程差、坡度、寬度、平臺(含起點與終點平臺、中間平臺或轉彎平臺之淨寬、淨深)、坡道防護線、扶手(含高度、形狀、淨寬、與壁面距離、端部處理)。   |       |   |    |     |    |
| 避難層出入口         | A04 | 引導標誌位置、平臺(含淨寬、淨深、坡度)、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。  |       |   |    |     |    |
| 室內出入口          | A05 | 淨寬、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。  |       |   |    |     |    |
| 樓梯             | A06 | 底板淨高未達一百九十分公分之防護設施、轉折平臺設計方式、梯級(含級深、級高、鼻端處理)、防滑條、防護線、扶手(含水平台延伸方式、端部處理、長度、高度、扶手形狀、欄杆、與壁面距離)、欄杆、警示設施。   |       |   |    |     |    |
| 昇降設備           | A07 | 引導標誌位置、輪椅迴轉空間、呼叫鈕位置、觸覺裝置位置(含各樓層乘場入口標誌)、昇降機門、機廂尺寸、扶手、後視鏡、輪椅乘坐者操作盤。  |       |   |    |     |    |
| 室內通路           | A08 | 淨高、淨寬、突出物警示或防護設施。  |       |   |    |     |    |
| 廁所盥洗室          | A09 | 無障礙廁所盥洗室：<br>引導標誌位置、迴轉空間、出入口(含門淨寬、門把、門檔位置)、鏡子、求助鈴位置、馬桶(含淨空間、高度、沖水控制、靠背)、馬桶扶手(含型式、位置及尺寸)、洗面盆(含位置、高度、深度、水龍頭開關型式、扶手)、廁所盥洗室外部設置求助鈴警示燈之位置。<br>一般廁所盥洗室：<br>小便器(含型式、位置、尺寸、淨空間)。 |       |   |    |     |    |
| 浴室             | A10 | 迴轉空間、浴缸或淋浴間位置、扶手、淋浴間座椅、淋浴間淨空間、水龍頭位置、求助鈴位置。   |       |   |    |     |    |
| 輪椅觀眾席位         | A11 | 坡度、寬度、深度、引導標誌位置、席位配置、陪伴者座椅位置、欄杆(含防護線)。   |       |   |    |     |    |

本項  
必須  
評分  
 本項  
不必  
評分


| 查核項目       | 編號  | 作業原則或替代改善說明   | 符合 | 不符合 | 備註   |
|------------|---|---|----|-----|--|
| 一、無障礙通路(一) | 範圍  | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)<br>適用範圍-建築物依規定應設置無障礙通路者，其通路設計應符合本章規定。 |    |     |  |
|            | B01   | 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙通路者，其通路設計應符合本章規定。  |    |     |  |
|            | B02   | 202.1 通則-組成：無障礙通路應由以下符合本規範規定之一個或多個設施組成：室外通路、室內通路走廊、出入口、坡道、扶手、昇降設備、輪椅昇降台等。                                       |    |     |  |
|            | B03   | 202.2 高低差：高低差在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制；高低差大於3公分者，應設置符合本規範之「坡道」、「昇降設備」或「輪椅昇降台」。                   |    |     |  |
|            | B04   | 202.3 地面：通路地面應平整、堅固、防滑。   |    |     |  |
|            | B05   | 202.4.1 獨棟或連棟建築物之特別規定-適用對象：建築基地內該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且僅供住宅使用者。   |    |     |  |
|            | B06   | 202.4.2 獨棟或連棟建築物之特別規定-組成：其地面層無障礙通路，僅須設置室外通路。  |    |     |  |
|            | B07   | 202.4.3 獨棟或連棟建築物之特別規定-設有騎樓者：其室外通路得於騎樓與道路邊界至少設置一處坡道，經由騎樓到達各棟出入口。   |    |     |  |
|            | B08   | 202.4.4 獨棟或連棟建築物之特別規定-免設置：位於山坡地，或其臨接道路之淹水潛勢高度達50公分以上，且地面層須自基地地面提高50公分以上者，或地面層設有室內停車位者，或建築基地未達10個住宅單位者，得免設置室外通路。 |    |     |  |
|            | B09   | 202.4.5 獨棟或連棟建築物之特別規定-部分設置：建築基地具10個以上、未達50個住宅單位者，應至少有1/10個住宅單位設置室外通路。其計算如有零數者，應再增加1個住宅單位設置室外通路。                 |    |     |  |
|            | B10   | 203.1 適用範圍-建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本點規定。  |    |     |  |
|            | B11   | 203.2.1 室外通路設計-引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。  |    |     |  |
|            | B12   | 203.2.2 室外通路設計-坡度：地面坡度不得大於1/15；但202.4 獨棟或連棟之建築物其地面坡度不得大於1/10，超過者須依206 節規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台，該平臺之坡度不得大於1/50。 |    |     |  |
|            | B13   | 203.2.3 室外通路設計-淨寬：通路淨寬不得小於130公分；但202.4 獨棟或連棟之建築物其通路淨寬不得小於90公分。  |    |     |  |
|            | B14   | 203.2.4 室外通路設計-排水：無遮蓋戶外通路應考慮排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100 - 2/100。  |    |     |  |
|            | B15   | 203.2.5 室外通路設計-開口：通路130公分範圍內，應儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，其水溝格柵或其他開口在主要行進之方向，開口不得大於1.3公分。                               |    |     |  |
|            | B16   | 203.2.6 室外通路設計-突出物限制：通路淨高不得小於200公分，地面起60-200公分之範圍，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。                      |    |     |  |
| B17        | 203.2.7 室外通路設計-室外通路警示設施特別規定：室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視障者使用，應依305.1 設置終端警示設施，其寬度不得小於130公分或該階梯寬度。 |   |    |     |  |
|            |   |   |    |     | <input type="checkbox"/> 必須設置<br><input type="checkbox"/> 自由設置<br>位置：數量： |

| 查核項目   | 編號         | 作業原則或替代改善說明   | 符合 | 不符合 | 備註  |
|--------|------------|---|----|-----|---|
|        |            |   |    |     |   |
| 室內通路走廊 | B18        | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)   |    |     | <input type="checkbox"/> 必須設置<br><input type="checkbox"/> 自由設置<br>位置數量： |
|        | B19        | 204.1 適用範圍-無障礙通路之室內通路走廊，應符合本節規定。  |    |     |   |
|        | B20        | 204.2.1 室內通路走廊設計-坡度：地面坡度不得大於1/50，如大於1/50 應依206 節規定設置坡道。   |    |     |   |
|        | B21        | 204.2.2 室內通路走廊設計-寬度：通路走廊寬度不得小於120 公分，走廊中如有開門，則去除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於120 公分。   |    |     |   |
|        | B22        | 204.2.3 室內通路走廊設計-迴轉空間：寬度小於150 公分之走廊，每隔10 公尺、通路走廊盡頭或距盡頭3.5 公尺以內，應有一150 公分×150 公分以上之迴轉空間。   |    |     |   |
|        | B22        | 204.2.4 室內通路走廊設計-突出物限制：室內通路走廊淨高不得小於190 公分；兩邊之牆壁，由地面起60 公分至190 公分以內，不得有10 公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施)。   |    |     |   |
| 出入口    | B23        | 205.1 適用範圍-無障礙通路上之出入口、驗(收)票口及門之設計應符合本節規定。   |    |     | <input type="checkbox"/> 必須設置<br><input type="checkbox"/> 自由設置<br>位置數量： |
|        | B24        | 205.2.1 出入口-通則：出入口兩邊之地面120 公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高度差，且坡度不得大於1/50。  |    |     |   |
|        | B25        | 205.2.2 出入口-避難層出入口：出入口前應設置平台，平台淨寬與出入口同寬，且不得小於150 公分，淨深亦不得小於150 公分，且坡度不得大於1/50。地面順平避免設置門檻，外門可考慮設置溝槽防水(蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於1.3 公分，若設門檻時，應為3 公分以下，且門檻高度在0.5 公分至3 公分者，應作1/2 之斜角處理，高度在0.5 公分以下者得不受限制。 |    |     |   |
|        | B26        | 205.2.3 出入口-室內出入口：門扇打開時，地面應乎順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於90 公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於80 公分。  |    |     |   |
|        | B27        | 205.2.4 出入口-操作空間：單扇門側邊應留適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，分別標示其所需之操作空間。  |    |     |   |
|        | B28        | 205.3 驗(收)票口淨寬不得小於80 公分，前後地板面應順平，且地板面坡度不得大於1/50。  |    |     |   |
|        | B29        | 205.4.1 門-開門方式：不得使用旋轉門，若使用自動門，必須使用水平推拉式，且應設有當門受到物體或人的阻礙時，可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15~25 公分及50~75 公分處之障礙物來啟動。   |    |     |   |
|        | B30        | 205.4.2 門-門扇：若門扇或牆版為整片透明玻璃，應於地面120 公分至150 公分處設置告知標示。  |    |     |   |
|        | B31        | 205.4.3 門-門把：應設置於地板上75-85 公分處，且門把應採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖。  |    |     |   |
|        | 一、無障礙通路(二) |   |    |     |   |

| 查核項目       | 編號  | 作業原則或替代改善說明   | 符合 | 不符合 | 備註 |
|------------|---|---|----|-----|----|
| 一、無障礙通路(三) | B32   | 206.1 坡道-適用範圍在無障礙通路上，上下平台高低差超過3公分，或連續5公尺坡度超過1/15之斜坡，應設置符合本節規定之坡道。   |    |     |    |
|            | B33   | 206.2.1 坡道設計-引導標誌：坡道牆量設置於建築物主要入口處，若未設置於主要入口處者，應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌。  |    |     |    |
|            | B34   | 206.2.2 坡道設計-寬度：坡道淨寬不得小於90公分；若坡道為取代樓梯者（即未另設樓梯），則淨寬不得小於150公分。  |    |     |    |
|            | B35   | 206.2.3 坡道設計-坡度：坡道之坡度（高度與水平長度之比）不得大於1/12；高低差小於20公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過下表規定。                                   |    |     |    |
|            | B36   | 206.2.4 地面：坡道地面應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之鋪面）、堅固、防滑。  |    |     |    |
|            | B37   | 206.3.1 平台-端點平台：坡道起點及終點，應設置長、寬各150公分以上之平台，且該平台之坡度不得大於1/50。  |    |     |    |
|            | B38   | 206.3.2 平台-中間平台：坡道每高差75公分，應設置長度至少150公分之平台，平台之坡度不得大於1/50。  |    |     |    |
|            | B39   | 206.3.3 平台-轉彎平台：坡道方向變換處應設置長寬各150公分以上之平台，該平台之坡度不得大於1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同。                               |    |     |    |
|            | B40   | 206.4.1 防護設施-坡道邊緣防護：高低差大於20公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外；或設置與地面淨距離不得大於5公分之防護桿（板）。 |    |     |    |
|            | B41   | 206.4.2 防護設施-護欄：坡道高於鄰近地面75公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於110公分之防護欄；十層以上者，不得小於120公分。                                |    |     |    |
|            | B42   | 206.5.1 扶手-設置規定：高低差大於20公分之坡道，兩側皆應設置符合本節規定之連續性扶手。扶手無需設置30公分以上之水平延伸。  |    |     |    |
|            | B43   | 206.5.2 扶手-扶手高度：設單道扶手者，地面至扶手上緣高度為75公分；設雙道扶手者，高度分別為85公分、65公分。  |    |     |    |
|            | B44   | 207.1 適用範圍無障礙設施需設置扶手者，其扶手設計應符合本節規定。   |    |     |    |
|            | B45   | 207.2.2 通則-扶手形狀：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13公分。   |    |     |    |
|            | B46   | 207.2.3 通則-表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。  |    |     |    |
| B47        | 207.3.1 扶手設置-堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。         |   |    |     |    |
| B48        | 207.3.2 扶手設置-與壁面距離：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5公分之間隙。                                  |   |    |     |    |
| B49        | 207.3.3 扶手設置-高度：單層扶手之上緣與地板面之距離應為75公分。雙層扶手上緣高度分別為65公分及85公分，若用於小學，高度則各降低10公分。 |   |    |     |    |
| B50        | 207.3.4 扶手設置-端部處理：扶手端部應作防勾撞處理，並視需要設置可供視障者辨識之資訊或點字。                          |   |    |     |    |

| 查核項目   | 編號    | 作業原則或替代改善說明  | 符合   | 不符合 | 備註 |
|--------|-------|--|--|-----|----|
| 二、樓梯   |       | □【規範102.01.01】內政部101.11.16公告內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用) |  |     |    |
|        | 通則    | C01  | 301.1 通則-樓梯形式：不得設置旋轉式及梯級間無垂直板之露空式樓梯。   |     |    |
|        |       | C02  | 301.2 地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。   |     |    |
|        |       | C03  | 301.3 戶外樓梯：無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。若樓梯動線上有落水口，則開口不得大於1.3公分。                                       |     |    |
|        | 樓梯設計  | C04  | 302.1 樓梯設計-樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達190公分部份應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視障者之設施)。   |     |    |
|        |       | C05  | 302.2 樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退至少一階。但扶手符合平順轉折，且平台寬度符合規定者，不在此限。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨距離應不得小於190公分。                           |     |    |
|        |       | C06  | 303.1 梯級-級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高(R)需為16公分以下，級深(T)不得小於26公分，且 $55 \text{公分} \leq 2R + T \leq 65 \text{公分}$ 。         |     |    |
|        |       | C07  | 303.2 梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於1.3公分，且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於2公分。  |     |    |
|        | 梯級    | C08  | 303.3 防滑條：梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理，且應與踏步平面順平。   |     |    |
|        |       | C09  | 303.4 防護緣：梯級未鄰接牆壁部份，應設置高出梯級5公分以上之防護緣。  |     |    |
|        |       | C10  | 303.5.1 特別規定-適用對象：第2層以上供住宅使用之公寓大廈，各樓層之樓地板面積240平方公尺以下者。   |     |    |
|        |       | C11  | 303.5.2 特別規定-級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高(R)需為18公分以下，級深(T)不得小於24公分，且 $55 \text{公分} \leq 2R + T \leq 65 \text{公分}$ 。     |     |    |
|        | 扶手與欄杆 | C12  | 304.1 扶手與欄杆-扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75-85公分之扶手或雙道扶手(高65公分及85公分)，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台(或樓板)間之高差在20公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。 |     |    |
|        |       | C13  | 304.2 水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。  |     |    |
|        | 警示設施  | C14  | 305.1 警示設施-終端警示：距梯級終端30公分處，應設置深度30-60公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。  |     |    |
| 戶外平台階梯 | C15   | 306 戶外平台階梯之寬度在6公尺以上者，應於中間加裝扶手，梯級級高之設置應符合303.1之規定，扶手之設置應符合304節之規定。          |  |     |    |

必須設置  
 自由設置  
 位置數量：

| 查核項目      | 編號      | 作業原則或替代改善說明  | 符合  | 不符合 | 備註 |  |
|-----------|---------|--|---|-----|----|--|
| 三、升降設備(一) | 範圍      | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)                      |   |     |    |  |
|           | 一般規定    | 401 適用範圍-無障礙垂直通路中使用之升降機，其出入平台及供行動不便者使用之相關設施應依本章規定設置。   |   |     |    |  |
|           | 引導標誌    | D01  | 402 一般規定-無障礙升降機與群管理控制下之一般升降機之呼叫按鈕必須分別設置，並得以相鄰兩座無障礙升降機為群管理控制。  |     |    |  |
|           |         | D02  | 403.1 引導標誌-入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙升降機方向指引。  |     |    |  |
|           |         | D03  | 403.2 升降機引導：升降機設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作30公分×60公分之不同材質處理。   |     |    |  |
|           |         | D04  | 403.3 主要入口樓層標誌：主要入口樓層之升降機應設置以下無障礙標誌。  |     |    |  |
|           |         | D05  | 403.3.1 突出牆壁：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面200-220公分，尺寸不得小於15公分。   |     |    |  |
|           |         | D06  | 403.3.2 平行牆面：平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣應距地板面180-200公分處，尺寸不得小於10公分。   |     |    |  |
|           |         | D07  | 404.1 升降機出入平台(停靠處)-輪椅迴轉空間：升降機出入口之樓地板應無高差，且坡度不得大於1/50，並留設不得小於直徑1.5公尺之淨空間。  |     |    |  |
|           | 升降機出入平台 | D08  | 404.2 升降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設置2組呼叫鈕，呼叫鈕最小的尺寸應為長寬各2公分以上，或直徑2公分以上。上組呼叫鈕左邊應設置點字，下組呼叫鈕之中心線距樓地板面85-90公分，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各5公分之無障礙標誌。                              |     |    |  |
|           |         | D09  | 404.3 升降機入口的觸覺裝置：在升降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各8公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬6公分、長8公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方135公分，且標示之數字需與地板的顏色有明顯不同。 |     |    |  |
|           |         | D10  | 405.1 升降機門-升降機門：升降機門應水平方向開啟，並為自動開關方式。如果門受到物體或人的阻礙時，升降機門應設有可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15~25公分及50~75公分處之障礙物來啟動。  |     |    |  |
|           | 升降機門    | D11  | 405.2 關門時間：梯廳升降機到達時，門開啟至關閉之時間不應少於5秒鐘；若由升降機廂內按鈕開門，升降機門應維持完全開啟狀態至少5秒鐘。  |     |    |  |
|           |         | D12  | 405.3 升降機出入口：升降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分。  |     |    |  |
|           |         | D13  | 406.1 升降機廂-機廂尺寸：升降機門的淨寬度不得小於90公分，機廂之深度不得小於135公分(不需扣除扶手佔用之空間)；但集合住宅升降機門的淨寬度不得小於80公分。   |     |    |  |
| 升降機廂      | D14     | 406.2 扶手：機廂內至少兩側牆面應設置扶手，扶手的設置應符合207節之規定。但固定方式不得受本規範圖207.2.2之限制。                                |   |     |    |  |
|           | D15     |  圖 207.2.2 |   |     |    |  |



| 查核項目     | 編號  | 作業原則或替代改善說明   | 符合   | 不符合 | 備註 |  |
|----------|---|---|--|-----|----|--|
| 廁所盥洗室(一) | 範圍<br><br>通則<br><br>引導標誌<br><br>廁所<br><br>馬桶及扶手   | <input type="checkbox"/> 【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用) |  |     |    |  |
|          |   | E01   | 501 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙廁所盥洗室者，其設計應符合本章規定。  |     |    |  |
|          |   | E02   | 502.1 位置：廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處。   |     |    |  |
|          |   | E03   | 502.2 地面：廁所盥洗室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。   |     |    |  |
|          |   | E04   | 502.3 高差：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。  |     |    |  |
|          |   | E05   | 503.1 引導標誌-入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。   |     |    |  |
|          |   | E06   | 503.2 標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖902.1之無障礙標誌，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。  |     |    |  |
|          |   | E07   | 504.1 廁所-淨空間：廁所盥洗室空間內應設置迴轉空間，其直徑不得小於150公分。   |     |    |  |
|          |   | E08   | 504.2 門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於80公分，且門把距門邊應保持6公分，靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。                                 |     |    |  |
|          |   | E09   | 504.3 鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於90公分，鏡面的高度應在90公分以上。  |     |    |  |
|          |   | E10   | 504.4.1 求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置兩處緊急求助鈴，一處在距離馬桶前緣往後15公分、馬桶座位60公分，另在距地板面高35公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。                        |     |    |  |
|          |   | E11   | 504.4.2 求助鈴-連接裝置：按鈕應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。  |     |    |  |
|          |   | E12   | 505.1 馬桶及扶手-適用範圍：無障礙廁所設置馬桶及扶手，應符合本節規定。   |     |    |  |
|          |   | E13   | 505.2 淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側端時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分。   |     |    |  |
|          |   | E14   | 505.3 高度：無障礙廁所盥洗室應使用一般形式之馬桶，座位之高度為40-45公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背，靠背距離馬桶前緣42-48公分，靠背與馬桶座位之淨距離為20公分(水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42-48公分)。 |     |    |  |
|          |   | E15   | 505.4 沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10公分及馬桶座面上約40公分處。   |     |    |  |
|          |   | E16   | 505.5 側邊L型扶手：馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27公分。          |     |    |  |
| E17      | 505.6 可動扶手：馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前緣且突出部分不得大於15公分。 |   |  |     |    |  |

| 查核項目       | 編號   | 作業原則或替代改善說明   | 符合 | 不符合 | 備註 |
|------------|--|---|----|-----|----|
| 四、廁所盥洗室(一) |  | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)   |    |     |    |
|            |  | 506.1 小便器-位置：一般廁所設有小便器者，應設置無障礙小便器，無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處。   |    |     |    |
|            |  | 506.2 無障礙空間：小便器前方不得有高差。   |    |     |    |
|            |  | 506.3 高度：小便器之突出端距地板面應為35-38公分。小便器頂部距樓地板面為100-120公分。   |    |     |    |
|            |  | 506.4 沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合A102.3及A102.4節手可觸及範圍之規定。  |    |     |    |
|            |  | A102.3.1 輪椅正向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者正向接近時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分，以高度為85公分最適宜。   |    |     |    |
|            |  | A102.3.2 輪椅正向接近可及範圍-桌檯較小：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出小於50公分，可及之最大高度為120公分。   |    |     |    |
|            |  | A102.3.3 輪椅正向接近可及範圍-桌檯較大：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出50-60公分，則其可及之最大高度為110公分。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。   |    |     |    |
|            |  | A102.4.1 側向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者側向接近時，且中間無阻礙物時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分。  |    |     |    |
|            |  | A102.4.2 側向接近可及範圍-桌檯較小：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度小於25公分，可及之最大高度為120公分。   |    |     |    |
|            |  | A102.4.3 側向接近可及範圍-桌檯較大：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度為25-60公分時，可及之最大高度為115公分。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。   |    |     |    |
|            |  | 506.5 空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分。  |    |     |    |
|            |  | 506.6 扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面85公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65-70公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為60公分，長度為55公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為25公分。 |    |     |    |
|            |  | 507.1 洗面盆-適用範圍：無障礙洗面盆或洗手槽，應符合本節規定。  |    |     |    |
|            |  | 507.2 無障礙空間：洗面盆前方不得有高差。   |    |     |    |
|            | 507.3 高度：洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，且洗面盆下面距面盆邊緣20公分之範圍，由地板面量起高65公分及水平30公分內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。 |   |    |     |    |
|            | 507.4 水龍頭：水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。   |   |    |     |    |
|            | 507.5 洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於45公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。      |   |    |     |    |
|            | 507.6 扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗面盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1-3公分，且扶手於洗面盆邊緣水平淨距離2-4公分。                     |   |    |     |    |

續前頁

| 查核項目 | 編號  | 編號   | 作業原則或替代改善說明  | 符合 | 不符合 | 備註 |  |
|------|-----|--|--|----|-----|----|--|
| 五、浴室 | 範圍  | F01  | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)  |    |     |    |  |
|      |     | F02  | 601適用範圍-建築物依規定應設置無障礙浴室者，其浴缸或淋浴間之設計應符合本章規定。   |    |     |    |  |
|      | 通則  | F03  | 602.1 通則-位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處。   |    |     |    |  |
|      |     | F04  | 602.2 通則-地面：浴室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。   |    |     |    |  |
|      |     | F05  | 602.3 通則-高差：由無障礙通路進入浴室不得有高差，止水宜採用截水溝。  |    |     |    |  |
|      |     | F06  | 602.4 通則-求助鈴：一處距地板面高90-120公分處；另距地板面高35公分範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。  |    |     |    |  |
|      |     | F07  | 603.1 適用範圍：無障礙浴缸應符合本節規定。   |    |     |    |  |
|      | 浴缸  | F08  | 603.2 位置：浴缸前方之無障礙空間應涵蓋整個浴缸的長度，前方淨空間寬度不得小於浴缸寬度，深度為80公分以上。   |    |     |    |  |
|      |     | F09  | 603.3 浴缸：浴缸長度不得大於140公分；浴缸外側距地面高度45公分、底部應設置止滑片，且浴缸內兩側接近上緣處，應設置扶手。   |    |     |    |  |
|      |     | F10  | 603.4 扶手：側面牆壁應裝設一水平及垂直扶手；水平扶手上緣距浴缸底面75公分，與出水側牆壁的距離不得大於38公分；垂直部份之長度不得小於60公分，與浴缸靠背側之外緣距離約70公分；出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手，該扶手水平上緣距浴缸底面75公分，垂直及水平部份之長度不得小於60公分，且垂直部分距浴缸外緣不得超過10公分。 |    |     |    |  |
|      |     | F11  | 604.1 適用範圍：設置移位式淋浴間或輪椅進入式淋浴間須符合本節規定。   |    |     |    |  |
|      | 淋浴間 | F12  | 604.2 座椅：應設寬45公分以上、深40公分、距地板面高度45公分之座椅（固定或活動式皆可），座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣（斜率約1/12）。  |    |     |    |  |
|      |     | F13  | 604.3.1 移位式淋浴間-定義：設有固定座椅，輪椅無法直接進入，使用者必須移位至座椅之淋浴間。  |    |     |    |  |
|      |     | F14  | 604.3.2 移位式淋浴間-尺寸：淋浴間長度及寬度皆不得小於90公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬90公分，長120公分。   |    |     |    |  |
|      |     | F15  | 604.3.3 移位式淋浴間-扶手：兩側牆壁應設置水平扶手，其入口對向牆壁之水平扶手長度不得小於45公分，扶手上緣距地板面75公分；入口之牆壁近外緣處2側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手，其長度不得小於60公分。  |    |     |    |  |
|      | 淋浴間 | F16  | 604.3.4 移位式淋浴間-水龍頭位置：設於入口側面牆壁，牆面之中心線左右各38公分且距地板面80-120公分之區域。   |    |     |    |  |
|      |     | F17  | 604.4.1 輪椅進入式淋浴間-定義：設有活動座椅，可選擇乘坐洗澡用輪椅者直接進入，或移位至座檯之淋浴間。   |    |     |    |  |
|      |     | F18  | 604.4.2 輪椅進入式淋浴間-尺寸：淋浴間長度不得小於150公分、寬度不得小於80公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬80公分，長150公分。   |    |     |    |  |
|      |     | F19  | 604.4.3 輪椅進入式淋浴間-扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆壁皆需設置扶手，距地板面高度75公分，距牆角15公分內不得設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度75公分之可動式扶手。  |    |     |    |  |
| F20  |     | 604.4.4 輪椅進入式淋浴間-水龍頭位置：設於入口對側牆壁，無座位者，可為距地板面80-120公分之區域；有座位者，其設置區域以距座位之牆壁68公分之範圍為限。 |  |    |     |    |  |

| 查核項目   | 編號 | 作業原則或替代改善說明  | 符合  | 不符合       | 備註          |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|--|----|--|---|-----------|-------------|-------|---|----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|--|-----------|-------------|------------|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|--|--|
| 六、輪椅觀眾席位   | 範圍 | <p>【規範102.01.01】內政部101.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)</p> |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 701 適用範圍一設有固定座椅場所之輪椅觀眾席位應符合本章規定。   |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 702.1 地面：輪椅觀眾席位的地面應堅硬平整、防滑，且坡度不得大於1/50。                                      |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 702.2 數量：建築物設有固定座椅者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：                                       | <table border="1"> <tr> <th>固定座椅數量(個)</th> <th>輪椅觀眾席位數量(個)</th> </tr> <tr> <td>50 以下</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>51 - 150</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>151 - 250</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>251 - 350</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>351 - 450</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>451 - 550</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>551 - 700</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>701 - 850</td> <td>8</td> </tr> </table> | 固定座椅數量(個) | 輪椅觀眾席位數量(個) | 50 以下 | 1 | 51 - 150 | 2 | 151 - 250 | 3 | 251 - 350 | 4 | 351 - 450 | 5 | 451 - 550 | 6 | 551 - 700 | 7 | 701 - 850 | 8 | <table border="1"> <tr> <th>固定座椅數量(個)</th> <th>輪椅觀眾席位數量(個)</th> </tr> <tr> <td>851 - 1000</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>1001 - 1250</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1251 - 1500</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1501 - 1750</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>1751 - 2000</td> <td>13</td> </tr> </table> <p>超過2000個固定座椅者，超過部分每增加500個固定座椅，應再增加1個輪椅觀眾席位。</p> | 固定座椅數量(個) | 輪椅觀眾席位數量(個) | 851 - 1000 | 9 | 1001 - 1250 | 10 | 1251 - 1500 | 11 | 1501 - 1750 | 12 | 1751 - 2000 | 13 |  |  |
|  |    | 固定座椅數量(個)  | 輪椅觀眾席位數量(個)   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 50 以下  | 1   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 51 - 150   | 2   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 151 - 250  | 3   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 251 - 350  | 4   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 351 - 450  | 5   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 451 - 550  | 6   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 551 - 700  | 7   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 701 - 850  | 8   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 固定座椅數量(個)  | 輪椅觀眾席位數量(個)   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
|  |    | 851 - 1000   | 9   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 1001 - 1250  | 10 |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 1251 - 1500  | 11 |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 1501 - 1750  | 12 |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 1751 - 2000  | 13 |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 702.3 多廳式場所：多廳式之場所，其輪椅觀眾席位數量，應依各廳觀眾席位之固定坐椅席位數分別計算。                                       |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 702.4 席位安排：輪椅觀眾席位得設於觀眾席位不同位置、區域及樓層，以增加多方位的較佳視野角度。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 702.4.1 固定銀幕水平能見度容許範圍：中間區域之席位與銀幕兩側之夾角 $\leq 90^\circ$ ，兩側區域之席位與銀幕兩側之夾角 $\leq 60^\circ$ 。 |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 702.4.2 固定銀幕仰視能見度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角 $\leq 30^\circ$ 。                              |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 702.5 座椅彈性運用：輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之座椅，如未有輪椅使用者使用時，得安裝座椅。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 703.1 寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有多個輪椅觀眾席位時，每個空間寬度不得小於85公分。                                   |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 703.2 深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位時，空間深度不得小於120公分，而輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則空間深度不得小於150公分。                 |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.1 引導標誌：觀眾席位主要入口處及沿路轉彎處應設置輪椅席位之方向標示。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.2 位置：應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可到達之處，若有3個以上之輪椅觀眾席位並排時，應可由前後或左右兩側進入該席位。                   |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.3 視線：輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。   |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.4 陪伴者之座椅：在輪椅觀眾席位鄰近至少應留有一個陪伴者座椅。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.5 欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.6 欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.7 欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.8 欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |
| 704.9 欄杆：座位前地面有高差者應設置欄杆，欄杆高度75公分。  |    |  |   |           |             |       |   |          |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |   |  |           |             |            |   |             |    |             |    |             |    |             |    |  |  |

| 查核項目   |         | 編號   | 作業原則或替代改善說明  | 符合   | 不符合 | 備註 |
|--------|---------|--|--|--|-----|----|
| 七、停車空間 | 範圍      | H01  | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)  |  |     |    |
|        | 通則      | H02  | 801 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙停車位者，應符合本章規定。   |  |     |    |
|        |         | H03  | 802 通則-無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。   |  |     |    |
|        |         | H04  | 803.1 入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。   |  |     |    |
|        |         | H05  | 803.2.1 車位標誌-車位應設立標誌：應於室外停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40公分×40公分以上，下緣高度190-200公分。   |  |     |    |
|        |         | H06  | 803.2.2 車位標誌-車位懸掛、張貼標誌：應於室內無障礙停車位上方、鄰近牆或柱面旁設置具夜光效果，且無遮蔽、易於辨識之懸掛或張貼標誌，標誌尺寸應不得小於30公分×30公分以上，下緣距地板面高度不得小於190公分。                                     |  |     |    |
|        |         | H07  | 803.3 車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分×90公分，停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反差效果，下車區應為白色斜線及直線，予以區別。  |  |     |    |
|        |         | H08  | 803.4 停車位地面：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質的砂或石礫，高低差不得大於0.5公分，坡度不得大於1/50。   |  |     |    |
|        |         | H09  | 804.1 單一停車位：汽車停車位長度不得小於600公分、寬度不得小於350公分，包括寬150公分的下車區，下車區斜線間淨距離為40公分以下，標線寬度為10公分。  |  |     |    |
|        |         | H10  | 804.2 相鄰停車位：相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於600公分、寬度不得小於550公分，包括寬150公分的下車區。  |  |     |    |
|        | 八、無障礙標誌 | 機車停車位及出入口  | H11  | 805.1 停車位：機車停車位長度不得小於220公分，寬度不得小於225公分，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分×90公分。 |     |    |
|        |         | I01  | 805.2 出入口：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均不得小於180公分。   |  |     |    |
| 範圍     |         | I02  | 901 適用範圍-無障礙標誌應依本章規定設置。<br>902.1 標誌：無障礙標誌應符合圖902.1規定之比例。<br> |  |     |    |
|        | I03     | 902.2 顏色：無障礙標誌之顏色與底色應有明顯不同，且該標誌若設置於牆面上，該標誌之底色亦應與牆面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。 |  |  |     |    |

| 查核項目   | 編號  | 作業原則或替代改善說明  | 符合 | 不符合 | 備註 |
|--------|-----|--|----|-----|----|
| 範圍     | J01 | □【規範102.01.01】內政部101.11.16台內營字第1010810415號令修正之設計規範(102.01.01至103.12.31適用)                    |    |     |    |
|        | J02 | 1001 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙客房者，其設計應符合本章規定。  |    |     |    |
|        | J03 | 1002.1 位置：無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。   |    |     |    |
|        | J04 | 1002.2 地面：無障礙客房之地面應平順、防滑。  |    |     |    |
|        | J05 | 1002.3 出入口：由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範205.2.3及205.2.4之規定。  |    |     |    |
|        | J06 | 1003.1 衛浴設備空間：無障礙客房內應設置衛浴設備，衛浴設備至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間等。   |    |     |    |
|        | J07 | 1003.2：衛浴設備空間應設置迴轉空間，其直徑不得小於135公分。   |    |     |    |
|        | J08 | 1003.3 馬桶及扶手之設置應符合本規範505之規定。   |    |     |    |
|        | J09 | 1003.4 洗面盆之設置應符合本規範507之規定。   |    |     |    |
|        | J10 | 1003.5：衛浴設備空間之浴缸或淋浴間之設置應符合本規範603、604之規定。   |    |     |    |
| 衛浴設備空間 | J11 | 1003.6：衛浴設備空間馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範504.4及602.4之規定。  |    |     |    |
|        | J12 | 1004.1 房間內通路：房間內通路寬度不得小於120公分，床間淨寬度不得小於90公分。   |    |     |    |
|        | J13 | 1004.2 門：其設置應符合本規範205.4之規定。  |    |     |    |
|        | J14 | 1004.3 供房客使用之電器插座及開關：其設置高度應距地板面高70-100公分處，設置位置應距柱、牆角30公分以上，並符合A102.3及A102.4輪椅正向與側向接近可及範圍之規定。 |    |     |    |
|        | J15 | A102.3.1 輪椅正向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者正向接近時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分，以高度為85公分最適宜。                      |    |     |    |
|        | J16 | A102.3.2 輪椅正向接近可及範圍-桌檯較小：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出小於50公分，可及之最大高度為120公分。                                |    |     |    |
|        | J17 | A102.3.3 輪椅正向接近可及範圍-桌檯較大：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出50-60公分，則其可及之最大高度為110公分。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。        |    |     |    |
|        | J18 | A102.4.1 側向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者側向接近時，且中間無阻礙物時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分。                           |    |     |    |
|        | J19 | A102.4.2 側向接近可及範圍-桌檯較小：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度小於25公分，可及之最大高度為120公分。                                  |    |     |    |
|        | J20 | A102.4.3 側向接近可及範圍-桌檯較大：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度為25-60公分時，可及之最大高度為115公分。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。          |    |     |    |
| 房間內求助鈴 | J21 | 1005.1 位置：應至少設置兩處，一處距地板面高90-120公分處；另一處距地板面35-45公分，且按鈕應明確標示，易於觸控。                             |    |     |    |
|        | J22 | 1005.2 連接裝置：求助鈴按號應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部設置警示燈或警響。                                       |    |     |    |

必須設置  
 自由設置  
 位置數量：

九、無障礙客房

## 四、無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 97 年版)

表 6.4 無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 97 年版)

| 無障礙生活環境業務督導實地現場抽查考評表(設計規範 97 年版) |       |  |    |
|----------------------------------|-------|--|----|
| 受督導單位：                           | 督導委員： | 年 月 日  |    |
| 公共建築物名稱                          | 編號    | 建照掛號日期：<br>使用核發日期：<br>最後一次辦理變更使用：  |    |
| 應標示圖樣種類                          | 編號    | 應標示事項  | 備註 |
| 配置圖(比例尺大小不限)                     | A01   | 方位、室外通路(含高程、引導標誌位置、淨寬、排水方向)、室外停車空間(含無障礙停車位)、避難層出入口(含坡道、引導標誌)、基地及建築物高程。   | 符合 |
| 各層平面圖(比例尺大小不限)                   | A02   | 避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊(含高程、坡度、寬度、迴轉空間)、無障礙樓梯位置、昇降設備(含引導設施、輪椅迴轉空間、機梯尺寸)、廁所盥洗室(含迴轉空間)、浴室(含高程)、輪椅觀眾席位(含位置、尺寸及數量)、室內停車空間(含無障礙停車位及引導標誌位置)。                                       | 符合 |
| 坡道及扶手                            | A03   | 高程差、坡度、寬度、平臺(含起點與終點平臺、中間平臺或轉彎平臺之淨寬、淨深)、坡道防護緣、扶手(含高度、形狀、淨寬、與壁面距離、端部處理)。   | 符合 |
| 避難層出入口                           | A04   | 引導標誌位置、平臺(含淨寬、淨深、坡度)、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。  | 符合 |
| 室內出入口                            | A05   | 淨寬、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。  | 符合 |
| 樓梯                               | A06   | 底版淨高未達一百九十分之防護設施、轉折平臺設計方式、梯級(含級深、級高、鼻端處理)、防滑條、防護緣、扶手(含水平延伸方式、端部處理、長度、高度、扶手形狀、與壁面距離)、欄杆、警示設施。   | 符合 |
| 昇降設備                             | A07   | 引導標誌位置、輪椅迴轉空間、呼叫鈕位置、觸覺裝置位置(含各樓層乘場入口標誌)、昇降機門、機梯尺寸、扶手、後視鏡、輪椅乘坐者操作盤。  | 符合 |
| 室內通路走廊                           | A08   | 淨高、淨寬、突出物警示或防撞設施。  | 符合 |
| 廁所盥洗室                            | A09   | 無障礙廁所盥洗室：<br>引導標誌位置、迴轉空間、出入口(含門淨寬、門把、門檔位置)、鏡子、求助鈴位置、馬桶(含淨空間、高度、沖水控制、靠背)、馬桶扶手(含型式、位置及尺寸)、洗面盆(含位置、高度、深度、水龍頭開關型式、扶手)、廁所盥洗室外部設置求助鈴警示燈之位置。<br>一般廁所盥洗室：<br>小便器(含型式、位置、尺寸、淨空間)。 | 符合 |
| 浴室                               | A10   | 迴轉空間、浴缸或淋浴間位置、扶手、淋浴間座椅、淋浴間淨空間、水龍頭位置、求助鈴位置。   | 符合 |
| 輪椅觀眾席位                           | A11   | 坡度、寬度、深度、引導標誌位置、席位配置、陪伴者座椅位置、欄杆(含防護緣)。   | 符合 |

本項  
 必須  
 評分  
 本項  
 不必  
 評分

| 查核項目       | 編號   | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合  | 不符合 | 備註 |  |
|------------|--|---|---|-----|----|--|
| 一、無障礙通路(一) | 範圍   | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802100號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用) |   |     |    |  |
|            |  | 201 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙通路者，其通路設計應符合本章規定。  |   |     |    |  |
|            | 通則   | B02   | 202.1 組成：無障礙通路應由以下符合本規範規定之一個或多個設施組成：室外通路、室內通路走廊、出入口、坡道、扶手、昇降設備、輪椅升降平台等。                               |     |    |  |
|            |  | B03   | 202.2 高低差：高低差在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理，高低差在0.5公分以下者得不受限制(圖202.2)；高低差大於3公分者，應設置符合本規範之「坡道」、「昇降設備」或「輪椅升降台」。 |     |    |  |
|            |  | B04   | 202.3 地面：通路地面應平整、堅固、防滑。   |     |    |  |
|            |  | B05   | 203.1 適用範圍-建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各種建築物間設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本規定。                               |     |    |  |
|            |  | B06   | 203.2.1 設計原則-引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。  |     |    |  |
|            |  | B07   | 203.2.2 設計原則-坡度：地面坡度不得大於1/15，超過者須依206 規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台，該平台之坡度不得大於1/50。                        |     |    |  |
|            | B08  | 203.2.3 設計原則-淨寬：通路淨寬不得小於130公分。  |   |     |    |  |
|            | B09  | 203.2.4 設計原則-排水：無遮蓋戶外通路應考慮排水，可往路拱兩邊排水，洩水坡度1/100-2/100。  |   |     |    |  |
|            | B10  | 203.2.5 設計原則-開口：通路130公分範圍內，應儘量不設置水溝格柵或其他開口，如需設置，其水溝格柵或其他開口在主要行進之方向，開口不得大於1.3公分。   |   |     |    |  |
|            | B11  | 203.2.6 設計原則-突出物限制：通路淨高不得小於200公分，地面起60-200公分之範圍，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。  |   |     |    |  |
|            | B12  | 204.1 適用範圍-無障礙通路之室內通路走廊，應符合本節規定。  |   |     |    |  |
|            | B13  | 204.2.1 室內通路走廊設計-坡度：地面坡度不得大於1/50，如大於1/50 應依206 節規定設置坡道。   |   |     |    |  |
|            | B14  | 204.2.2 室內通路走廊設計-寬度：通路走廊寬度不得小於120公分，走廊中如有開門，則去除門扇開啟之空間後，其寬度不得小於120公分。   |   |     |    |  |
|            | B15  | 204.2.3 室內通路走廊設計-迴轉空間：寬度小於150公分之走廊，每隔10公尺、通路走廊盡頭或距盡頭3.5公尺以內，應有一150公分x150公分以上之迴轉空間。  |   |     |    |  |
| B16        | 204.2.4 室內通路走廊設計-突出物限制：室內通路走廊淨高不得小於190公分；兩邊之牆壁，由地面起60公分至190公分以內，不得有10公分以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示或其他防撞設施。 |   |   |     |    |  |

| 查核項目       | 編號  | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合 | 不符合 | 備註 |
|------------|---|---|----|-----|----|
| <b>出入口</b> | B17   | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802190號令修正之設計規範（097.07.01至097.12.18適用）<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之設計規範（097.12.19至101.12.31適用） |    |     |    |
|            | B18   | 205.1 適用範圍-無障礙通路上之出入口、驗（收）票口及門之設計應符合本節規定。   |    |     |    |
|            | B19   | 205.2.1 出入口-通則：出入口兩邊之地面120公分之範圍內應平整、堅硬、防滑，不得有高差，且坡度不得大於1/50。  |    |     |    |
|            | B20   | 205.2.2 出入口-避難層出入口：出入口前應設置平台，平台淨寬與出入口同寬，且不得小於150公分，淨深亦不得小於150公分，且坡度不得大於1/50。地面順平避免設置門檻，外門可考慮設置溝槽防水（蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於1.3公分），若設門檻時，應為3公分以下，且門檻高度在0.5公分至3公分者，應作1/2之斜角處理，高度在0.5公分以下者不得受限制。              |    |     |    |
|            | B21   | 205.2.3 出入口-室內出入口：門扇打開時，地面應平順不得設置門檻，且門框間之距離不得小於90公分；另折疊門應以推開後，扣除折疊之門扇後之距離不得小於80公分。  |    |     |    |
|            | B22   | 205.2.3 出入口-操作空間：單扇門側邊應留適當之操作空間，其操作空間因門扇開啟之方式及到達門之方向不同而異，分別標示其所需之操作空間。  |    |     |    |
|            | B23   | 205.3 驗(收)票口-淨寬不得小於80公分，前後地板面應順平，且地板面坡度不得大於1/50。  |    |     |    |
|            | B24   | 205.4.1 門-開門方式：不得使用旋轉門，若使用自動門，必須使用水平推拉式，且應設有警門受到物體或人的阻礙時，可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15~25公分及50~75公分處之障礙物來啟動。   |    |     |    |
|            | B25   | 205.4.2 門-門扇：若門扇或牆版為整片透明玻璃，應於地面120公分至150公分處設置告知標示。  |    |     |    |
|            | B26   | 205.4.3 門-門把：應設置於地板上75-85公分處，且門把應採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖。   |    |     |    |
|            | B27   | 206.1 適用範圍-在無障礙通路上，上下平台高低差超過3公分，或連續5公尺坡度超過1/15之斜坡，應設置符合本節規定之坡道。   |    |     |    |
|            | B28   | 206.2.1 坡道設計-引導標誌：坡道儘量設置於建築物主要入口處，若未設置於主要入口處者，應於入口處及沿路轉彎處設置引導標誌。  |    |     |    |
| B29        | 206.2.2 坡道設計-寬度：坡道淨寬不得小於90公分；若坡道為取代樓梯者（即未另設樓梯），則淨寬不得小於150公分。            |   |    |     |    |
| B30        | 206.2.3 坡道設計-坡度：坡道之坡度（高度與水平長度之比）不得大於1/12；高低差小於20公分者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過下表規定。 |   |    |     |    |
| B31        | 206.2.4 坡道設計-地面：坡道地面應平整（不得設置導盲磚或其他妨礙輪椅行進之鋪面）、堅固、防滑。                     |   |    |     |    |
| B32        | 206.3.1 平台-端點平台：坡道起點及終點，應設置長、寬各150公分以上之平台，且該平台之坡度不得大於1/50。              |   |    |     |    |
| B33        | 206.3.2 平台-中間平台：坡道每高差75公分，應設置長度至少150公分之平台，平台之坡度不得大於1/50。                |   |    |     |    |
| B34        | 206.3.3 平台-出入口平台：出入口兩側之平台，應設置長度至少150公分之平台，平台之坡度不得大於1/50。                |   |    |     |    |
| <b>坡道</b>  |   |   |    |     |    |

一、無障礙通路（二）

| 查核項目      | 編號  | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合 | 不符合 | 備註 |
|-----------|---|---|----|-----|----|
| <b>坡道</b> | B33   | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802100號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用)   |    |     |    |
|           | B34   | <p>206.3.3 平台-轉彎平台：坡道方向變換處應設置寬各150公分以上之平台，該平台之坡度不得大於1/50，坡道因轉彎角度不同其平台設置方式亦不同。</p> <p>規範0970701，206.4.1 防護設施-坡道邊緣防護：高低差大於20公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外。</p> <p>規範0971219，206.4.1 防護設施-坡道邊緣防護：高低差大於20公分者，未鄰牆壁之一側或兩側應設置不得小於高度5公分之防護緣，該防護緣在坡道側不得突出於扶手之垂直投影線外；或設置與地面淨距離不得大於5公分之防護桿(板)。</p> |    |     |    |
|           | B35   | <p>規範0970701，206.4.2 防護設施-護欄：坡道高於鄰近地面75公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度100公分之防護欄。如果高差在二層以下者，護欄高度不得小於100公分，三層以上者不得小於110公分，十層以上者，不得小於120公分。</p> <p>規範0971219，206.4.2 防護設施-護欄：坡道高於鄰近地面75公分時，未臨牆之一側或兩側應設置高度不得小於110公分之防護欄；十層以上者，不得小於120公分。</p>   |    |     |    |
|           | B36   | <p>【規範0971219僅圖示修正】</p> <p>206.5.1 扶手-設置規定：高低差大於20公分之坡道，兩側皆應設置符合本規範規定之連續性扶手。</p>  |    |     |    |
|           | B37   | 206.5.2 扶手-扶手高度：設置扶手者，地面至扶手上緣高度為75公分；設置通扶手者，高度分別為85公分、65公分。   |    |     |    |
|           | B38   | 207.1 扶手-適用範圍-無障礙設施需設置扶手者，其扶手設計應符合本節規定。   |    |     |    |
|           | B39   | 207.2.2 通則-扶手形狀：可為圓形、橢圓形，圓形直徑約為2.8-4公分，其他形狀者，外緣周邊長9-13公分。   |    |     |    |
|           | B40   | 206.2.3 通則-表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。  |    |     |    |
|           | B41   | 207.3.1 扶手設置-堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆需穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，不可有銳利之突出物。   |    |     |    |
|           | B42   | 207.3.2 扶手設置-與壁面距離：扶手若鄰近牆壁，應與壁面保留3-5公分之間隔。  |    |     |    |
| B43       | 207.3.3 扶手設置-高度：單層扶手之上緣與地板面之距離應為75公分，雙層扶手上緣高度分別為65公分及85公分。若用於小學，高度則各降低10公分。 |   |    |     |    |
| B44       | 207.3.4 扶手設置-端部處理：扶手端部應作防勾撞處理，並視需設置可供視障者辨識之資訊或點字。                           |   |    |     |    |
| <b>扶手</b> |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |
|           |   |   |    |     |    |

一、無障礙通路(三)

| 查核項目 | 編號    | 作業程序及認定原則或替代改善說明   | 符合  | 不符合 | 備註 |  |
|------|-------|--|---|-----|----|--|
| 二、樓梯 | 通則    | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802190號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第0970809360號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用) |   |     |    |  |
|      |       | 301.1 樓梯形式：不得設置旋轉式及梯級間無垂直板之露空式樓梯。  |   |     |    |  |
|      |       | 301.2 地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。   |   |     |    |  |
|      |       | 301.3 戶外樓梯：無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。若樓梯動線上有落水口，則開口不得大於1.3公分。   |   |     |    |  |
|      | 樓梯設計  | 302.1 樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達190公分部份應設防護設施(可使用格柵、花台或任何可提醒視障者之設施)。  |   |     |    |  |
|      |       | <b>【規範0971219僅圖示修正】</b><br>302.2 樓梯轉折設計：樓梯往上之梯級部份，起始之梯級應退一階。<br>302.3 樓梯平台：不得有梯級或高低差。  |   |     |    |  |
|      | 梯級    | 303.1 級深及級高：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高(R)需為16公分以下，級深(T)不得小於26公分，且 $55 \text{公分} \leq 2R + T \leq 65 \text{公分}$ 。  |   |     |    | <input type="checkbox"/> 必須設置<br><input type="checkbox"/> 自由設置<br>位置：<br>數量： |
|      |       | 303.2 梯級鼻端：梯級突沿的彎曲半徑不得大於1.3公分，且超出踏板的突沿應將突沿沿下方作成斜面，該突出之斜面不得大於2公分。   |   |     |    |  |
|      |       | 303.3 防滑條：梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理，且應與踏步平面順平。   |   |     |    |  |
|      |       | 303.4 防護緣：梯級未鄰接牆壁部份，應設置高出梯級5公分以上之防護緣。  |   |     |    |  |
|      | 扶手與欄杆 | C11  | 規範0970701, 304.1 扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75公分之扶手或雙道扶手(高65公分及85公分)，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台(或樓板)間之高差在20公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。<br>規範0970701, 304.1 扶手：樓梯兩側應裝設距梯級鼻端高度75-85公分之扶手或雙道扶手(高65公分及85公分)，除下列情形外該扶手應連續不得中斷。二平台(或樓板)間之高差在20公分以下者，得不設扶手；另樓梯之平台外側扶手得不連續。 |     |    |  |
|      |       | C12  | 規範0970701, 304.2 水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上。<br>規範0971219, 304.2 水平延伸：樓梯兩端扶手應水平延伸30公分以上，並作端部防勾撞處理，扶手水平延伸，不得突出於走道上；另中間連續扶手，於平台處得不需水平延伸。  |     |    |  |
|      | 警示設施  | C13  | <b>【規範0971219僅圖示修正】</b><br>305.1 終端警示：距梯級終端30公分處，應設置深度不得小於30公分，顏色且質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。  |     |    |  |

| 查核項目      | 編號            | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合  | 不符合 | 備註  |  |
|-----------|---------------|---|---|-----|---|--|
| 三、升降設備(一) | 範圍            | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802190號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用) |   |     |   |  |
|           |               | 401 適用範圍-無障礙垂直通路中使用之升降機，其出入平台及供行動不便者使用之相關設施應依本節規定設置。  |   |     |   |  |
|           | 一般規定          | D01   | 402 一般規定-無障礙升降機與群管理控制下之一般升降機之呼叫按鈕必須分別設置。  |     |   |  |
|           |               | D02   | 403.1 入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙升降機方向指引。   |     |   |  |
|           | 引導標誌          | D03   | 403.2 升降機引導：升降機設有點字之呼叫鈕前方30公分處之地板，應作30公分×60公分之不同材質處理。   |     |   |  |
|           |               | D04   | 403.3 主要入口樓層標誌：主要入口樓層之升降機應設置以下無障礙標誌。  |     |   |  |
|           |               | D05   | 403.3.1 突出牆壁：垂直牆面、突出式之無障礙標誌，其下緣應距地板面200-220公分，尺寸不得小於15公分。   |     |   |  |
|           |               | D06   | 403.3.2 平行牆面：平行固定於牆面之無障礙標誌，其下緣應距地板面90-150公分處，尺寸不得小於5公分。   |     |   |  |
|           |               | D07   | 404.1 輪椅迴轉空間：升降機出入口之樓地板應無高差，且坡度不得大於1/50，並留設不得小於直徑1.5公尺之淨空間。   |     |   |  |
|           |               | D08   | 404.2 升降機呼叫鈕：梯廳及門廳內的呼叫鈕之中心線高度應距樓地板面110公分，呼叫鈕左邊應設置點字。呼叫鈕最小的尺寸應為長寬各2公分以上；或直徑2公分以上。  |     |   |  |
|           | 升降機出入口平台(停靠處) | D09   | 【規範0971219(僅圖示修正)】<br>404.3 升降機入口的觸覺裝置：在升降機各樓乘場入口兩側之門框或牆柱上應裝設觸覺裝置及顯示樓層的數字、點字符號，單一浮凸字時，長寬各8公分以上。二個或二個以上浮凸字時，每一個浮凸字尺寸，應寬6公分、長8公分以上，標誌之中心點應位於樓地板面上方135公分，且標示之數字需與底板的顏色有明顯不同。 |     |   |  |
|           |               | D10   | 405.1 升降機門：升降機門應水平方向開啟，並為自動開關方式。如果門受到物體或人的阻礙時，升降機門應設有可自動停止並重新開啟的裝置，此裝置應透過感應到地板面15~25公分及50~75公分處之障礙物來啟動。   |     |   |  |
|           | 升降機門          | D11   | 405.2 關閉時間：梯廳升降機到達門開啟至關閉之時間，不應少於5秒鐘；若由升降機廂內按鈕開門，升降機門應維持完全開啟狀態至少5秒鐘。   |     |   |  |
| D12       |               | 405.3 升降機出入口：升降機出入口處之樓地板面，應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平間隙不得大於3.2公分。  |   |     |   |  |
| D13       |               |   |   |     | <input type="checkbox"/> 必須設置<br><input type="checkbox"/> 自由設置<br>位置<br>數量： |  |



| 查核項目       | 編號  | 作業程序及認定原則或替代改善說明   | 符合   | 不符合 | 備註 |  |
|------------|---|--|--|-----|----|--|
| 四、廁所盥洗室（一） | 範圍  | E01  | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802100號令修正之設計規範（097.07.01至097.12.18適用）<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第0970809360號令修正之設計規範（097.12.19至101.12.31適用） |     |    |  |
|            |   | E02  | 501 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙廁所盥洗室者，其設計應符合本章規定。  |     |    |  |
|            | 通則  | E03  | 502.1 位置：廁所盥洗室應設於無障礙通路可到達之處。   |     |    |  |
|            |   | E04  | 502.2 地面：廁所盥洗室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。   |     |    |  |
|            |   | E05  | 502.3 高差：由無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差，止水宜採用截水溝。  |     |    |  |
|            | 引導標誌  | E06  | 503.1 入口引導：無障礙廁所與一般廁所相同，應於適當處設置廁所位置指示，如無障礙廁所未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。  |     |    |  |
|            |   | E07  | 503.2 標誌：無障礙廁所前牆壁或門上應設置如圖902.1之無障礙標誌，如主要走道與廁所開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。  |     |    |  |
|            | 廁所  | E08  | 504.1 淨空間：廁所盥洗室空間內應設置迴轉空間，其直徑不得小於150公分。  |     |    |  |
|            |   | E09  | 規範0970701, 504.2 門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，門寬度不得小於90公分，且門把距門邊應保持6公分，靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。   |     |    |  |
|            |   | E10  | 規範0971219, 504.2 門：廁所盥洗室空間應採用橫向拉門，出入口之淨寬不得小於80公分，且門把距門邊應保持6公分，靠牆之一側並應於距門把3-5公分處設置門擋，以防止夾手；門扇得設於牆之內外側。  |     |    |  |
|            |   | E11  | 504.3 鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於90公分，或設置傾斜鏡面；鏡子的高度應在90公分以上。  |     |    |  |
| E12        |   | 504.4.1 求助鈴-位置：廁所盥洗室內應設置緊急求助鈴，其按鈕應設置兩處，一處在距離馬桶前緣往後15公分、馬桶座上60公分處，另一處在馬桶前緣往前35公分、高35公分處，且按鈕應明確標示。 |  |     |    |  |
| E13        | 504.4.2 求助鈴-連接裝置：按鈕應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至廁所盥洗室外部設置警示燈或聲響。 |  |  |     |    |  |

| 查核項目         | 編號         | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合 | 不符合 | 備註 |     |  |
|--------------|------------|---|----|-----|----|-----|--|
| <b>馬桶及扶手</b> | E12        | <p>□【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802190號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)</p> <p>□【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用)</p>  |    |     |    |     |  |
|              | E13        | 505.1 適用範圍：無障礙廁所設置馬桶及扶手，應符合本節規定。  |    |     |    |     |  |
|              | E14        | <p>【規範0971219僅圖示修正】</p> <p>505.2 淨空間：馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於75公分。</p> <p>規範0970701，505.3 高度：除醫療或療養機構有特殊需求外，應使用一般形式之馬桶，座位之高度為40-45公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背（水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性）。</p> <p>規範0971219，505.3 高度：除醫療或療養機構有特殊需求外，應使用一般形式之馬桶，座位之高度為40-45公分，馬桶不可有蓋，且應設置靠背，靠背距離馬桶前緣42-48公分（水箱作為靠背需考慮其平整及耐壓性），靠背與馬桶座位之淨距離為20公分。</p> |    |     |    |     |  |
|              | E15        | 505.4 沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10公分及馬桶座面上約40公分處。  |    |     |    |     |  |
|              | E16        | 505.5 側邊L型扶手：馬桶側面牆壁應裝置L型扶手，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直向之扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平向扶手上緣與馬桶座面距離為27公分。  |    |     |    |     |  |
|              | E17        | <p>規範0970701，505.6 可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度與馬桶前緣相等。</p> <p>規範0971219，505.6 可動扶手：馬桶至少有一側之扶手應為可動式（可為掀起式或水平移動式），使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手高度與對側之扶手高度相等，扶手長度不得小於馬桶前緣且突出部分不得大於15公分。</p>   |    |     |    |     |  |
|              | E18        | 506.1 位置：小便器如設置於一般廁所內，應設置於廁所入口便捷之處。   |    |     |    | 續前頁 |  |
|              | E19        | 506.2 無障礙空間：小便器前方不得有高差。   |    |     |    |     |  |
|              | E20        | 506.3 高度：小便器之突出端距地板面應為35-38公分。  |    |     |    |     |  |
|              | E21        | 506.4 沖水控制：沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合A102.3 及A102.4節手可觸及範圍之規定。   |    |     |    |     |  |
|              | E22        | A102.3.1 輪椅正向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者正向接近時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分。   |    |     |    |     |  |
|              | E23        | A102.3.2 輪椅正向接近可及範圍-桌檯較小：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出小於50公分，可及之最大高度為120公分。   |    |     |    |     |  |
|              | E24        | A102.3.3 輪椅正向接近可及範圍-桌檯較大：坐輪椅者正向接近時，如桌檯突出50-60公分，則其可及之最大高度為110公分。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。   |    |     |    |     |  |
|              | E25        | A102.4.1 側向接近可及範圍-可及範圍：坐輪椅者側向接近時，且中間無阻礙物時，可及之最大高度為120公分，最低高度為40公分。  |    |     |    |     |  |
|              | E26        | A102.4.2 側向接近可及範圍-桌檯較小：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度小於25公分，可及之最大高度為120公分。   |    |     |    |     |  |
|              | <b>小便器</b> |   |    |     |    |     |  |

四、廁所盥洗室（二）

| 查核項目       | 編號   | 作業程序及認定原則或替代改善說明   | 符合   | 不符合 | 備註 |  |
|------------|--|--|--|-----|----|--|
| 四、廁所盥洗室(三) | 小便器  | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802100號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第0970803860號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用) |  |     |    |  |
|            |  | A102.4.3 側向接近可及範圍-桌檯較大：坐輪椅者側向接近時，如桌檯深度為25-60公分時，可及之最大高度為115公分。如桌檯突出大於60公分，則無法觸及該牆面。  |  |     |    |  |
|            |  | 規範0970701，506.5 空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分。<br>規範0971219，506.5 空間：設置小便器之淨空間，不得小於便器中心線左右各50公分。   |  |     |    |  |
|            | 小便器  | 規範0970701，506.6 扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面85公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為60公分，長度為55公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為25公分。  |  |     |    |  |
|            |  | 規範0971219，506.6 扶手：小便器二側及前方應設置扶手，垂直牆面之上側扶手上緣距地板面85公分、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65-70公分；平行牆面之扶手上緣距地板面120公分；兩垂直牆面扶手之中心線距離為60公分，長度為55公分；兩側垂直地面之扶手距離牆壁之距離為25公分。  |  |     |    |  |
|            | 洗面盆  | E30  | 507.1 適用範圍：無障礙洗面盆或洗手槽，應符合本節規定。   |     |    |  |
|            |  | E31  | 507.2 無障礙空間：洗面盆前方不得有高差。  |     |    |  |
|            |  | E32  | 507.3 高度：洗面盆上緣距地板面不得大於85公分，且洗面盆下面距面盆邊緣20公分之範圍，由地板面量起65公分內應淨空，並符合A102.6 膝蓋及腳趾淨容納空間規定。                     |     |    |  |
|            |  | E33  | A102.6 膝蓋淨容納空間-當輪椅必須進入桌檯或洗面盆下部空間時，所需淨空間為距可靠近之邊緣20公分之範圍內，淨空間所需最小高度為65公分、距邊緣20至30公分處，淨空間之高度由65公分逐漸降低為25公分。 |     |    |  |
|            |  | E34  | 507.4 水龍頭：水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。   |     |    |  |
| E35        |  | 規範0970701，507.5 洗面盆深度：洗面盆邊緣距離操作水龍頭不得大於50公分，洗面盆儲水深度不得大於16公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。<br>規範0971219，507.5 洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口不得大於45公分，且洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。                  |  |     |    |  |
| E36        | 【規範0971219僅圖示修正】<br>507.6 扶手：洗面盆兩側及前方環繞洗臉盆設置扶手，扶手高於洗面盆邊緣1-3公分。 |  |  |     |    |  |

續前頁

| 查核項目 | 編號  | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合  | 不符合   | 備註 |  |  |
|------|-----|---|---|---|----|--|--|
| 五、浴室 | 範圍  | F01   | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內警字第0970802100號令修正之設計規範(097.07.01至097.12.18適用)<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內警字第097080360號令修正之設計規範(097.12.19至101.12.31適用) |   |    |  |  |
|      |     | F02   | 601 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙浴室者，其浴缸或淋浴間之設計應符合本章規定。   |   |    |  |  |
|      |     | 通則  | F03   | 602.1 位置：浴室應設於無障礙通路可到達之處。                   |    |  |  |
|      |     |   | F04   | 602.2 地面：浴室之地面應堅硬、平整、防滑，尤其應注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。 |    |  |  |
|      |     |   | F05   | 602.3 高差：由無障礙通路進入浴室不得有高差，止水宜採用截水溝。          |    |  |  |
|      | F06 |   | 602.4 求助鈴：一處距地板面高90-120公分處；另一處距地板面35-45公分，且按鈕應明確標示。   |   |    |  |  |
|      | 浴缸  | F07   | 603.1 適用範圍：無障礙浴缸應符合本節規定。  |   |    |  |  |
|      |     | F08   | 603.2 位置：浴缸前方之無障礙空間應涵蓋整個浴缸的長度，前方淨空間寬度不得小於浴缸寬度，深度為80公分以上。  |   |    |  |  |
|      |     | F09   | 603.3 浴缸：浴缸長度不得大於140公分；浴缸外側距地面高度45公分、底部應設置止滑片，且浴缸內兩側接近上緣處，應設置扶手。  |   |    |  |  |
|      |     | F10   | 603.4 扶手：側面牆壁應裝設一水平及垂直扶手；水平扶手上緣距浴缸底面75公分，與出水側牆壁的距離不得大於38公分；垂直部份之長度不得小於60公分，與浴缸靠背側之外緣距離約70公分；出水側及對向牆壁皆應設置L型扶手，該扶手水平上緣距浴缸底面75公分，垂直及水平部份之長度不得小於60公分，且垂直部分距浴缸外緣不得超過10公分。                                  |   |    |  |  |
|      |     | F11   | 604.1 適用範圍：設置移位式淋浴間或輪椅進入式淋浴間須符合本節規定。  |   |    |  |  |
|      | 淋浴間 | F12   | 604.2 座椅：應設寬45公分以上、深40公分、距地板面高度45公分之座椅(固定或活動式皆可)，座椅應防滑，若為平滑者，座椅前緣應略高於後緣(斜率約1/12)。   |   |    |  |  |
|      |     | F13   | 604.3.1 移位式淋浴間-定義：設有固定座椅，輪椅無法直接進入，使用者必須移位至座椅之淋浴間。   |   |    |  |  |
|      |     | F14   | 604.3.2 移位式淋浴間-尺寸：淋浴間長度及寬度皆不得小於90公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬90公分，長120公分。  |   |    |  |  |
|      |     | F15   | 604.3.3 移位式淋浴間-扶手：兩側牆壁應設置水平扶手，其入口對向牆壁之水平扶手長度不得小於45公分，扶手上緣距地板面75公分；入口之牆壁近外緣處2側及座椅靠牆側，皆應設置垂直扶手，其長度不得小於60公分。   |   |    |  |  |
|      |     | F16   | 604.3.4 移位式淋浴間-水龍頭位置：設於入口側面牆壁，牆面之中心線左右各38公分且距地板面80-120公分之區域。  |   |    |  |  |
|      |     | F17   | 604.4.1 輪椅進入式淋浴間-定義：設有活動座椅，可選擇乘坐洗澡用輪椅者直接進入，或移位至座檯之淋浴間。  |   |    |  |  |
|      |     | F18   | 【規範0971219僅圖示修正】<br>604.4.2 輪椅進入式淋浴間-尺寸：淋浴間長度不得小於150公分、寬度不得小於80公分，前方之無障礙淨空間不得小於寬80公分，長150公分。  |   |    |  |  |
|      |     | F19   | 604.4.3 輪椅進入式淋浴間-扶手：除入口側及設置座椅側外，另兩面牆壁皆需設置扶手，距地板面高度75公分，距牆角15公分內不得設置扶手且入口側邊座椅處應設置高度75公分之可動式扶手。   |   |    |  |  |
| F20  |     | 604.4.4 輪椅進入式淋浴間-水龍頭位置：設於入口對側牆壁，無座位者，可為距地板面80-120公分之區域；有座位者，其設置區域以距設座位之牆壁68公分之範圍為限。 |   |   |    |  |  |

| 查核項目     | 編號   | 作業程序及認定原則或替代改善說明  | 符合   | 不符合   | 備註      |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|----------|--|---|--|-------|---------|-------|---|----------|---|-----------|---|------------|---|---------|------------------|--|
| 六、輪椅觀眾席位 | G01  | <input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內警字第0970802190號令修正之設計規範（097.07.01至097.12.18適用）<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內警字第097080360號令修正之設計規範（097.12.19至101.12.31適用） |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | G02  | 701 適用範圍-設有固定座椅場所之輪椅觀眾席位應符合本節規定。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | G03  | 702.1 地面：輪椅觀眾席位的地面應堅硬平整、防滑，且坡度不得大於1/50。   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          |  | 702.2 數量：輪椅觀眾席位之數量不得小於表702.2規定。<br>表702.2 輪椅觀眾席位數量規定表   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>固定座椅數</th> <th>輪椅觀眾席位數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 以下</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>51 - 150</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>151 - 300</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>301 - 1000</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1001 以上</td> <td>4 + 每 1000 人增加一個</td> </tr> </tbody> </table> | 固定座椅數 | 輪椅觀眾席位數 | 50 以下 | 1 | 51 - 150 | 2 | 151 - 300 | 3 | 301 - 1000 | 4 | 1001 以上 | 4 + 每 1000 人增加一個 |  |
|          | 固定座椅數  | 輪椅觀眾席位數   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | 50 以下  | 1   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | 51 - 150   | 2   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | 151 - 300  | 3   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | 301 - 1000   | 4   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | 1001 以上  | 4 + 每 1000 人增加一個  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G04      | 703.1 寬度：單一輪椅觀眾席位寬度不得小於90公分；有多個輪椅觀眾席位時，每個空間寬度不得小於85公分。                   |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G05      | 703.2 深度：可由前方或後方進入之輪椅觀眾席位時，空間深度不得小於120公分，而輪椅觀眾席位僅可由側面進入者，則空間深度不得小於150公分。 |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G06      | 704.1 引導標誌：觀眾席位主要入口處及沿路轉彎處應設置輪椅席位之方向標示。                                  |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G07      | 704.2 位置：應設於鄰近避難逃生通道、易到達且有無障礙通路可到達之處，若有3個以上之輪椅觀眾席位並排時，應可由前後或左右兩側進入該席位。   |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G08      | 704.3 視線：輪椅觀眾席位的視線不得受阻礙應和其他區域相同。   |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G09      | 704.4 陪伴者之座椅：在輪椅觀眾席位鄰近至少應留有一個陪伴者座椅。                                      |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| G10      | 704.5 欄杆：座位前地面有高度差者應設置欄杆，欄杆高度75公分。                                       |   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
| 七、停車空間   | H01  | 801 適用範圍-建築物依規定應設置無障礙停車位者，應符合本章規定。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H02  | 802 通則-無障礙停車位應設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H03  | 803.1 入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H04  | 803.2 車位設立標誌：應於停車位旁設置具夜光效果之無障礙停車位標示，標誌尺寸應為40公分x40公分以上，下緣高度190-200公分。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H05  | 803.3 車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸不得小於90公分x90公分，停車格線之顏色應為藍色，下車區應為白色斜線，以利區別。   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H06  | 803.4 停車位地面：地面應堅硬、平整、防滑，表面不可使用鬆散性質的砂或石礫，高低差不得大於0.5公分，坡度不得大於1/50。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H07  | 804.1 單一停車位：汽車停車位長度不得小於600公分、寬度不得小於350公分，包括寬150公分的下車區。  |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H08  | 804.2 相鄰停車位：相鄰停車位得共用下車區，長度不得小於600公分、寬度不得小於550公分，包括寬150公分的下車區。   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |
|          | H09  | 805 機車停車位-機車位長度不得小於220公分，寬度不得小於225公分。   |  |       |         |       |   |          |   |           |   |            |   |         |                  |  |

| 查核項目    | 編號    | 作業程序及認定原則或替代改善說明   | 符合 | 不符合 | 備註 |
|---------|-------|--|----|-----|----|
| 八、無障礙標誌 | 901   | 適用範圍-無障礙標誌應依本章規定設置。<br><input type="checkbox"/> 【規範097.07.01】內政部097.04.10台內營字第0970802190號令修正之設計規範（097.07.01至097.12.18適用）<br><input type="checkbox"/> 【規範097.12.19】內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之設計規範（097.12.19至101.12.31適用） |    |     |    |
|         | 902.1 | 標誌：無障礙標誌應符合圖902.1規定之比例。  |    |     |    |
|         | 902.2 | 顏色：無障礙標誌之顏色應有明顯不同，且該標誌若設置於牆面上，該標誌之底色亦應與牆面顏色有明顯不同；得採用藍色底、白色圖案。<br>格子作為定位參考點，正式標誌應無格子  |    |     |    |
| 九、無障礙客房 | I03   | 內政部097.04.10台內營字第0970802190號令及內政部097.12.19台內營字第097080360號令修正之建築物無障礙設施設計規範，尚未有無障礙客房規定。  |    |     |    |

## 五、105-106 年度內政部營建署建築物無障礙生活環境業務督導小組名單

表 6.5 105-106 年度內政部營建署建築物無障礙生活環境業務督導小組名單

| 職稱    |    | 姓名  | 任職機關及職稱         | 備註       |
|-------|----|-----|-----------------|----------|
| 召集人   |    | 王榮進 | 內政部營建署副署長       |          |
| 共同召集人 |    | 王安強 | 內政部營建署主任秘書      |          |
|       |    | 高文婷 | 內政部營建署建管組組長     |          |
| 副召集人  |    | 蘇憲民 | 前內政部營建署副署長      |          |
|       |    | 黃仁鋼 | 前內政部營建署建管組副組長   |          |
|       |    | 林震富 | 前內政部營建署建管組科長    |          |
|       |    | 吳敏男 | 前內政部營建署建管組科長    |          |
|       |    | 樂中正 | 內政部營建署建管組副組長    |          |
| 1     | 委員 | 陳淑玲 | 陳淑玲建築師事務所主持人    | 專家學者     |
| 2     | 委員 | 劉金鐘 | 中華民國殘障聯盟常務理事    |          |
| 3     | 委員 | 金 桐 | 國立屏東科技大學社會工作系教授 |          |
| 4     | 委員 | 王武烈 | 王武烈建築師事務所主持人    |          |
| 5     | 委員 | 陳政雄 | 中原大學建築研究所兼任副教授  |          |
| 6     | 委員 | 林敏哲 | 中國科技大學室內設計系講師   |          |
| 7     | 委員 | 李訓良 | 李訓良建築師事務所主持人    |          |
| 8     | 委員 | 謝瑤馨 | 謝瑤馨建築師事務所主持人    |          |
| 9     | 委員 | 林俊福 | 台灣無障礙協會代表       | 身障福利團體代表 |
| 10    | 委員 | 蔡再相 | 中華視障聯盟          |          |
| 11    | 委員 | 鄭淑勻 | 台灣無障礙旅遊發展協會     |          |
| 12    | 委員 | 蔡崑茂 | 中華民國脊髓損傷者聯合會    |          |
| 13    | 委員 | 柯坤男 | 中華民國脊髓損傷者聯合會    |          |
| 14    | 委員 | 楊德明 | 中華民國脊髓損傷者聯合會    |          |
| 15    | 委員 | 張木藤 | 中華民國脊髓損傷者聯合會    |          |
| 16    | 委員 | 楊檔巖 | 楊檔巖建築師事務所       | 建築師公會代表  |

|    |    |     |           |         |
|----|----|-----|-----------|---------|
| 17 | 委員 | 吳建忠 | 吳建忠建築師事務所 | 建築師公會代表 |
| 18 | 委員 | 湯浣平 | 湯浣平建築師事務所 |         |
| 19 | 委員 | 陳大榮 | 陳大榮建築師事務所 |         |
| 20 | 委員 | 詹政達 | 詹政達建築師事務所 |         |
| 21 | 委員 | 梁仁勳 | 梁仁勳建築師事務所 |         |
| 22 | 委員 | 黃文彬 | 黃文彬建築師事務所 |         |
| 23 | 委員 | 郭鴻鑾 | 郭鴻鑾建築師事務所 |         |
| 24 | 委員 | 鄭介文 | 鄭介文建築師事務所 |         |
| 25 | 委員 | 陳奎宏 | 陳奎宏建築師事務所 |         |

## 六、實地現場考核行程表

表 6.6 實地現場考核行程表

| 日期     |     | 受督導單位(A組) | 受督導單位(B組) |
|--------|-----|-----------|-----------|
| 9月8日   | (四) | 新北市       | 新竹縣       |
| 9月9日   | (五) | 臺北市       |           |
| 9月10日  | (六) |           |           |
| 9月11日  | (日) |           |           |
| 9月12日  | (一) | 基隆市       | 嘉義縣       |
| 9月13日  | (二) | 屏東縣       | 臺東縣       |
| 9月20日  | (二) | 臺中市       | 宜蘭縣       |
| 9月21日  | (三) | 苗栗縣       | 花蓮縣       |
| 9月22日  | (四) |           | 新竹市       |
| 9月23日  | (五) |           | 嘉義市       |
| 9月24日  | (六) |           |           |
| 9月25日  | (日) |           |           |
| 9月26日  | (一) | 臺南市       | 雲林縣       |
| 10月3日  | (一) |           | 南投縣       |
| 10月4日  | (二) | 桃園市       |           |
| 10月5日  | (三) | 彰化縣       | 澎湖縣       |
| 10月6日  | (四) | 高雄市       |           |
| 10月24日 | (一) | 金門縣       |           |
| 11月1日  | (二) | 連江縣       |           |

## 七、無障礙生活環境業務考核會議議程

表 6.7 無障礙生活環境業務考核會議議程

| 項次 | 時間            | 內容                 | 使用時間  | 備註 |
|----|---------------|--------------------|-------|----|
| 1  | 10:00 至 11:00 | 實地現場考核<br>(第一件建築物) | 60 分鐘 |    |
| 2  | 11:00 至 12:00 | 實地現場考核<br>(騎樓整平路段) | 60 分鐘 |    |
| 3  | 12:00 至 13:00 | 於受督導單位<br>午膳休息     | 60 分鐘 |    |
| 4  | 13:00 至 14:00 | 實地現場考核<br>(第二件建築物) | 60 分鐘 |    |
| 5  | 14:00 至 15:00 | 實地現場考核<br>(第三件建築物) | 60 分鐘 |    |
| 6  | 15:00 至 16:00 | 實地現場考核<br>(第四件建築物) | 60 分鐘 |    |

**備註：**

- 一、實地現場考核分組、分梯次同時進行，每組由 3~5 位督導委員參與，如遇天候等不可抗力因素無法依原預定時間前往，時間再行調整通知。
- 二、實地現場考核勘檢前，受督導單位須備齊相關資料向督導小組做行程說明及勘檢案件之建築物概況及設施項目，以利實地現場考核進行。
- 三、受督導單位應於現場實地抽查時應備齊下列資料以供委員查核。
  - (一) 新建建築物：請受督導單位備齊選定地點之建造執照或使用執照（含無障礙全區配置圖及設施大樣圖及使用執照勘檢紀錄）
  - (二) 既有公共建築物：改善案件審查通過之書圖資料及勘檢紀錄。

## 八、改善及諮詢審查小組名冊範例

表 6.8 改善及諮詢審查小組名冊範例

| 政府                |    |        |        |          |
|-------------------|----|--------|--------|----------|
| 公共建築無障礙設備設施勸檢小組名冊 |    |        |        |          |
| 序號                | 姓名 | 單位名稱   | 符合資格   | 備註       |
| 1                 | 張三 | 小太陽基金會 | 第五點第一款 | 資格證明如附件1 |
| 2                 |    |        |        |          |
| 3                 |    |        |        |          |
| 4                 |    |        |        |          |
| 5                 |    |        |        |          |
| 6                 |    |        |        |          |
| 7                 |    |        |        |          |
| 8                 |    |        |        |          |
| 9                 |    |        |        |          |
| 10                |    |        |        |          |
| 11                |    |        |        |          |
| 12                |    |        |        |          |
| 13                |    |        |        |          |
| 14                |    |        |        |          |
| 15                |    |        |        |          |
| 16                |    |        |        |          |
| 17                |    |        |        |          |
| 18                |    |        |        |          |
| 19                |    |        |        |          |
| 20                |    |        |        |          |
| 21                |    |        |        |          |
| 22                |    |        |        |          |
| 23                |    |        |        |          |
| 24                |    |        |        |          |
| 25                |    |        |        |          |
| 26                |    |        |        |          |
| 27                |    |        |        |          |
| 28                |    |        |        |          |
| 29                |    |        |        |          |
| 30                |    |        |        |          |

## 九、建築物勘檢案件總清冊範例

表 6.9 建築物勘檢案件總清冊範例-新建

| 政府            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
|---------------|---------|--------------|-------|-------|-------|--------|----|--|--|
| 新建公共建築物勘檢案件清冊 |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 序號            | 公共建築物名稱 | 公共建築物類別代碼(細) | 鄉鎮別代碼 | 建築物地點 | 樓地板面積 | 使用執照字號 | 備註 |  |  |
| 1             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 2             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 3             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 4             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 5             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 6             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 7             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 8             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 9             |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 10            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 11            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 12            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 13            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 14            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 15            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 16            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 17            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 18            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 19            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 20            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 21            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 22            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 23            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 24            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 25            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 26            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 27            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 28            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 29            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |
| 30            |         |              |       |       |       |        |    |  |  |

表 6.10 建築物勘檢案件總清冊範例-既有

| 政府          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
|-------------|---------|--------------|-------|-------|-------|--------|-----------------|--------|------|--|
| 既有公共建築物結案清冊 |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 序號          | 公共建築物名稱 | 公共建築物類別代碼(細) | 鄉鎮別代碼 | 建築物地點 | 樓地板面積 | 使用執照字號 | 改善或替代改善計畫審核通過文號 | 改善完成日期 | 結案文號 |  |
| 1           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 2           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 3           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 4           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 5           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 6           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 7           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 8           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 9           |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 10          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 11          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 12          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 13          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 14          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 15          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 16          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 17          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 18          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 19          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 20          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 21          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 22          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 23          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 24          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 25          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 26          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 27          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 28          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 29          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |
| 30          |         |              |       |       |       |        |                 |        |      |  |

## 十、公共建築無障礙設備設施勘檢小組名冊範例

表 6.11 公共建築無障礙設備設施勘檢小組名冊範例

| 政府                |    |        |        |          |
|-------------------|----|--------|--------|----------|
| 公共建築無障礙設備設施勘檢小組名冊 |    |        |        |          |
| 序號                | 姓名 | 單位名稱   | 符合資格   | 備註       |
| 1                 | 張三 | 小太陽基金會 | 第五點第一款 | 資格證明如附件1 |
| 2                 |    |        |        |          |
| 3                 |    |        |        |          |
| 4                 |    |        |        |          |
| 5                 |    |        |        |          |
| 6                 |    |        |        |          |
| 7                 |    |        |        |          |
| 8                 |    |        |        |          |
| 9                 |    |        |        |          |
| 10                |    |        |        |          |
| 11                |    |        |        |          |
| 12                |    |        |        |          |
| 13                |    |        |        |          |
| 14                |    |        |        |          |
| 15                |    |        |        |          |
| 16                |    |        |        |          |
| 17                |    |        |        |          |
| 18                |    |        |        |          |
| 19                |    |        |        |          |
| 20                |    |        |        |          |
| 21                |    |        |        |          |
| 22                |    |        |        |          |
| 23                |    |        |        |          |
| 24                |    |        |        |          |
| 25                |    |        |        |          |
| 26                |    |        |        |          |
| 27                |    |        |        |          |
| 28                |    |        |        |          |
| 29                |    |        |        |          |
| 30                |    |        |        |          |

# 十一、分期分區改善計畫表範例

表 6.12 分期分區改善計畫表範例

| 政府                                   |     |  |        |                  |               |           |         |
|--------------------------------------|-----|--|--------|------------------|---------------|-----------|---------|
| 既有公共建築物分期分區改善計畫表                     |     |  |        |                  |               |           |         |
|                                      | 分類  | 項目   | 總列管案件數 | 應改善件數<br>(A=B+C) | 改善完成件數<br>(B) | 待改善件數 (C) | 分區及改善期限 |
| A<br>類<br>公<br>共<br>集<br>會<br>類      | A-1 | 1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。<br>2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。<br>3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。                            |        |                  |               |           |         |
|                                      | A-2 | 1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。<br>2. 候船室、水運客站。<br>3. 航空站、飛機場大廈。  |        |                  |               |           |         |
| B<br>類<br>商<br>業<br>類                | B-2 | 百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。   |        |                  |               |           |         |
|                                      | B-3 | 1. 飲酒店(無陪侍, 供應酒精飲料之餐飲服務場所, 包括啤酒屋)、小吃街等類似場所。<br>2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所, 包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)等類似場所。                        |        |                  |               |           |         |
|                                      | B-4 | 國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。  |        |                  |               |           |         |
| D<br>類<br>休<br>閒<br>、<br>文<br>教<br>類 | D-1 | 室內游泳池。   |        |                  |               |           |         |
|                                      | D-2 | 1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。<br>2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。<br>3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。 |        |                  |               |           |         |
|                                      | D-3 | 小學教室、教學大樓、相關教學場所。  |        |                  |               |           |         |
|                                      | D-4 | 國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。   |        |                  |               |           |         |
|                                      | D-5 | 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。  |        |                  |               |           |         |
| E<br>類<br>殯<br>葬<br>宗<br>教、          | E   | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。  |        |                  |               |           |         |

政府

既有公共建築物分期分區改善計畫表

|   |     |  |  |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| F<br>類<br>衛<br>生<br>、<br>福<br>利<br>、<br>更<br>生<br>類 | F-1 | 1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。         |  |  |  |  |  |
|   | F-2 | 1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。<br>2. 特殊教育學校。                             |  |  |  |  |  |
|   | F-3 | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。<br>2. 發展遲緩兒早期療育中心。                         |  |  |  |  |  |
| G<br>類<br>辦<br>公<br>、<br>服<br>務<br>類                | G-1 | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。                    |  |  |  |  |  |
|   | G-2 | 1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。<br>2. 政府機關(公務機關)。<br>3. 身心障礙者就業服務機構。                 |  |  |  |  |  |
|   | G-3 | 1. 衛生所。<br>2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。<br>3. 公共廁所。<br>4. 便利商店。                      |  |  |  |  |  |
| H<br>類<br>住<br>宿<br>類                               | H-1 | 1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。<br>2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。 |  |  |  |  |  |
|   | H-2 | 1. 六層以上之集合住宅。<br>2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。   |  |  |  |  |  |
| I<br>類<br>危<br>險<br>物                               | I   | 加油（氣）站。  |  |  |  |  |  |
| 合 計   |     |  |  |  |  |  |  |

說明：

1. 總列管案件數為建築物依法應設置無障礙設施及設備者，經主管機關清查列管。
2. 應改善件數為總列管案件數中，經現場勘查後認定應改善者。
3. 改善完成件數為應改善件數中，建築物業主已改善且報主管機關同意核備者。
4. 待改善件數為應改善件數中，建築物未改善完成，主關機關仍列管者。

## 十二、無障礙設備與設施改善基金管理委員會名冊範例

表 6.13 無障礙設備與設施改善基金管理委員會名冊範例

| 政府                     |    |        |        |         |
|------------------------|----|--------|--------|---------|
| 建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會名冊 |    |        |        |         |
| 序號                     | 職稱 | 姓名     | 單位名稱   | 備註      |
| 1                      | 張三 | 小太陽基金會 | 第五點第一款 | 身心礙團體代表 |
| 2                      |    |        |        |         |
| 3                      |    |        |        |         |
| 4                      |    |        |        |         |
| 5                      |    |        |        |         |
| 6                      |    |        |        |         |
| 7                      |    |        |        |         |
| 8                      |    |        |        |         |
| 9                      |    |        |        |         |
| 10                     |    |        |        |         |
| 11                     |    |        |        |         |
| 12                     |    |        |        |         |
| 13                     |    |        |        |         |
| 14                     |    |        |        |         |
| 15                     |    |        |        |         |
| 16                     |    |        |        |         |
| 17                     |    |        |        |         |
| 18                     |    |        |        |         |
| 19                     |    |        |        |         |
| 20                     |    |        |        |         |
| 21                     |    |        |        |         |
| 22                     |    |        |        |         |
| 23                     |    |        |        |         |
| 24                     |    |        |        |         |
| 25                     |    |        |        |         |
| 26                     |    |        |        |         |
| 27                     |    |        |        |         |
| 28                     |    |        |        |         |
| 29                     |    |        |        |         |
| 30                     |    |        |        |         |

### 十三、推動公共建築物無障礙生活環境相關法規

#### (一) 身心障礙者權益保障法 (摘錄部分條文) (民國 103 年 06 月 04 日修正)

第 1 條 為維護身心障礙者之權益，保障其平等參與社會、政治、經濟、文化等之機會，促進其自立及發展，特制定本法。

第 2 條 本法所稱主管機關：在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。（※102.07.19 行政院院臺規字第 1020141353 號公告第 2 條第 1 項所列屬「內政部」之權責事項，自 102 年 7 月 23 日起改由「衛生福利部」管轄）

本法所定事項，涉及各目的事業主管機關職掌者，由各目的事業主管機關辦理。

前二項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

一、主管機關：身心障礙者人格維護、經濟安全、照顧支持與獨立生活機會等相關權益之規劃、推動及監督等事項。

五、建設、工務、住宅主管機關：身心障礙者住宅、公共建築物、公共設施之總體規劃與無障礙生活環境等相關權益之規劃、推動及監督等事項。

第 16 條 身心障礙者之人格及合法權益，應受尊重及保障，對其接受教育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益，不得有歧視之對待。

公共設施場所營運者，不得使身心障礙者無法公平使用設施、設備或享有權利。

公、私立機關（構）、團體、學校與企業公開辦理各類考試，應依身心障礙應考人個別障礙需求，在考試公平原則下，提供多元化適性協助，以保障身心障礙者公平應考機會。

第 54 條 市區道路、人行道及市區道路兩旁建築物之騎樓，應符合中央目的事業主管機關所規定之無障礙相關法規。

第 55 條 有關道路無障礙之標誌、標線、號誌及識別頻率等，由中央目的事業主管機關定之。

直轄市、縣（市）政府應依前項規定之識別頻率，推動視覺功能障礙語音號誌及語音定位。

第 57 條 新建公共建築物及活動場所，應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之設施及設備。未符合規定者，不得核發建築執照或對外開放使用。

前項無障礙設備及設施之設置規定，由中央目的事業主管機關於其相關法令定之。

公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合前項規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善。但因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，得由所有權人或管理機關負責人提具替代改善計畫，申報各級目的事業主管機關核定，並核定改善期限。

第 88 條 違反第五十七條第三項規定未改善或未提具替代改善計畫或未依核定改善計畫之期限改善完成者，各級目的事業主管機關除得勒令停止其使用外，處其所有權人或管理機關負責人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善；屆期未改善者，得按次處罰至其改善完成為止；必要時，得停止供水、供電或封閉、強制拆除。

前項罰鍰收入應成立基金，供作改善及推動無障礙設備與設施經費使用；基金之收支、保管及運用辦法，由中央目的事業主管機關定之。

## (二) 公共建築物無障礙設施勘檢作業原則

(民國 101 年 01 月 10 日修正)

- 一、為落實各直轄市、縣(市)政府及特設主管建築機關辦理公共建築物無障礙設施勘檢作業(以下簡稱勘檢作業),特訂定本原則。
- 二、本原則適用範圍如下:
  - (一)申請新建及增建使用執照之公共建築物。
  - (二)申請變更使用執照提具替代改善計畫之公共建築物。
  - (三)依身心障礙者權益保障法第五十七條第三項規定辦理無障礙設施替代改善計畫之公共建築物。
- 三、第二點適用範圍之公共建築物應由勘檢小組辦理勘檢。但第二點第二款及第三款之公共建築物得經公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組同意後,由當地主管建築機關派員辦理勘檢。
- 四、勘檢小組應由當地主管建築機關相關人員、身心障礙福利團體及建築師公會代表共同組成,每次實地勘檢應包含上述各類人員,勘檢小組應於當地主管建築機關指定時間內,提出勘檢報告。
- 五、勘檢人員應具備下列資格之一:
  - (一)取得內政部營建署於中華民國九十七年七月一日以後委託辦理之公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓講習結業證書。
  - (二)曾擔任內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務督導小組委員連續三年以上。
  - (三)曾擔任各直轄市、縣(市)政府及特設主管機關勘檢小組委員連續三年以上。
- 六、當地主管建築機關應對聘任之勘檢人員,辦理至少三個小時之勘檢實務講習,其講習內容如下:
  - (一)勘檢注意事項(含勘檢實例錯誤樣態說明)。
  - (二)勘檢程序。
  - (三)勘檢任務。
  - (四)其他相關事項。
- 七、勘檢作業所須相關費用,當地主管建築機關依規定編列預算支應。

### (三) 既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則

(民國 101 年 11 月 16 日修正)

原名稱「已領得建築執照之公共建築物無障礙設備與設施提具替代改善計畫作業程序及認定原則」修正全文，自中華民國 102 年 1 月 1 日生效。

- 一、為使各級目的事業主管機關辦理未符無障礙設備及設施設置規定之建築物改善及核定事項有所遵循，俾符身心障礙者權益保障法第五十七條第三項規定，特訂定本原則。
- 二、適用之建築物：指建築技術規則（以下簡稱本規則）建築設計施工編第一百七十條所定既有公共建築物且於本規則中華民國九十七年七月一日修正施行前取得建造執照而未符合其規定者；其改善項目之優先次序，由當地主管建築機關定之。
- 三、公共建築物因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，其替代改善計畫，依下列規定辦理：
  - (一) 公共建築物已依中華民國八十五年十一月二十七日修正施行之本規則建築設計施工編第十章規定設置或核定之替代改善計畫改善者，視同具替代性功能。
  - (二) 公共建築物未改善者，得依第十點規定改善之，視同具替代性功能。前項建築物經當地主管建築機關認定應改善者，應辦理改善。
- 四、中華民國九十七年七月一日本規則修正施行前已領得建造執照，於施工中尚未領得使用執照之建築物，在程序未終結前，仍得適用原建造執照申請時之本規則規定。
- 五、第二點建築物之改善，應由當地主管建築機關依轄區實際需求訂定分類、分期、分區執行計畫及期限公告之，建築物所有權人或管理機關負責人，應依第二點之改善項目及內容依限改善並報當地主管建築機關備查。無法依第三點第一項第二款規定改善者，得由建築物所有權人或管理機關負責人依第十一點規定提具替代改善計畫，報經當地主管建築機關審核認可後，依其計畫改善內容及時程辦理。前項由建築物所有權人或管理機關負責人提具之替代改善計畫，應包括不符規定之項目、原因及替代改善措施與現行規定功能檢討、比較、分析。
- 六、當地主管建築機關應由相關主管單位、建築師公會、各障礙類別之身心障礙團體並邀請有關之專家學者組設公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組，辦理下列事項：
  - (一) 分類、分期、分區改善執行計畫及期限之擬定。
  - (二) 各類建築物行動不便者使用設施項目優先改善次序之擬定。
  - (三) 公共建築物替代改善計畫之諮詢及指導。
  - (四) 公共建築物可否提具替代改善計畫之認定及替代改善計畫之審核。
- 七、公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組應具備下列資格之一：
  - (一) 取得內政部營建署於中華民國九十七年七月一日以後委託辦理之公共建築物設置身心障礙者行動與使用之設施及設備勘檢人員培訓講習結業證書。
  - (二) 曾擔任內政部營建署公共建築物無障礙生活環境業務督導小組委員連續三年以上。
  - (三) 曾擔任各直轄市、縣（市）政府及特設主管建築機關勘檢小組委員連續三年以上。
  - (四) 相關專業領域之專家學者。
- 八、公共建築物依本原則規定改善增設之坡道或昇降機者，得依下列規定辦理：
  - (一) 不計入建築面積各層樓地板面積。但單獨增設之昇降機間及乘場面積合計不得超過二十平方公尺。

(二) 不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。

(三) 不受建築物高度限制。但坡道設有頂蓋其高度不得超過原有建築物高度加三公尺，昇降機間高度不得超過原有建築物加六公尺。

九、既有公共建築物改善無障礙設施之種類如下表：

| 建築物使用組 |                                     | 無障礙設施種類 |   |          |        |       |        |    |      |       |    |        |      |       |   |
|--------|-------------------------------------|---------|---|----------|--------|-------|--------|----|------|-------|----|--------|------|-------|---|
|        |                                     | 公共建築物   | 室外通路  | 避難層坡道及扶手 | 避難層出入口 | 室內出入口 | 室內通路走廊 | 樓梯 | 昇降設備 | 廁所盥洗室 | 浴室 | 輪椅觀眾席位 | 停車空間 | 無障礙客房 |   |
| A類     | 公共集會類                               | A-1     | 1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。<br>2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。  | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  | √      | √    |       |   |
|        |                                     |         | 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。   | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  | √      | √    | √     |   |
|        |                                     | A-2     | 1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。<br>2. 候船室、水運客站。<br>3. 航空站、飛機場大廈。   | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  |        |      | √     |   |
| B類     | 商業類                                 | B-2     | 百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。  | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  |        |      | √     |   |
|        |                                     | B-3     | 1. 飲酒店(無陪侍, 供應酒精飲料之餐飲服務場所, 包括啤酒屋)、小吃街等類似場所。<br>2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所, 包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)等類似場所。 | √        | √      | √     | √      | √  |      | ○     | √  |        |      |       |   |
|        |                                     | B-4     | 國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。   | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  | √      |      | √     | √ |
| D類     | 休閒、文教類                              | D-1     | 室內游泳池。  | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  | √      | √    | √     |   |
|        |                                     | D-2     | 1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。   | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  |        |      | √     |   |
|        |                                     |         | 2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。   | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  |        |      | √     |   |
|        |                                     |         | 3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。  | √        | √      | √     | √      | √  | ○    | √     | √  | √      | √    | √     |   |
|        |                                     | D-3     | 小學教室、教學大樓、相關教學場所。   | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  |        | √    | √     |   |
|        |                                     | D-4     | 國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。  | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  |        | √    | √     |   |
| D-5    | 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。 | √       | √   | √        | √      | ○     | ○      | √  | ○    |       |    | ○      |      |       |   |

|    |           |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-----------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E類 | 宗教、殯葬類    | E   | 1.樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。<br>2.樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。                      | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
| F類 | 衛生、福利、更生類 | F-1 | 1.設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。<br>2.樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|    |           | F-2 | 1.身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |
|    |           |     | 2.特殊教育學校。  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| G類 | 辦公、服務類    | G-1 | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。                  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|    |           | G-2 | 1.郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。<br>2.政府機關(公務機關)。<br>3.身心障礙者就業服務機構。                  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |
|    |           | G-3 | 1.衛生所。<br>2.設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|    |           |     | 公共廁所。  | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|    |           |     | 便利商店。  | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H類 | 住宿類       | H-1 | 1.樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。<br>2.老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|    |           | H-2 | 1.六層以上之集合住宅。   | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |
|    |           |     | 2.五層以下且五十戶以上之集合住宅。   | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| I類 | 危險物品類     | I   | 加油(氣)站。  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ○ |   |   |

說明：

一、「√」指每一建造執照每幢至少必須設置一處，但國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館其客房數五十間以上一百間以下者，應至少設置一間無障礙客房，超過一百間以上者，超過部分每增加一百間及其餘數，應再增加一間無障礙客房；多幢建築物停車空間依法集中留設者，其無障礙設施之停車位數得依其幢數集中設置之。

二、「○」指申請人視實際需要自由設置。

三、六層以上之集合住宅以複層式設計者，其同一單元之昇降設備，得選擇通達複層之任一層。

四、「室內通路走廊」指連接各室內無障礙設施之通路走廊。

十、公共建築物設置無障礙設施確有困難者，得依下列改善原則辦理。但改善原則未明列者，仍應依建築物無障礙設施設計規範辦理改善：

(一) 避難層出入口：

1. 出入口平臺淨寬與出入口同寬，淨深不得小於一百二十公分。

2. 出入口緊鄰騎樓，平臺坡度不得大於四十分之一。

(二) 避難層坡道及扶手：

1. 避難層坡道及扶手應具連續性。

2. 坡道淨寬不得小於九十公分。

3. 無障礙通路高差在零點五公分至三公分者，應作二分之一之斜角處理。

4. 無障礙通路高差在三公分以上者，應設坡道：

(1) 扶手：坡道兩端平臺高低差大於二十公分者應設置扶手。但坡道為路緣坡道，設置扶手會影響直行通路者，無須設置扶手。

(2) 防護：坡道兩端平臺高低差大於二十公分者，未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。

(3) 中間平臺：坡道兩端高差大於七十五公分者，因空間受限，且坡道兩端高差不大於一百二十公分及坡度小於十二分之一者，得不受坡道中間增設平臺之限制。

(4) 坡度：坡道因空間受限，坡度得依下表設置，並標示需由人員協助上下坡道之標誌，且應視需要設置服務鈴。

|             |           |      |           |           |      |      |      |      |
|-------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 高低差<br>(公分) | 七十五以<br>下 | 五十以下 | 三十五以<br>下 | 二十五以<br>下 | 二十以下 | 十二以下 | 八以下  | 六以下  |
| 坡度          | 十分之一      | 九分之一 | 八分之一      | 七分之一      | 六分之一 | 五分之一 | 四分之一 | 三分之一 |

(三) 樓梯：

1. 扶手：兩端平臺高差在二十公分以上者，如設置扶手將影響通路順暢者，不須設置。

2. 防護緣：兩端平臺高差在二十公分以上者，未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。

3. 警示帶：梯階前三十公分處應設置與樓梯同寬且深度不小於三十公分，顏色、地與地面不同之警示設施。

4. 樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達一百九十公分部分應設防護設施，可使用格柵、花臺或任何可提醒視障者之設施。

5. 無須改善情況：

(1) 既有扶手圓形直徑或其他形狀外緣周邊與建築物無障礙設施設計規範不符者。

(2) 因空間受限，扶手水平延伸三十公分會突出走道者。

(3) 連續樓梯往上之梯級須退一步等無須改善。但內側扶手轉彎處仍須順平。

(4) 梯階之級高、級深及平臺中間設有梯階等結構體相關者。

(四) 昇降設備：

1. 機廂尺寸：入口不得小於八十公分，機廂深度不得小於一百十公分。

2. 引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方三十公分處之地板，應作三十公分乘以六十公分之不同材質處理。

3. 點字：呼叫鈕及直式操作盤，按鍵左邊應設置點字。

4. 語音：機廂應設置語音設備。

5. 標示：昇降機外部應設置無障礙標誌。現存無障礙標誌與建築物無障礙設施設計規範未完全相同者，無須改善。但採用「殘障電梯」或其他不當用詞者，應予改善。

6. 無須改善情況：

(1) 昇降機廂內扶手。

(2)免設升降機入口之觸覺裝置。

(3)已設置輪椅乘坐者操作盤時。

(五)廁所盥洗室：

- 1.無障礙通路：至少應有一條無障礙通路可通達廁所盥洗室，寬度至少為九十公分，且應考慮開門之操作空間。
- 2.門扇：裝設橫拉門有困難時可用折疊門。但不得使用凹入式門把或圓型喇叭鎖，且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。
- 3.扶手：馬桶兩側得採用可動式扶手，沖水控制無須改善，且須考量可操作空間。
- 4.鏡子：鏡面底端與地板面距離大於九十公分者，可設置傾斜鏡面。
- 5.下列設施應改善：上下方向反裝之L型扶手、馬桶兩側扶手高度不同、馬桶兩側扶手中心線距馬桶中心線之距離未介於三十三公分至三十七公分者。
- 6.迴轉空間：至少有直徑一百二十公分以上，其中邊緣十五公分範圍內，淨高六十五公分以上。

(六)停車空間：

- 1.尺寸：缺乏下車空間者，可以停車位旁之通道作為臨時下車區使用，得不另劃設下車空區。
  - 2.無須改善：停車格線與地面顏色有明顯對比色者，無須改善。
- 十一、公共建築物無障礙設施無法依第十點規定改善者，得依下列替代原則或其他替代方案提具替代改善計畫，並依第五點規定辦理：

(一)避難層坡道及扶手：建築物避難層主要出入口高低差障礙，受限於建築結構無法退縮且因緊鄰騎樓或人行道，無法設置坡道之空間者，得採以下作法：

- 1.坡道設於其他入口處：於建築物其他避難層入口處設置坡道，且須於主要入口及沿路轉彎處設置引導標示。
- 2.坡度：坡道之高低差在七十五公分以下，設置坡道坡度比大於第十點坡度表規定者，須設置服務鈴，並標示須由服務人員協助上下坡道。
- 3.高低差不超過三十二公分：建築物設有服務人員者，可使用活動式斜坡版（坡度不得大於六分之一），並於入口處設服務鈴，由服務人員提供協助。
- 4.高低差三十二公分至一百五十公分：設置輪椅升降臺確有困難者，得採用樓梯附掛式輪椅升降臺，並設置服務鈴，由服務人員提供協助。
- 5.高低差一百五十公分以上：設置升降機確有困難者，設置服務鈴，由服務人員提供協助。

(二)升降設備：

- 1.已設置升降設備，機廂入口未達八十公分或機廂深度未達一百十公分，得以可收放式輪椅及機廂內設置活動座椅替代。
- 2.受限於建築基地及結構無法設置升降設備者，得採用專人服務，並設置服務鈴。

(三)廁所盥洗室：

- 1.受限於建築基地及結構無法改善者，得以人員引導至距離出入口五十公尺範圍內同側街廓之無障礙廁所盥洗室替代。
- 2.受限於建築基地及結構無法改善者，得以現有廁所盥洗室替代之，且經人員協助可供乘坐輪椅者使用。
- 3.加油（氣）站受限於建築基地、結構或地下設備管線，設置廁所盥洗室確有實際困難者，得採用流動式無障礙廁所盥洗室。

(四)停車空間：受限於建築基地及結構無法改善者，得以建築物出入口距離五十公尺範圍內同側街廓有身心障礙者專用停車位，並於出入口標示該專用停車位位置替代。

#### (四) 建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法

(民國 97 年 05 月 01 日修正)

- 第 1 條 本辦法依身心障礙者權益保障法（以下簡稱本法）第八十八條第二項規定訂定之。
- 第 2 條 建築物無障礙設備與設施改善基金（以下簡稱本基金）之管理及運用，除法令另有規定外，依本辦法之規定。
- 第 3 條 本基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，並以直轄市、縣（市）政府為主管機關。
- 第 4 條 本基金之來源如下：  
一、依本法第八十八條第一項所處之罰鍰收入。  
二、本基金之孳息收入。  
三、其他收入。
- 第 5 條 本基金之用途如下：  
一、辦理建築物無障礙設備與設施改善之費用。  
二、推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及相關獎勵之費用。  
三、推動建築物無障礙設備與設施之研究發展費用。  
四、本基金之管理及行政費用。  
五、其他建築物無障礙設備與設施之相關費用。
- 第 6 條 本基金應於公庫開立專戶存管。
- 第 7 條 為管理及運用本基金，主管機關應設建築物無障礙設備與設施改善基金管理委員會（以下簡稱本會），置主任委員一人，由主管機關首長或由其指定相關主管兼任之，委員十二人至十四人，由主管機關就機關內及其他有關機關、身心障礙團體代表、專家學者聘兼之。
- 第 8 條 本會置執行秘書一人，由主任委員指派業務主辦單位人員兼任，承主任委員之命綜理會務。幹事若干人，由主管機關就相關單位現職人員派兼之。
- 第 9 條 本會之任務如下：  
一、本基金運用計畫之審議事項。  
二、本基金之管理及預算、決算之審議事項。  
三、本基金運用執行情形考核事項。  
四、其他有關事項。
- 第 10 條 本會每三個月開會一次，必要時得召開臨時會議，由主任委員召集之，並得邀請有關人士列席。主任委員因事不能出席，由主任委員指定委員一人代理。
- 第 11 條 本會委員及派兼人員均為無給職。但得依規定支給兼職交通費。
- 第 12 條 本基金有關預算編製、執行及決算編報，應依預算法、會計法、決算法、審計法及相關法令規定辦理。
- 第 13 條 本基金會計事務之處理，應依規定訂定會計制度。
- 第 14 條 本基金結束時，應予結算，其餘存權益應解繳公庫。
- 第 15 條 本辦法自發布日施行。

(五) 建築技術規則 建築設計施工篇 第十章公共建築物行動不便者使用設施 (民國 94 年 01 月 21 日修正)

第 167 條 為便利行動不便者進出及使用，公共建築物應依本章規定設置各項無障礙設施。

第 168 條 公共建築物內設有供行動不便者使用之設施者，應於明顯處所設置行動不便者使用設施之標誌。圖示如左：



前項標誌應與國際符號標誌同。

第 169 條 本章用語定義如左：

- 一、引導設施：指為引導行動不便者進出建築物設置之延續性設施，以引導其行進方向或協助其界定通路位置或注意前行路況。
- 二、室外引導通路：指建築物出入口至道路建築線間設有引導設施之通路；該通路寬度不得小於一·三公尺。

第 170 條 公共建築物設置供行動不便者使用設施，其種類及適用範圍如下表：

| 建築物  |                           | 供行動不便者使用設施 |       |        |       |        |    |      |       |    |     |
|------|---------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|----|------|-------|----|-----|
|      |                           | 室外引導通路     | 坡道及扶手 | 避難層出入口 | 室內出入口 | 室內通路走廊 | 樓梯 | 昇降設備 | 廁所盥洗室 | 浴室 | 觀眾席 |
| (一)  | 社會福利機構                    | √          | √     | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | ○  | ○   |
| (二)  | 醫院                        | √          | √     | √      | √     | √      | √  | √    | √     |    | ○   |
| (三)  | 政府機關                      | √          | √     | √      | √     | √      | √  | √    |       |    | √   |
| (四)  | 鐵路車站、客運車站航空站、水運客站         | √          | √     | √      | √     | √      | √  | √    |       |    | ○   |
| (五)  | 圖書館、美術館、博物館               | √          | √     | √      | √     | ○      | √  | √    |       |    | ○   |
| (六)  | 集會場、活動中心                  | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | √    |       |    | ○   |
| (七)  | 寺院、宮廟、教會、殯儀館              | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | √    |       |    | ○   |
| (八)  | 展覽館(場)                    | √          | √     | √      | √     | ○      | √  | ○    |       |    | ○   |
| (九)  | 公共廁所                      | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | √    |       |    |     |
| (十)  | 體育館(場)、游泳池                | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | ○    | √     | ○  | ○   |
| (十一) | 戲院、電影院、歌廳、演藝場             | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | ○    | √     | ○  | ○   |
| (十二) | 國際觀光飯店                    | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | ○    | √     | √  |     |
| (十三) | 郵局、電信局、銀行、合作社、市場、百貨商場(公司) | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | ○    | √     |    | ○   |
| (十四) | 衛生所                       | √          | √     | √      | √     | ○      | ○  | √    |       |    | ○   |
| (十五) | 集合住宅                      | ○          | √     | √      | ○     | ○      | ○  | ○    |       |    |     |
| (十六) | 學校                        | √          | √     | √      | √     | ○      | √  | ○    | √     |    | ○   |

說明：「√」指至少必須設置一處。  
「○」指由申請人視實際需要自由設置。

第 171 條 供行動不便者使用之坡道，其坡度不得超過一比十二。供行動不便者使用之內外通路、走廊有高低差時，亦同。

前項坡道、通路、走廊之高低差未達七十五公分者，其坡度不得超過下表之規定。

|     |       |       |       |       |       |       |      |      |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 高低差 | 75 以下 | 50 以下 | 35 以下 | 25 以下 | 20 以下 | 12 以下 | 8 以下 | 6 以下 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|


|      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (公分) |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 坡度   | 1/10 | 1/9 | 1/8 | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/3 |

第 172 條 供行動不便者使用之避難層出入口、室內出入口、剪（收）票口，其淨寬度不得小於八十公分，且地面應順平，以利輪椅通行。


前項避難層及室內出入口應裝設聽視覺警示設備。

第 173 條 供行動不便者使用之樓梯依下列規定：


- 一、不得使用旋轉梯，梯級踏面不得突出，且應加設防滑條，梯級斜面不得大於二公分，梯級之終端三十公分處應配合設置引導設施。圖式如下：



- 二、梯緣未臨接牆壁部分，應設置高出梯級踏面五公分防護緣；樓梯底版至其直下方樓板淨高未達一·九公尺部分應加設防護柵。圖式如下：



- 三、樓梯兩側應裝設扶手，扶手應連續不得中斷。設於壁面之扶手，應與壁面保留至少五公分之間隔。圖式如下：

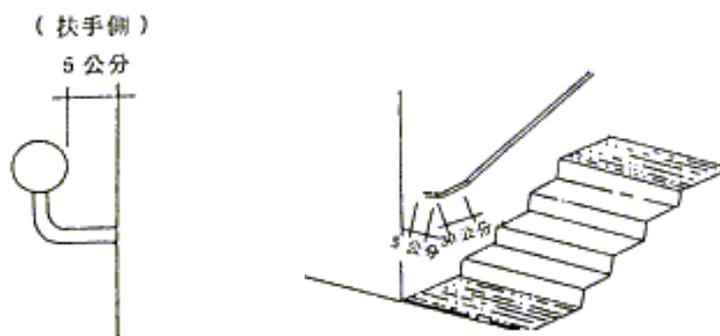

第 174 條 供行動不便者使用之升降機，應裝設點字、語音系統及供其使用之操作盤，其出入口淨寬度不得小於八十公分。升降機出入口前方六十公分處之地板面應設置引導設施，且應留設直徑一·五公尺以上之輪椅迴轉空間。


第 174 條 供行動不便者使用之廁所及浴室，所設置之門應可使行動不便者自由進出及使用，內部並應設置固定扶手或迴轉扶手，地面應使用防滑材料。

第 175 條 供行動不便者單獨使用之廁所，其深度及寬度均不得小於二公尺；附

設於一般廁所內者，其淨寬度不得小於一·五公尺，淨深度不得小於一·六公尺。

第 176 條 供行動不便者使用之輪椅觀眾席位，應寬度在一公尺以上，深度在一·四公尺以上，地板面應保持順平，並加設扶手。

第 177 條 供行動不便者使用之停車位應設於便捷處所，其寬度應在三·三公尺以上，並在明顯處標示行動不便者停車位標誌。圖示如左：

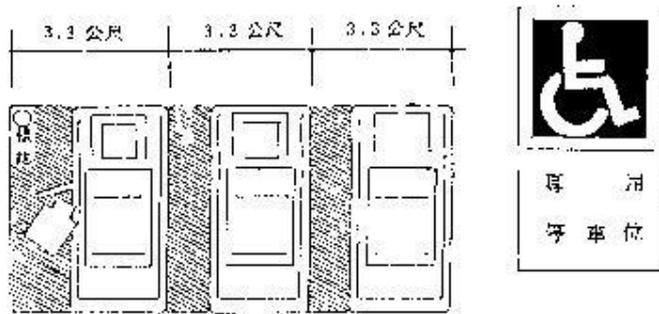

第 177-1 條 中華民國 85 年 11 月 27 日本章修正發布施行前取得建造執照之建築物，其行動不便者使用設施之改善辦法，由中央主管建築機關定之。

## (六) 建築技術規則 建築設計施工篇 第十章公共建築物行動不便者使用設施 97 年修正條文

(中華民國 97 年 3 月 13 日內政部台內營字第 0970801030 號令修正發布 167、170 條條文；

刪除第 168、169、171~177-1 條條文；並自九十七年七月一日施行)

第 167 條 為便利行動不便者進出及使用，公共建築物應依本章規定設置各項無障礙設施。

建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。

第 168 條 (刪除)

第 169 條 (刪除)

第 170 條 公共建築物設置供行動不便者使用設施，其種類及適用範圍如下表：

| 建築物使用類組 |                                      | 供行動不便者使用設施 |   |        |       |        |    |      |       |    |        |      |   |   |
|---------|--------------------------------------|------------|---|--------|-------|--------|----|------|-------|----|--------|------|---|---|
|         |                                      | 室外通路       | 避難層坡道及扶手  | 避難層出入口 | 室內出入口 | 室內通路走廊 | 樓梯 | 昇降設備 | 廁所盥洗室 | 浴室 | 輪椅觀眾席位 | 停車空間 |   |   |
|         |                                      | 建築物之適用範圍   |   |        |       |        |    |      |       |    |        |      |   |   |
| A 類     | 公共集會類                                | A-1        | 1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。                                    | √      | √     | √      | √  | √    | ○     | √  | √      |      | √ | √ |
|         |                                      |            | 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。      | √      | √     | √      | √  | √    | ○     | √  | √      | √    | √ | √ |
|         |                                      | A-2        | 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。                           | √      | √     | √      | √  | √    | ○     | √  | √      | √    | √ | √ |
| B 類     | 商業類                                  | B-2        | 1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。<br>2. 候船室、水運客站。<br>3. 航空站、飛機場大廈。         | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  | √      | √    |   | √ |
|         |                                      | B-4        | 百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。<br>國際觀光旅館(飯店)。 | √      | √     | √      | √  | √    | ○     | √  | √      | √    | √ | √ |
| D 類     | 休閒、文教類                               | D-1        | 室內游泳池。  | √      | √     | √      | √  | √    | ○     | √  | √      | √    | √ | √ |
|         |                                      | D-2        | 1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。       | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  | √      | √    |   | √ |
|         |                                      |            | 2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。       | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  | √      | √    |   | √ |
|         |                                      |            | 3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。                            | √      | √     | √      | √  | √    | ○     | √  | √      | √    | √ | √ |
|         |                                      | D-3        | 小學教室、教學大樓、相關教學場所。   | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  | √      | √    | √ | √ |
| D-4     | 國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。 | √          | √   | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  | √      | √    | √ |   |

|  |           |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-----------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |           | D-5 | 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習（訓練）班、課後托育中心。  | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ |   |   | ○ |   |
| E 類  | 宗教、殯葬類    | E   | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺（寺院）、廟（廟宇）、教堂。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。                      | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ |   |
| F 類  | 衛生、福利、更生類 | F-1 | 1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ |   |
|  |           | F-2 | 1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構（院）、身心障礙者職業訓練機構。<br>2. 特殊教育學校。                             | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ |   |
|  |           | F-3 | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼稚園、托兒所、兒童及少年福利機構。<br>2. 發展遲緩兒早期療育中心。                     | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |   | √ |   |
| G 類  | 辦公、服務類    | G-1 | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   |
|  |           | G-2 | 1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。<br>2. 政府機關（公務機關）。<br>3. 身心障礙者就業服務機構。                 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |   |   |
|  |           | G-3 | 1. 衛生所<br>2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |   | √ |
|  |           |     | 公共廁所   | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |   |   |   |   |
|  |           |     | 便利商店   | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |
| H 類  | 住宿類       | H-1 | 1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。<br>2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ |   |
|  |           | H-2 | 1. 六層以上之集合住宅。<br>2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。   | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ |   |   |   |   |
| <p>說明：</p> <p>一、「√」指每一建造執照每幢至少必須設置一處；多幢建築物停車空間依法集中留設者，其供行動不便者使用設施之停車位數得依其幢數集中設置之。</p> <p>二、「○」指申請人視實際需要自由設置。</p> <p>三、五層以下之場所因增建或變更使用需申請建築執照者，依本表應設置之昇降設備，得以坡道或其他設施替代。</p> <p>四、六層以上之集合住宅以複層式設計者，其同一單元之昇降設備，得選擇通達複層之任一層。</p> <p>五、「室內通路走廊」指連接各室內空間行動不便者使用設施之通路走廊。</p> <p>六、「室內出入口」指各室內空間行動不便者使用設施之出入口。</p> |           |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

第 171 條至第 177 條及第 177-1 條已刪除。

## (七) 建築技術規則 建築設計施工篇 第十章公共建築物行動不便者使

### 用設施 98 年修正條文 (中華民國 98 年 9 月 8 日內政部台內營字第 0980808321 號令

修正「建築技術規則」建築設計施工編第一百七十條條文，自中華民國 99 年 1 月 1 日施行)

第 170 條 公共建築物設置供行動不便者使用設施，其種類及適用範圍如下表：

| 建築物使用類組 |                                      | 供行動不便者使用設施<br>建築物之適用範圍 |   | 室外通路 | 避難層坡道及扶手 | 避難層出入口 | 室內出入口 | 室內通路走廊 | 樓梯 | 昇降設備 | 廁所盥洗室 | 浴室 | 輪椅觀眾席位 | 停車空間 |   |
|---------|--------------------------------------|------------------------|---|------|----------|--------|-------|--------|----|------|-------|----|--------|------|---|
|         |                                      |                        |   |      |          |        |       |        |    |      |       |    |        |      |   |
| A 類     | 公共集會類                                | A-1                    | 1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。                                    | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     |    | √      | √    |   |
|         |                                      |                        | 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。      | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  | √      | √    | √ |
|         |                                      | A-2                    | 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。                           | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  | √      | √    | √ |
| B 類     | 商業類                                  | B-2                    | 1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。<br>2. 候船室、水運客站。<br>3. 航空站、飛機場大廈。         | √    | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     |    |        | √    |   |
|         |                                      | B-4                    | 百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。                | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  |        |      | √ |
| D 類     | 休閒、文教類                               | D-1                    | 國際觀光旅館、一般觀光旅館。  | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  |        | √    |   |
|         |                                      | D-2                    | 室內游泳池。  | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  | √      | √    |   |
|         |                                      |                        | 1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。       | √    | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     |    |        |      | √ |
|         |                                      |                        | 2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。       | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  | √      | √    | √ |
|         |                                      | D-3                    | 3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。                            | √    | √        | √      | √     | √      | ○  | √    | √     | √  | √      | √    | √ |
|         |                                      | D-4                    | 小學教室、教學大樓、相關教學場所。   | √    | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     | √  |        | √    | √ |
| D-5     | 國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。 | √                      | √   | √    | √        | √      | √     | √      | √  | √    |       | √  | √      |      |   |
| E 類     | 宗教、殯葬類                               | E                      | 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。                         | √    | √        | √      | √     | ○      | ○  | √    | ○     |    |        | ○    |   |
|         |                                      |                        | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。 | √    | √        | √      | √     | √      | √  | √    | √     |    | √      | √    |   |

|  |           |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-----------|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 類  | 衛生、福利、更生類 | F-1 | 1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|  |           | F-2 | 1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。<br>2. 特殊教育學校。                             | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |
|  |           | F-3 | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼稚園、托兒所、兒童及少年福利機構。<br>2. 發展遲緩兒早期療育中心。                     | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ |
| G 類  | 辦公、服務類    | G-1 | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。                    | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|  |           | G-2 | 1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。<br>2. 政府機關(公務機關)。<br>3. 身心障礙者就業服務機構。                 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |
|  |           | G-3 | 1. 衛生所<br>2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|  |           |     | 公共廁所   | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ |   |   |   |   |   |   |
|  |           |     | 便利商店   | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |   |
| H 類  | 住宿類       | H-1 | 1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。<br>2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |
|  |           | H-2 | 1. 六層以上之集合住宅。  | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ |   |   |   |   |   |   |
|  |           |     | 2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。  | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |   |   |   |   |   |
| I 類  | 危險物品類     | I   | 加油(氣)站   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |   | ○ |   |   |
| <p>說明：</p> <p>一、「√」指每一建造執照每幢至少必須設置一處；多幢建築物停車空間依法集中留設者，其供行動不便者使用設施之停車位數得依其幢數集中設置之。</p> <p>二、「○」指申請人視實際需要自由設置。</p> <p>三、五層以下之場所因增建或變更使用需申請建築執照者，依本表應設置之昇降設備，得以坡道或其他設施替代。</p> <p>四、六層以上之集合住宅以複層式設計者，其同一單元之昇降設備，得選擇通達複層之任一層。</p> <p>五、「室內通路走廊」指連接各室內空間行動不便者使用設施之通路走廊。</p> <p>六、「室內出入口」指各室內空間行動不便者使用設施之出入口。</p> |           |     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(八) 建築技術規則 建築設計施工篇 第十章公共建築物行動不便者使

用設施 101 年修正條文 (民國 101 年 10 月 01 日修正)

第 167 條 為便利行動不便者進出及使用建築物，新建或增建建築物，應依本章規定設置無障礙設施。但符合下列情形之一者，不在此限：

- 一、獨棟或連棟建築物，該棟自地面層至最上層均屬同一住宅單位且第二層以上僅供住宅使用者。
- 二、供住宅使用之公寓大廈專有及約定專用部分。
- 三、除公共建築物外，建築基地面積未達一百五十平方公尺或每層樓地板面積均未達一百平方公尺。

前項各款之建築物地面層，仍應設置無障礙通路。

前二項建築物因建築基地地形、垂直增建、構造或使用用途特殊，設置無障礙設施確有困難，經當地主管建築機關核准者，得不適用本章一部或全部之規定。

建築物無障礙設施設計規範，由中央主管建築機關定之。

第 167 條之 1 居室出入口及具無障礙設施之廁所盥洗室、浴室、昇降設備、停車空間及樓梯應設有無障礙通路通達。

第 167 條之 2 建築物設置之直通樓梯，至少應有一座為無障礙樓梯。

第 167 條之 3 建築物依本規則建築設備編第三十七條應裝設衛生設備者，除 H2 類住宅或集合住宅外，每幢建築物其地面以上樓層在三層以下者，至少應設置一處無障礙廁所盥洗室。超過三層以上或地面層以下部分，每增加三層且有一層以上之樓地板面積超過五百平方公尺者，應於每增加三層之範圍內分別設置一處無障礙廁所盥洗室。

本規則建築設備編第三十七條建築物種類第七類及第八類，其設置之大便器數量在十個以下者，應設置一處無障礙廁所盥洗室，超過十個者，超過部分每增加十個，應增加一處。

第 167 條之 4 建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室。

第 167 條之 5 建築物設有固定座椅席位者，其輪椅觀眾席位數量不得少於下表規定：

| 固定座椅席位數量(個)                                | 輪椅觀眾席位數量(個) |
|--|-------------|
| 五十以下                                       | 一           |
| 五十一至一百五十                                   | 二           |
| 一百五十一至二百五十                                 | 三           |
| 二百五十一至三百五十                                 | 四           |
| 三百五十一至四百五十                                 | 五           |
| 四百五十一至五百五十                                 | 六           |
| 五百五十一至七百                                   | 七           |
| 七百零一至八百五十                                  | 八           |
| 八百五十一至一千                                   | 九           |
| 一千零一至一千二百五十                                | 十           |
| 一千二百五十一至一千五百                               | 十一          |
| 一千五百零一至一千七百五十                              | 十二          |
| 一千七百五十一至二千                                 | 十三          |
| 超過二千個固定座椅席位者，超過部分每增加五百個固定座椅席位，應增加一個輪椅觀眾席位。 |             |

第 167 條之 6 建築物依法設有停車空間者，至少應設置一處無障礙停車位。超過五十個停車位者，超過部分每增加五十個停車位及其餘數，應再增加一

處無障礙停車位。但 H2 類住宅或集合住宅停車空間超過五十個停車位者，超過部分每增加一百個停車位及其餘數，應增加一處無障礙停車位。

第 167 條之 7 建築物使用類組為 B-4 組者，其客房數十六間以上一百間以下者，至少應設置一間無障礙客房，超過一百間者，超過部分每增加一百間及其餘數，應增加一間無障礙客房。

第 168 條 (刪除)

第 169 條 (刪除)

第 170 條 既有公共建築物之適用範圍如下表：

| 建築物使用類組             |  | 建築物之適用範圍 |   |                                   |
|---------------------|--|----------|---|-----------------------------------|
| A 類                 | 公共集會類  | A-1      | 1. 戲(劇)院、電影院、演藝場、歌廳、觀覽場。  |                                   |
|                     |  |          | 2. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。                      |                                   |
|                     |  |          | 3. 觀眾席面積在二百平方公尺以上之下列場所：體育館(場)及設施。   |                                   |
|                     |  | A-2      | 1. 車站(公路、鐵路、大眾捷運)。  |                                   |
|                     |  |          | 2. 候船室、水運客站。  |                                   |
|                     |  |          | 3. 航空站、飛機場大廈。   |                                   |
| B 類                 | 商業類  | B-2      | 百貨公司(百貨商場)商場、市場(超級市場、零售市場、攤販集中場)、展覽場(館)、量販店。                                |                                   |
|                     |  | B-3      | 1. 飲酒店(無陪侍，供應酒精飲料之餐飲服務場所，包括啤酒屋)、小吃街等類似場所。                                   |                                   |
|                     |  |          | 2. 樓地板面積在三百平方公尺以上之下列場所：餐廳、飲食店、飲料店(無陪侍提供非酒精飲料服務之場所，包括茶藝館、咖啡店、冰果店及冷飲店等)等類似場所。 |                                   |
|                     |  | B-4      | 國際觀光旅館、一般觀光旅館、一般旅館。   |                                   |
| D 類                 | 休閒、文教類   | D-1      | 室內游泳池。  |                                   |
|                     |  | D-2      | 1. 會議廳、展示廳、博物館、美術館、圖書館、水族館、科學館、陳列館、資料館、歷史文物館、天文臺、藝術館。                       |                                   |
|                     |  |          | 2. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：音樂廳、文康中心、社教館、集會堂(場)、社區(村里)活動中心。                       |                                   |
|                     |  |          | 3. 觀眾席面積未達二百平方公尺之下列場所：體育館(場)及設施。  |                                   |
|                     |  | D-3      | 小學教室、教學大樓、相關教學場所。   |                                   |
|                     |  | D-4      | 國中、高中(職)、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所。  |                                   |
| D-5                 | 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：補習(訓練)班、課後托育中心。                      |          |   |                                   |
| E 類                 | 宗教、殯葬類   | E        | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之寺(寺院)、廟(廟宇)、教堂。<br>2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之殯儀館。                 |                                   |
| F 類                 | 衛生、福利、更生類  | F-1      | 1. 設有十床病床以上之下列場所：醫院、療養院。  |                                   |
|                     |  |          | 2. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。                                |                                   |
|                     |  | F-2      | 1. 身心障礙者福利機構、身心障礙者教養機構(院)、身心障礙者職業訓練機構。                                      |                                   |
|                     |  |          | 2. 特殊教育學校。  |                                   |
| F-3                 | 1. 樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：幼兒園、兒童及少年福利機構。<br>2. 發展遲緩兒早期療育中心。 |          |   |                                   |
| G 類                 | 辦公、服務類   | G-1      | 含營業廳之下列場所：金融機構、證券交易場所、金融保險機構、合作社、銀行、郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之營業場所。               |                                   |
|                     |  |          | G-2   | 1. 郵政、電信、自來水及電力等公用事業機構之辦公室。       |
|                     |  |          |   | 2. 政府機關(公務機關)。<br>3. 身心障礙者就業服務機構。 |
|                     |  | G-3      | 1. 衛生所。   |                                   |
|                     |  |          | 2. 設置病床未達十床之下列場所：醫院、療養院。<br>公共廁所。<br>便利商店。                                  |                                   |
| H 類                 | 住宿類  | H-1      | 1. 樓地板面積未達五百平方公尺之下列場所：護理之家、屬於老人福利機構之長期照護機構。                                 |                                   |
|                     |  |          | 2. 老人福利機構之場所：養護機構、安養機構、文康機構、服務機構。   |                                   |
|                     |  | H-2      | 1. 六層以上之集合住宅。   |                                   |
| 2. 五層以下且五十戶以上之集合住宅。 |  |          |   |                                   |
| I 類                 | 危險物品類  | I        | 加油(氣)站。   |                                   |

第 171 條至第 177 條及第 177 條之 1 已刪除。

(九) 公共建築物建造執照無障礙設施工程圖樣種類及說明書應標示事項  
表

內政部 100.5.2 營署建管字第 1000803049 號訂定，自中華民國一〇〇年七月一日生效

| 應標示圖樣種類                |  | 應標示事項  |
|------------------------|--|--|
| 配置圖<br>(比例尺大小不限)       |  | 方位、室外通路(含高程、引導設施、引導標誌位置、淨寬、排水方向)、室外停車空間(含無障礙停車位)、避難層出入口(含坡道、引導標誌)、基地及建築物高程。  |
| 各層平面圖<br>(比例尺大小不限)     |  | 避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊(含高程、坡度、寬度、迴轉空間)、無障礙樓梯位置、昇降設備(含引導設施、輪椅迴轉空間、機廂尺寸)、廁所盥洗室(含迴轉空間)、浴室(含高程)、輪椅觀眾席位(含位置、尺寸及數量)、室內停車空間(含無障礙停車位及引導標誌位置)。 |
| 構造詳圖<br>(比例尺不得小於五十分之一) | 坡道及扶手                                  | 高程差、坡度、寬度、平臺(含起點與終點平臺、中間平臺或轉彎平臺之淨寬、淨深)、坡道防護緣、扶手(含高度、形狀、淨寬、與壁面距離、端部處理)。   |
|                        | 避難層出入口                                 | 引導標誌位置、平臺(含淨寬、淨深、坡度)、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。  |
|                        | 室內出入口                                  | 淨寬、門扇(含操作空間、開門方式)、門把(含位置及型式)。  |
|                        | 樓梯                                     | 底版淨高未達一百九十公分之防護設施、轉折平臺設計方式、梯級(含級深、級高、鼻端處理)、防滑條、防護緣、扶手(含水平延伸方式、端部處理、長度、高度、扶手形狀、與壁面距離)、欄杆、警示設施。                                      |
|                        | 昇降設備                                   | 引導標誌位置、輪椅迴轉空間、呼叫鈕位置、觸覺裝置位置(含各樓層乘場入口標誌)、昇降機門、機廂尺寸、扶手、後視鏡、輪椅乘坐者操作盤。  |
|                        | 室內通路走廊                                 | 淨高、淨寬、突出物警示或防撞設施。  |
|                        | 廁所盥洗室                                  | 無障礙廁所盥洗室：引導標誌位置、迴轉空間、出入口(含門淨寬、門把、門檔位置)、鏡子、求助鈴位置、馬桶(含淨空間、高度、沖水控制、靠背)、馬桶扶手(含型式、位置及尺寸)、洗面盆(含位置、高度、深度、水龍頭開關型式、扶手)、廁所盥洗室外部設置求助鈴警示燈之位置。  |
|                        |  | 一般廁所盥洗室：小便器(含型式、位置、尺寸、扶手、淨空間)。   |
|                        | 浴室                                     | 迴轉空間、浴缸或淋浴間位置、扶手、淋浴間座椅、淋浴間淨空間、水龍頭位置、求助鈴位置。   |
| 輪椅觀眾席位                 | 坡度、寬度、深度、引導標誌位置、席位配置、陪伴者座椅位置、欄杆(含防護緣)。 |  |

#### 十四、實地現場抽查日期變更相關公文

檔 號：  
保存年限：

### 內政部營建署 函

地址：10556臺北市八德路2段342號  
聯絡人：陳雅芳  
聯絡電話：02-87712684  
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國105年8月30日  
發文字號：營署建管字第1052913711號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：


主旨：關於105年度建築物無障礙生活環境業務考核計畫實地現場考核改期事宜一案，請查照。

說明：

- 一、依據本署105年8月8日營署建管字第1052912242號函續辦。
- 二、本署原訂於105年9月9日至貴縣轄內辦理旨揭實地現場考核，因交通因素無法成行，爰更動至105年9月28日辦理。

正本：澎湖縣政府

副本：財團法人台灣建築中心、本署建築管理組



檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：10556臺北市八德路2段342號

聯絡人：陳雅芳

聯絡電話：02-87712684

電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國105年9月21日

發文字號：營署建管字第10529149091號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為因應貴府辦理莫蘭蒂颱風災後復建業務之推動，取消貴府105年度公共建築物無障礙生活環境業務督導之行程，請查照。

說明：依據本署102年8月8日營署建管字第1052912242號函（諒達）續辦兼復貴府105年9月19日府建管字第1050072561號函。

正本：金門縣政府

副本：王召集人榮進、高共同召集人文婷、王委員武烈、鄭委員淑勻、李委員訓良、財團法人台灣建築中心、本署建築管理組、盧科長昭宏、陳技士雅芳

2015-09-21  
交09:擬08章

檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：10556臺北市八德路2段342號  
聯絡人：陳雅芳  
聯絡電話：02-87712684  
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心


發文日期：中華民國105年9月21日  
發文字號：營署建管字第10529149092號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：為因應貴府辦理莫蘭蒂颱風災後復建業務之推動，原訂105年9月22日貴府105年度公共建築物無障礙生活環境業務督導之行程順延至105年10月6日舉辦，請 查照。

說明：依據本署102年8月8日營署建管字第1052912242號函（諒達）續辦兼復貴府105年9月19日高市工務建字第10537470400號函。

正本：高雄市政府

副本：王共同召集人安強、高共同召集人文婷、柯委員坤男、蔡委員再相、楊委員楷巖、交通部觀光局、衛生福利部、財團法人台灣建築中心、本署建築管理組、盧科長昭宏、陳技士雅芳



檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：10556臺北市八德路2段342號  
聯絡人：陳雅芳  
聯絡電話：02-87712684  
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心


發文日期：中華民國105年10月11日  
發文字號：營署建管字第1052915707號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：關於105年度公共建築物無障礙生活環境業務督導行程一案，原定105年9月29日（星期四）督導，因天候因素延期至105年11月1日（星期二）舉辦，請查照。

說明：依據本署105年8月8日營署建管字第1052912242號函及105年9月29日營署建管字第1052915382號（諒達）續辦。

正本：福建省連江縣政府

副本：高共同召集人文婷、蔡委員再相、吳委員建忠、謝委員瑤馨、交通部觀光局、衛生福利部、財團法人台灣建築中心、本署建築管理組、盧科長昭宏、陳技士雅芳



十五、研商 105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查  
行前說明會議會議紀錄

檔 號：  
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556 臺北市八德路2段342號  
聯絡人：陳雅芳  
聯絡電話：02-87712684  
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國105年9月21日  
發文字號：營署建管字第1052914766號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如備註(1052914766.doc、105291476601.pdf)

主旨：檢送105年8月29日研商105年度公共建築物無障礙生活環  
境業務督導業務實地現場抽查行前說明會議紀錄乙份，請  
查照。

說明：依據本署105年8月19日營署建管字第1052913050號開會通  
知單續辦。

正本：高組長兼共同召集人文婷、蘇副召集人憲民、黃副召集人仁鋼、林副召集人震富、吳副召集人敏男、樂副召集人中丕、陳委員淑玲、劉委員金鐘、李委員殿華、金委員桐、王委員武烈、陳委員政雄、林委員敏哲、李委員訓良、謝委員瑤馨、林委員俊福、蔡委員再相、鄭委員淑勻、蔡委員崑茂、柯委員坤男、楊委員德明、張委員木藤、楊委員檔巖、吳委員建忠、湯委員皖平、陳委員大榮、詹委員政達、梁委員仁勳、黃委員文彬、郭委員鴻鑾、鄭委員介文、陳委員奎宏、財團法人台灣建築中心、本署建築管理組盧科長昭宏、陳技士雅芳

副本：本署建築管理組 

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| 電 | 016-09-21 | 文     |
| 交 | 14        | 換:05章 |

## 研商 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地 現場抽查行前說明會議紀錄

壹、開會時間：105 年 8 月 29 日（星期一）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：本署第 107 會議室

參、主持人：高組長兼共同召集人文婷

記錄：陳雅芳

肆、出（列）席單位及人員：如會議簽到單

伍、討論提案：

案由一：介紹本年度公共建築物無障礙生活環境業務督導副召集人及委員。

決 議：洽悉。

案由二：本年度實地現場抽查評分及注意事項，提請討論。

決 議：

- 一、本年度評分於實地現場考核評分規則八、騎樓整平評分(三)明定：「未依無障礙通路規定留設 1.3 公尺寬度供行動不便者使用者，扣 3 分。」，惟經與會委員建議，查本部訂定發布之市區道路及附屬工程設計規範 14.1 無障礙通路規定：「1. 無障礙通路淨寬以 2.5 公尺以上為宜，一般情況下不得小於 1.5 公尺，如因局部路段空間受限時，不得小於 0.9 公尺，最小淨高 2.1 公尺。」，本年度仍以上開評分規則進行評分，並納於後續年度修正計畫內容時之參考。
- 二、本年度評分就整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計項目進行加分考核，請財團法人台灣建築中心就每一考核建築物列為整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計之加分項目逐一拍照紀錄，留供本署討論加分事宜。

玖、散會

## 會議簽到單

一、開會事由：研商 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查行前說明會議

二、開會時間：105年8月29日（星期一）下午2時30分

三、開會地點：本署第107會議室

四、主持人：高組長兼共同召集人文婷 高文婷 記錄：陳雅芳

五、出（列）席單位及人員：

| 人 員     | 簽 到 |
|---------|-----|
| 蘇副召集人憲民 | 蘇憲民 |
| 黃副召集人仁鋼 | 黃仁鋼 |
| 林副召集人震富 | 林震富 |
| 吳副召集人敏男 | 吳敏男 |
| 樂副召集人中丕 | 樂中丕 |
| 陳委員淑玲   |     |
| 劉委員金鐘   | 劉金鐘 |
| 李委員殿華   |     |

|           |     |
|-----------|-----|
| 金 委 員 桐   | 金桐  |
| 王 委 員 武 烈 | 王武烈 |
| 陳 委 員 政 雄 |     |
| 林 委 員 敏 哲 | 林敏哲 |
| 李 委 員 訓 良 |     |
| 謝 委 員 瑤 馨 | 謝瑤馨 |
| 林 委 員 俊 福 |     |
| 蔡 委 員 再 相 | 蔡再相 |
| 鄭 委 員 淑 勻 | 鄭淑勻 |
| 蔡 委 員 崑 茂 | 蔡崑茂 |
| 柯 委 員 坤 男 |     |
| 楊 委 員 德 明 | 楊德明 |
| 張 委 員 木 藤 | 張木藤 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 楊 委 員 楷 巖            | 楊楷巖     |
| 吳 委 員 建 忠            |         |
| 湯 委 員 皖 平            | 湯皖平     |
| 陳 委 員 大 榮            | 陳大榮     |
| 詹 委 員 政 達            |         |
| 梁 委 員 仁 勳            | 梁仁勳     |
| 黃 委 員 文 彬            |         |
| 郭 委 員 鴻 鑾            | 郭鴻鑾     |
| 鄭 委 員 介 文            |         |
| 陳 委 員 奎 宏            | 陳奎宏     |
| 財團法人台灣建築<br>中 心      | 許立潔 邱弘亨 |
|                      | 李麗 林平川  |
| 本署建築管理組<br>盧 科 長 昭 宏 |         |

十六、研商 105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查  
評分事宜會議紀錄

檔 號：  
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556 臺北市八德路 2 段 342 號  
聯絡人：陳雅芳  
聯絡電話：02-87712684  
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國 105 年 11 月 16 日  
發文字號：營署建管字第 1052917388 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如備註(1052917388.doc、105291738802.pdf)

主旨：檢送 105 年 10 月 20 日研商 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查評分事宜會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本署 105 年 10 月 10 日營署建管字第 1052916182 號開會通知單續辦。

正本：高組長兼共同召集人文婷、蘇副召集人憲民、黃副召集人仁鋼、林副召集人震富、吳副召集人敏男、樂副召集人中丕、財團法人台灣建築中心、本署建築管理組（盧科長昭宏、陳技士雅芳）

副本：本署建築管理組

電 2016-11-16 文  
交 11:39:37 章

## 研商 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地 現場抽查評分事宜會議紀錄

壹、開會時間：105 年 10 月 20 日（星期四）下午 2 時 30 分

貳、開會地點：本署 B1 第 2 會議室

參、主持人：高組長兼共同召集人文婷

記錄：陳雅芳

肆、出（列）席單位及人員：如會議簽到單

伍、討論提案：

案由一：實地現場抽查缺失扣分事宜。

決 議：。

一、既有公共建築物完成無障礙設施改善，列入已改善清冊原則：

（一）按建築法第 96 條規定：「本法施行前，供公眾使用之建築物而未領有使用執照者，其所有權人應申請核發使用執照。……」已有明定。

（二）自 106 年起公共建築物及騎樓無障礙環境督導實地現場抽查對象，以領有使用執照之建築物為限。如改善完成之公共建築物未領有使用執照，應先依建築法第 96 條規定辦理後，再依規列入無障礙完成改善清冊。

二、D 類休閒文教類「D-3」、「D-4」完成無障礙設施改善列入已改善清冊原則：

（一）既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則已明定改善之無障礙設施種類，自 106 年起，既有建築物之 D 類休閒文教類「D-3 小學教室、教學大樓、相關教學場所」、「D-4 國中、高中（職）、專科學校、學院、大學等之教室、教學大樓、相關教學場所」之無障礙改善完成清冊請以使用執照或幢或棟予以區別進行無障礙設施改善範圍。

（二）經區別後之範圍依規定應改善之無障礙設施，應全部完成後始得列入已完成改善清冊，如屬公共建築物及騎樓無障礙環境督導實地現場抽查案件，則所有應設置之無障礙設施項目均納入計分。於 105 年度，若未完成所有應設置項目改善者，每項扣 1 分。

(三) 105 年度督導 D 類休閒文教類「D-3」、「D-4」部分現場查核案件之範圍經討論獲致共識如下：

1. 台中二中體育館：因該棟建築物係單獨取得使用執照，爰就該棟體育館建築物部分進行考核評分。
2. 苗栗大倫國中、新竹建功高中等 2 案：因該校係屬同一使用執照，且無法以幢或棟予以區別，故以校園全區作為考核評分範圍。
3. 高雄岡山國中活動中心：因該活動中心係屬獨棟建築物，爰就該活動中心建築物部分進行考核評分。

三、既有建築物以替代改善計畫方式辦理無障礙設施改善，惟於實地現場抽查時經督導委員認為替代改善計畫不符規定或仍未符合使用者需求項目之評分原則：

(一) 既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則第 5 點及第 11 點已分別明定：「……無法依第三點第一項第二款規定改善者，得由建築物所有權人或管理機關負責人依第十一點規定提具替代改善計畫，報經當地主管建築機關審核認可後，依其計畫改善內容及時程辦理。前項由建築物所有權人或管理機關負責人提具之替代改善計畫，應包括不符規定之項目、原因及替代改善措施與現行規定功能檢討、比較、分析。」、「公共建築物無障礙設施無法依第十點規定改善者，得依下列替代原則或其他替代方案提具替代改善計畫，並依第 5 點規定辦理：……」

(二) 既有建築物以提具替代改善計畫方式辦理無障礙設施改善，應踐行第 5 點第 1 項所定程序，替代改善計畫並應包括第 5 點第 2 項規定項目。如已踐行第 5 點有關規定及程序，惟於實地現場抽查時經督導委員認為替代改善計畫不符規定或仍未符合使用者需求項目，不予扣分，列為建議事項，請受督導單位再予檢討。至未踐行有關規定與程序者，仍列為扣分項目。

四、花蓮縣 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查評分事宜：

(一) 依公共建築物及騎樓無障礙環境 優化計畫(105-108 年) 六、考核方式、考核成績及獎懲 (一) 考核方式

(2)「實地現場考核」部分所載：「……新建公共建築物係指於 103、104 年取得使用執照之公共建築物；既有公共建築係指 103、104 年度經改善諮詢及審查小組審查通過並已施工完竣之公共建築物。」

(二)惟花蓮縣政府提供之改善清冊資料有誤，經本署抽選原列為既有建築物改善之新城火車站、南平火車站兩案，因原列管之既有建築物已拆除，現有建築物係屬新建，原以新建建築物之評分標準進行計分，至未進行現場查勘之壽豐火車站一案不予計分。

(三)另花蓮縣政府自選之衛福部東區老人之家雖為 105 年時領得使用執照，同意列為本次實地現場考核之新建建築物，惟明年度不得再次提報。

#### 五、騎樓項目加分事宜：

(一)督導計畫內容並無針對騎樓項目之加分之規定，合先敘明。

(二)宜蘭縣騎樓路段係針對利澤老街進行現場實地查核，該路段配合文化傳承及古厝意象，採用浮雕式地磚，並自道路劃設 1.5 公尺設為人行步道配合維護，惟人行道與騎樓功能有別，爰該路段不予加分。

#### 六、新建建築物未依建築技術規則規定設置無障礙設施之評分事宜

(一)按建築技術規則建築設計施工編第 167 條之 4 規定：「建築物設有浴室者，每幢建築物至少應設置一處無障礙浴室。」，合先敘明。

(二)苗栗縣政府自選之銅鑼國小附設多功能活動中心係於 102 年 11 月領得建照，104 年時取得使照，設有游泳池及淋浴間，惟未依建築技術規則規定檢討設置浴室依公共建築物及騎樓無障礙環境 優化計畫 (105-108 年) 附件 2 實地現場考核評分規則規定缺失項目扣 5 分。

#### 七、無障礙樓梯改善與評分事宜

(一)依據 97 年 10 月 24 日內授營建管字第 0970808530 號函所載：「…依本辦法規定檢討如應設置供行動不便者使用之樓梯者，其整座樓梯應符合建築技術規則建

築設計施工編第 167 條第 2 項所訂建築物無障礙設施設計規範之規定，或依身心障礙者權益保障法第 57 條規定提具替代改善計畫。」已有明示，如屬應改善無障礙樓梯之既有公共建築物，自應依規定辦理改善。

(二) 除屬無須改善情形或依身心障礙者權益保障法第 57 條規定提具替代改善計畫者，得免扣分外，如未完成整座樓梯無障礙設施改善者，依缺失項目扣 5 分。

八、無障礙督導實地現場抽查扣分項目於現勘結束後指定時間內改善完畢，建議該項可否免予扣分事宜：

公共建築物及騎樓無障礙環境業務督導係就各受督導單位辦理情形進行考評，有關桃園市政府建議，扣分項目若可於現勘結束後指定時間內改善完畢，建議該項可免扣分一事，與督導考核精神不符，暫不採納。

案由二：105 年度實地現場抽查評分加分項目事宜。

決 議：

本年度評分於附件 2 實地現場考核評分規則七、現場設備設施評分(三)明定：「加分方式，設備設施項目已依規定設置，且整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計項目，視實際情形酌予加分，每項加分項目最高可得 5 分。」，經請財團法人台灣建築中心就每一考核建築物列為整體規劃、設計創新、舒適貼心等優良設計之加分項目逐一拍照紀錄，綜整歸納加分案例說明，經討論獲致加分原則評分原則如下，本署將依下列加分項目評分原則進行加分項目評分：

#### 105 年無障礙督導實地現場考核加分項目評分原則

| 類型   | 案例說明   | 加分 | 備註                     |
|------|--|----|------------------------|
| 整體規劃 | 1. 全區引導設施清楚明確具有整體規劃性或設有全區無障礙設施配置圖  | +2 |                        |
|      | 2. 結帳櫃台、服務台高度均在 90 公分以下，符合規範附錄之設置標準，並配合建物使用性質提供視障者點字相關設備、輪 椅或身障輔具出借、輪椅專用充電插座或維修器材等服務 | +2 | 僅符合其中一項者：1 分<br>最多 2 分 |

|                      |  |    |                              |
|----------------------|--|----|------------------------------|
|                      | 3. 無障礙廁所、浴室內之衛生紙置放處、衣物置物架、沐浴用品、洗手乳、吹風機及蓮蓬頭固定架等高度距地板面 80 至 100 公分，符合規範附錄之設置標準 | +1 |                              |
|                      | 4. 配合建物使用性質規劃無障礙專區，相關設備如提款機、公用電話、電氣開關及插座高度、電腦、家具用品等設置均有考量身障者需求               | +2 | 僅符合其中一項者：1 分<br>最多 2 分       |
| 舒適貼心<br>(設施數量高於法規要求) | 1. 建築物增設符合規定之無障礙廁所   | +3 | 多於兩處(部)者，每多一處(部)加 1 分；最多 5 分 |
|                      | 2. 建築物增設符合規定之無障礙升降機  | +3 |                              |
|                      | 3. 建築物或建築基地內增設符合規定之無障礙停車位  | +2 |                              |
|                      | 4. 建築物或建築基地內增設無障礙機車停車位並設有明確之引導標示   | +2 |                              |
|                      | 5. 無障礙廁所增設沖洗設備、淋浴設備或求助鈴  | +1 |                              |
|                      | 6. 舞台、講台設有無障礙斜坡道或升降機可供行動不便人士上台   | +3 |                              |
|                      | 7. 室內出入口寬度全部大於 90 公分   | +2 | 既有建物經過改善者：3 分                |
|                      | 8. 主要通路設置有緊急求助鈴或服務鈴  | +1 |                              |
|                      | 9. 一般房間或廁所設有緊急求助鈴  | +1 |                              |
| 設計創新<br>(設施品質高於法規要求) | 1. 整體設計無障礙標誌清楚明確，加註相關必要說明。   | +2 |                              |
|                      | 2. 無障礙廁所之門鎖採長桿撥扣式之門鎖。  | +1 |                              |
|                      | 3. 無障礙廁所及浴室，求助鈴加鍊或使用無線遙控式擴大可求助範圍。  | +1 |                              |
|                      | 4. 無障礙升降機設置有固定座椅供長者使用，扣除座椅使用空間後輪椅迴轉空間仍符合規定。                                  | +1 |                              |
|                      | 5. 無障礙升降機扶手設計防勾撞設施。  | +1 |                              |
|                      | 6. 提高樓梯級高、級深之對比色或於梯鼻加設不同顏色之警示帶，方便弱視者使用。                                      | +1 |                              |

|                            |    |  |
|----------------------------|----|--|
| 7. 樓梯牆面加設弱視警示帶。            | +1 |  |
| 8. 樓梯設置有三種不同高度扶手供不同年齡層使用。  | +2 |  |
| 9. 無障礙浴室設有紅外線感知器並與緊急求助鈴連動。 | +1 |  |
| 10. 無障礙停車位設有語音引導設施。        | +1 |  |

玖、散會

# 會議簽到單

一、開會事由：研商 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導業務實地現場抽查評分事宜會議

二、開會時間：105年10月20日（星期四）下午2時30分

三、開會地點：本署B1第2會議室

四、主持人：高組長兼共同召集人文婷 高文婷 記錄：陳雅芳

五、出（列）席單位及人員：

| 人 員              | 簽 到   |
|------------------|---|
| 蘇副召集人憲民          | 蘇憲民   |
| 黃副召集人仁鋼          | 黃仁鋼   |
| 林副召集人震富          | 林震富   |
| 吳副召集人敏男          | 吳敏男   |
| 樂副召集人中丕          | 樂中丕   |
| 本署建築管理組<br>盧科長昭宏 | 盧昭宏   |
| 財團法人台灣建築<br>中 心  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>邱弘育</span> <span>曹雲凱</span> </div>                  |
|                  | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>許立強</span> <span>薛澤軒</span> <span>謝如媛</span> </div> |

# 十七、105 年公共建築物無障礙生活環境業務督導檢討會會議紀錄

檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：10556 臺北市八德路2段342號  
聯絡人：陳雅芳  
聯絡電話：02-87712684  
電子郵件：fanny108@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

受文者：財團法人台灣建築中心

發文日期：中華民國105年12月28日

發文字號：營署建管字第1052920937號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如備註(105292093701.doc、105292093702.pdf、105292093703.pdf、105292093704.pdf)

主旨：檢送105年12月9日105年度公共建築物無障礙生活環境業務督導檢討會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本署105年11月29日營署建管字第1052918879號開會通知單續辦。

正本：王召集人榮進、高組長兼共同召集人文婷、蘇副召集人憲民、黃副召集人仁鋼、林副召集人震富、吳副召集人敏男、樂副召集人中丕、陳委員淑玲、劉委員金鐘、李委員殿華、金委員桐、王委員武烈、陳委員政雄、林委員敏哲、李委員訓良、謝委員瑤馨、林委員俊福、蔡委員再相、鄭委員淑勻、蔡委員崑茂、柯委員坤男、楊委員德明、張委員木藤、楊委員檔巖、吳委員建忠、湯委員皖平、陳委員大榮、詹委員政達、梁委員仁勳、黃委員文彬、郭委員鴻鑾、鄭委員介文、陳委員奎宏、財團法人台灣建築中心、本署建築管理組（楊簡任技正哲維、盧科長昭宏、陳技士雅芳）

副本：本署建築管理組



# 105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導檢討

## 會議紀錄紀錄

壹、時間：105 年 12 月 9 日（星期五）上午 9 時 30 分

貳、地點：本署 601 會議室（臺北市松山區八德路二段 342 號）

參、主席：王召集人榮進

記錄：陳雅芳

肆、出席人員（如簽到簿）

伍、報告案結論：

第一案、受委託督導單位財團法人台灣建築中心就「105 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導」之各項成果提出綜合報告。

決定：

- 一、因本年度督導於實地現場考核納入整體規劃、舒適貼心、設計創新等加分項目，且加分原則係於現場抽查完整後綜整歸納，各受督導單位之實地現場考核案件如有已設置之整體規劃、舒適貼心、設計創新等相關措施但未納入加分項目計算者，於 105 年 12 月 12 日下班前提送具體資料送本署評估納入計分事宜。
- 二、截至 105 年 12 月 12 日下班，計有高雄市政府、嘉義市政府、南投縣政府、雲林縣政府等 4 個單位提出實地現場考核加分項目之補充資料，上開 4 個單位之實地現場考核分數調整如附件。
- 三、臺南市政府工務局 105 年 12 月 14 日南市工使二字第 1051287156 號為該府前於 105 年 6 月 29 日南市工使二字第 1050643377 號函檢送臺南市 104 年度執行公共建築物無障礙生活環境業務成果資料，上冊內附「臺南市既有公共建築物分期分區改善計畫表」表列 G3 便利商店分區及改善期限誤植為 104 年 12 月 31 日，更正為 105 年 12 月

31 日。惟依公共建築物及騎樓無障礙環境 優化計畫 (105-108 年) 附件一 105 年公共建築物及騎樓無障礙環境考核評分表三、分期改善計畫評分標準說明 2 所載：「提供經諮詢審查小組會議通過最新之分期分區改善計畫會議紀錄。」，查該府工務局於 105 年 1 月 2 日南市工使二字第 1050031199 號函檢送 104 年 12 月 23 日召開既有公共建築物供行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組 104 年第 6 次會議會議記錄所載，該 G-3 便利商店之分期確為第 4 期 104.10.01 至 104.12.31，爰該府所提建議修正計分一事，仍不計入。

- 四、本年度受督導之 22 個單位中有臺北市府、新北市政府、臺中市政府、高雄市政府、金門縣政府 5 個單位成績特優，本署另案頒發獎狀以資鼓勵。另嘉義縣政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、連江縣政府等 4 個單位成績為丁等，苗栗縣政府成績為戊等，分數不佳，請文到 2 個月內回復具體改進作為。
- 五、本次業務督導及現場抽查發現之缺失，各單位應確實追蹤改善情況及列管，並於文到 3 個月內報本署彙辦。請各受督導機關依本年度業務督導計畫之考核成績及獎懲規定辦理獎懲，並彙報至本署。
- 六、本次督導成果報告書於定稿後於本署網站公布周知。
- 七、台灣建築中心就本年度業務推動相關作業建議，請作業單位及各受督導單位錄案配合辦理。

第二案、內政部函送督導成績予行政院主計總處作為增減對地方一般性補助之依據。

決定：因公共建築物無障礙生活環境業務督導成績納入中央對各縣（市）政府一般性補助款分配核撥之參據，請各受督導單位確實辦理公共建築物無障礙生活環境改善相關業務。另配合實地現場考核分數調整，請再將修正後之成績依程序函送行政院主計總處參辦。

## 陸、督導委員發言摘要及綜合結論：

### 一、督導委員發言摘要

#### (一) 金委員桐

1. 有關各項無障礙設施之用語與相關標示，因未有中文與英文統一用語，以致呈現同一空間或設備有不同標註，為利辨識，建請由營建署研訂統一中英用語。
2. 自 105 年起於實地現場考核納入整體規劃、舒適貼心、設計創新等加分項目，該等加分原則應納入督導計畫中明確揭示。
3. 就無障礙督導而言，督導委員係由營建署決定安排，爾後請考量由受督導單位可決定督導委員之方式。

#### (二) 蔡委員崑茂

目前無障礙之標誌未予統一，各類型式皆有，建請考量以通用設計方式予以統一，以便於行動不便者與身心障礙者辨識。

#### (三) 張委員木藤

自 105 年起於實地現場考核納入整體規劃、舒適貼心、設計創新等加分項目，上開項目非屬建築技術規則或建築物無障礙設施設計規範項目，是否納入未來勘檢內容？恐衍生相關疑義，似不宜納入實地現場考核內容。且加分項目佔實地現場考核分數之 20%，比例甚高，是否適當，請再予考量。

#### (四) 陳委員淑玲

本年度實地現場考核將騎樓整平路段與騎樓順平路段分列不同之分數，惟整平與順平如何定義？似未於督導計畫明確定義，就騎樓之功能性而言似應以順暢通行為主，如因所在地直轄市縣市政府經費不足以支應鋪面更新或統一但已達順暢通行者，似亦可符合整平之條件，建請後續年度之督導計畫可納入詳載，以減少實地現場考核爭議。

(五) 劉委員金鐘

1. 自 105 年起於實地現場考核納入整體規劃、舒適貼心、設計創新等加分項目，惟佔實地現場考核分數之 20%，比例甚高，且加分項目未必所有行動不便者皆能受惠。又騎樓路段如已達淨空，是否得列為加分事項？有關加分項目是否適當，請再予考量。
2. 依本年督導計畫附件 2 實地現場考核評分規則規定，騎樓整平路段如未達 100 公尺者，以 0 分計算；但如有特殊情節者，可敘明原因，不受 100 公尺之限制。但目前已有部分直轄市縣市政府出現推動困難之情形，上開評分規則是否再做考量。又騎樓部分之坡度如已符合各直轄市縣市政府所定之規定，得否視為符合順平？建請併同考量。
3. 學校之無障礙改善常以分年分期分項目方式進行，但如經列入無障礙改善完成清冊者，建議應就規定應改善項目全部進行確認較為妥當。

(六) 柯委員坤男

現行督導計畫對於經本部指定為特設主管建築機關如本署所屬國家公園管理處，係採每五年督導一次，但國家公園現在亦積極推動建置無障礙步道，建請應修正縮短督導年期。

二、綜合結論

對於公共建築物無障礙生活環境業務督導工作，有關實地抽查計分方式、騎樓整平、順平定義、國家公園督導頻率、加分項目與方向等事宜請作業單位錄案，將另擇期邀集各單位召會研商。

柒、散會。

## 會議簽到簿

一、開會事由：召開「105年度公共建築物無障礙生活環境業務督導檢討會議」

二、時間：105年12月9日（星期五）上午9時30分

三、地點：本部營建署601會議室

四、主席：王召集人榮進

記錄：陳雅芳

五、出席機關（單位）及人員：

| 機關（人員） | 職 稱   | 簽 到   |
|--------|-------|-------|
| 高 文 婷  | 共同召集人 | 高 文 婷 |
| 蘇 憲 民  | 副召集人  |       |
| 黃 仁 鋼  | 副召集人  | 黃 仁 鋼 |
| 林 震 富  | 副召集人  | 林 震 富 |
| 吳 敏 男  | 副召集人  | 吳 敏 男 |
| 樂 中 丕  | 副召集人  | 樂 中 丕 |
| 陳 淑 玲  | 委員    | 陳 淑 玲 |

| 機關(人員) | 職稱 | 簽到  |
|--------|----|-----|
| ✓ 劉金鐘  | 委員 | 劉金鐘 |
| 李殿華    | 委員 |     |
| ✓ 金桐   | 委員 | 金桐  |
| ✓ 王武烈  | 委員 | 王武烈 |
| ✓ 陳政雄  | 委員 | 陳政雄 |
| 林敏哲    | 委員 |     |
| 李訓良    | 委員 |     |
| ✓ 謝瑤馨  | 委員 | 謝瑤馨 |
| ✓ 林俊福  | 委員 | 林俊福 |
| ✓ 蔡再相  | 委員 | 蔡再相 |
| ✓ 鄭淑勻  | 委員 | 鄭淑勻 |

| 機關(人員)  | 職 稱 | 簽 到 |
|---------|-----|-----|
| ✓ 蔡 崑 茂 | 委員  | 蔡崑茂 |
| ✓ 柯 坤 男 | 委員  | 柯坤男 |
| 楊 德 明   | 委員  |     |
| ✓ 張 木 藤 | 委員  | 張木藤 |
| 楊 檔 巖   | 委員  |     |
| 吳 建 忠   | 委員  |     |
| ✓ 湯 浣 平 | 委員  | 湯浣平 |
| ✓ 陳 大 榮 | 委員  | 陳大榮 |
| ✓ 詹 政 達 | 委員  | 詹政達 |
| ✓ 梁 仁 勳 | 委員  | 梁仁勳 |
| 黃 文 彬   | 委員  |     |

| 機關(人員) | 職稱        | 簽到             |
|--------|-----------|----------------|
| 郭鴻鑾    | 委員        |                |
| 鄭介文    | 委員        |                |
| 陳奎宏    | 委員        | 陳奎宏            |
| 教育部    |           | 黃蔭如 國教署<br>賴心亭 |
| 衛福部    |           |                |
| 交通部觀光局 |           |                |
| 臺北市府   | 股長<br>工程師 | 吳志維 詹毅如        |
| 新北市政府  | 股長        | 孫政憲、林加芳        |
| 桃園市政府  | 科長        | 郭建志            |
| 臺中市政府  | 協理        | 史景忠            |
| 臺南市政府  | 股長        | 吳兆民            |

| 機關(人員) | 職稱        | 簽到                |
|--------|-----------|-------------------|
| 高雄市政府  | 副市長<br>課長 | 傅昭壽<br>吳佩玲<br>謝秋分 |
| 基隆市政府  |           | 吳佩玲<br>謝秋分        |
| 新竹市政府  | 約僱人員      | 林怡君               |
| 嘉義市政府  | 技佐        | 張耀如               |
| 宜蘭縣政府  | 科長        | 杜志明               |
| 新竹縣政府  | 技士        | 賴啟展               |
| 苗栗縣政府  | 約僱科長      | 吳偉新<br>邱耀如        |
| 彰化縣政府  | 技士        | 黃惠倫               |
| 南投縣政府  | 技士        | 陳登洲<br>吳月香        |
| 雲林縣政府  |           | 陳婉婷<br>邱水逢        |
| 嘉義縣政府  | 約僱        | 黃惠倫               |

| 機關(人員)           | 職稱   | 簽到                        |
|------------------|------|---------------------------|
| 屏東縣政府            | 技士   | 白松新 侯育良                   |
| 臺東縣政府            | 約用人員 | 林玉玲                       |
| 花蓮縣政府            | 科長   | 林詩群 賴明志 魏偉                |
| 澎湖縣政府            | 科長   | 謝名男                       |
| 金門縣政府            | 約僱人員 | 陳守之                       |
| 連江縣政府            | 約用   | 陳國華                       |
| 本部營建署<br>(建築管理組) |      | 蕭昭宏                       |
| 衛生福利部            | 科長   | 何文俊                       |
| 衛生福利部專司          | 研考員  | 黃敏玲                       |
| 財團法人台灣<br>建築中心   |      | 林若萍 邱玉婷<br>許立潔 蔡正利<br>許如敏 |

| 縣市  | 105年11月21日內授營建管字第<br>1050816265號函送成績 |                  |                          |    | 105年12月19日檢討會修正成績 |                  |                          |           |
|-----|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----|-------------------|------------------|--------------------------|-----------|
|     | 業務考<br>核成績                           | 實地現<br>場考核<br>成績 | 105年<br>無障礙<br>督導總<br>成績 | 等級 | 業務考<br>核成績        | 實地現<br>場考核<br>成績 | 105年<br>無障礙<br>督導總<br>成績 | 等級        |
| 臺北市 | 99                                   | 98               | 98.30                    | 特優 | 99                | 98               | 98.30                    | 特優        |
| 新北市 | 100                                  | 99               | 99.30                    | 特優 | 100               | 99               | 99.30                    | 特優        |
| 桃園市 | 93                                   | 93               | 93.00                    | 優等 | 93                | 93               | 93.00                    | 優等        |
| 臺中市 | 99                                   | 98               | 98.30                    | 特優 | 99                | 98               | 98.30                    | 特優        |
| 臺南市 | 87                                   | 94               | 91.90                    | 優等 | 87                | 94               | 91.90                    | 優等        |
| 高雄市 | 97                                   | 89               | 91.40                    | 優等 | 97                | 98               | <b>97.70</b>             | <b>特優</b> |
| 基隆市 | 50                                   | 73               | 66.10                    | 丙等 | 50                | 73               | 66.10                    | 丙等        |
| 新竹市 | 58                                   | 70               | 66.40                    | 丙等 | 58                | 70               | 66.40                    | 丙等        |
| 嘉義市 | 70                                   | 65               | 66.50                    | 丙等 | 70                | 68               | <b>68.60</b>             | 丙等        |
| 宜蘭縣 | 31                                   | 68               | 56.90                    | 丁等 | 31                | 68               | 56.90                    | 丁等        |
| 新竹縣 | 89.6                                 | 55               | 65.38                    | 丙等 | 89.6              | 55               | 65.38                    | 丙等        |
| 苗栗縣 | 38                                   | 54               | 49.20                    | 戊等 | 38                | 54               | 49.20                    | 戊等        |
| 彰化縣 | 44                                   | 71               | 62.90                    | 丙等 | 44                | 71               | 62.90                    | 丙等        |
| 南投縣 | 97                                   | 91               | 92.80                    | 優等 | 97                | 93               | <b>94.20</b>             | 優等        |
| 雲林縣 | 92.3                                 | 71               | 77.39                    | 乙等 | 92.3              | 76               | <b>80.89</b>             | <b>甲等</b> |
| 嘉義縣 | 54                                   | 61               | 58.90                    | 丁等 | 54                | 61               | 58.90                    | 丁等        |
| 屏東縣 | 75                                   | 85               | 82.00                    | 甲等 | 75                | 85               | 82.00                    | 甲等        |
| 花蓮縣 | 30                                   | 60               | 51.00                    | 丁等 | 30                | 60               | 51.00                    | 丁等        |
| 臺東縣 | 62                                   | 63               | 62.70                    | 丙等 | 62                | 63               | 62.70                    | 丙等        |
| 澎湖縣 | 81                                   | 63               | 68.40                    | 丙等 | 81                | 63               | 68.40                    | 丙等        |
| 金門縣 | 96                                   | 95               | 95.30                    | 特優 | 96                | 95               | 95.30                    | 特優        |
| 連江縣 | 9                                    | 69.46            | 51.32                    | 丁等 | 9                 | 69.46            | 51.32                    | 丁等        |

105年無障礙督導成績表

| 分組        | 105年11月21日內授營建管字第1050816265號函送成績 |     |            |           |                  |                  |                  |    |                        |                          |                  | 105年12月19日檢討會修正成績        |    |     |            |           |                  |                  |                  |    |                        |                          |                  |                          |
|-----------|----------------------------------|-----|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----|-----|------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
|           | 代號                               | 縣市  | 業務考<br>核成績 | 新建<br>建築物 | 既有建<br>築物<br>(一) | 既有建<br>築物<br>(二) | 既有建<br>築物<br>(三) | 騎樓 | 實地現<br>場考核<br>原始得<br>分 | 實地現<br>場考核<br>加分項<br>目得分 | 實地現<br>場考核<br>成績 | 105年<br>無障礙<br>督導總<br>成績 | 代號 | 縣市  | 業務考<br>核成績 | 新建<br>建築物 | 既有建<br>築物<br>(一) | 既有建<br>築物<br>(二) | 既有建<br>築物<br>(三) | 騎樓 | 實地現<br>場考核<br>原始得<br>分 | 實地現<br>場考核<br>加分項<br>目得分 | 實地現<br>場考核<br>成績 | 105年<br>無障礙<br>督導總<br>成績 |
| 都會型       | 01                               | 臺北市 | 99         | 20        | 15               | 15               | 14               | 15 | 79                     | 19                       | 98               | 98.30                    | 01 | 臺北市 | 99         | 20        | 15               | 15               | 14               | 15 | 79                     | 19                       | 98               | 98.30                    |
|           | 02                               | 新北市 | 100        | 20        | 14               | 15               | 15               | 15 | 79                     | 20                       | 99               | 99.30                    | 02 | 新北市 | 100        | 20        | 14               | 15               | 15               | 15 | 79                     | 20                       | 99               | 99.30                    |
|           | 03                               | 桃園市 | 93         | 18        | 14               | 15               | 13               | 15 | 75                     | 18                       | 93               | 93.00                    | 03 | 桃園市 | 93         | 18        | 14               | 15               | 13               | 15 | 75                     | 18                       | 93               | 93.00                    |
|           | 04                               | 臺中市 | 99         | 20        | 15               | 15               | 15               | 15 | 80                     | 18                       | 98               | 98.30                    | 04 | 臺中市 | 99         | 20        | 15               | 15               | 15               | 15 | 80                     | 18                       | 98               | 98.30                    |
|           | 05                               | 臺南市 | 87         | 20        | 15               | 15               | 15               | 9  | 74                     | 20                       | 94               | 91.90                    | 05 | 臺南市 | 87         | 20        | 15               | 15               | 15               | 9  | 74                     | 20                       | 94               | 91.90                    |
|           | 06                               | 高雄市 | 97         | 20        | 15               | 14               | 14               | 15 | 78                     | 11                       | 89               | 91.40                    | 06 | 高雄市 | 97         | 20        | 15               | 14               | 14               | 15 | 78                     | 20                       | 98               | 97.70                    |
|           | 07                               | 基隆市 | 50         | 17        | 13               | 15               | 15               | 13 | 73                     | 0                        | 73               | 66.10                    | 07 | 基隆市 | 50         | 17        | 13               | 15               | 15               | 13 | 73                     | 0                        | 73               | 66.10                    |
|           | 08                               | 新竹市 | 58         | 17        | 13               | 7                | 14               | 14 | 65                     | 5                        | 70               | 66.40                    | 08 | 新竹市 | 58         | 17        | 13               | 7                | 14               | 14 | 65                     | 5                        | 70               | 66.40                    |
| 城鎮型       | 09                               | 嘉義市 | 70         | 19        | 10               | 14               | 14               | 8  | 65                     | 0                        | 65               | 66.50                    | 09 | 嘉義市 | 70         | 19        | 10               | 14               | 14               | 8  | 65                     | 0                        | 65               | 66.50                    |
|           | 10                               | 宜蘭縣 | 31         | 18        | 14               | 15               | 0                | 13 | 60                     | 8                        | 68               | 56.90                    | 10 | 宜蘭縣 | 31         | 18        | 14               | 15               | 0                | 13 | 60                     | 8                        | 68               | 56.90                    |
|           | 11                               | 新竹縣 | 89.6       | 12        | 9                | 15               | 15               | 0  | 51                     | 4                        | 55               | 65.38                    | 11 | 新竹縣 | 89.6       | 12        | 9                | 15               | 15               | 0  | 51                     | 4                        | 55               | 65.38                    |
|           | 12                               | 苗栗縣 | 38         | 12        | 13               | 14               | 11               | 0  | 50                     | 4                        | 54               | 49.20                    | 12 | 苗栗縣 | 38         | 12        | 13               | 14               | 11               | 0  | 50                     | 4                        | 54               | 49.20                    |
|           | 13                               | 彰化縣 | 44         | 18        | 14               | 15               | 15               | 9  | 71                     | 0                        | 71               | 62.90                    | 13 | 彰化縣 | 44         | 18        | 14               | 15               | 15               | 9  | 71                     | 0                        | 71               | 62.90                    |
|           | 14                               | 南投縣 | 97         | 20        | 15               | 15               | 15               | 10 | 75                     | 16                       | 91               | 92.80                    | 14 | 南投縣 | 97         | 20        | 15               | 15               | 15               | 10 | 75                     | 16                       | 91               | 92.80                    |
|           | 15                               | 雲林縣 | 92.3       | 20        | 15               | 14               | 14               | 0  | 63                     | 8                        | 71               | 77.39                    | 15 | 雲林縣 | 92.3       | 20        | 15               | 14               | 14               | 0  | 63                     | 8                        | 71               | 77.39                    |
|           | 16                               | 嘉義縣 | 54         | 20        | 14               | 13               | 13               | 0  | 60                     | 1                        | 61               | 58.90                    | 16 | 嘉義縣 | 54         | 20        | 14               | 13               | 13               | 0  | 60                     | 1                        | 61               | 58.90                    |
| 偏遠<br>離島型 | 17                               | 屏東縣 | 75         | 20        | 14               | 15               | 15               | 10 | 74                     | 11                       | 85               | 82.00                    | 17 | 屏東縣 | 75         | 20        | 14               | 15               | 15               | 10 | 74                     | 11                       | 85               | 82.00                    |
|           | 18                               | 花蓮縣 | 30         | 20        | 10               | 15               | 0                | 15 | 60                     | 0                        | 60               | 51.00                    | 18 | 花蓮縣 | 30         | 20        | 10               | 15               | 0                | 15 | 60                     | 0                        | 60               | 51.00                    |
|           | 19                               | 臺東縣 | 62         | 20        | 13               | 15               | 15               | 0  | 63                     | 0                        | 63               | 62.70                    | 19 | 臺東縣 | 62         | 20        | 13               | 15               | 15               | 0  | 63                     | 0                        | 63               | 62.70                    |
|           | 20                               | 澎湖縣 | 81         | 20        | 14               | 13               | 14               | 0  | 61                     | 2                        | 63               | 68.40                    | 20 | 澎湖縣 | 81         | 20        | 14               | 13               | 14               | 0  | 61                     | 2                        | 63               | 68.40                    |
|           | 21                               | 金門縣 | 96         | 20        | 15               | 15               | 15               | 15 | 80                     | 15                       | 95               | 95.30                    | 21 | 金門縣 | 96         | 20        | 15               | 15               | 15               | 15 | 80                     | 15                       | 95               | 95.30                    |
|           | 22                               | 連江縣 | 9          | 16        | 15               | 14               | 9                | ※  | 66.46                  | 3                        | 69.46            | 51.32                    | 22 | 連江縣 | 9          | 16        | 15               | 14               | 9                | ※  | 66.46                  | 3                        | 69.46            | 51.32                    |

中華民國一〇五年十二月版

## **105 年公共建築物無障礙生活環境及騎樓整平示範計畫 業務督導考核**

執行單位：財團法人台灣建築中心

委託單位：內政部營建署

地址：台北市八德路二段 342 號

電話：02-8771-2345

網址：<http://www.cpami.gov.tw>

編輯：姚汾涼、許立德、邱玉婷、許暖淑、蔡淨竹、魯雲凱

日期：105 年 12 月
