

直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃作業

第 15 次研商會議議程

壹、開會緣由

為促進鄉村地區永續發展及農村再生，改善鄉村地區公共設施、居住、產業等發展問題，本部 107 年 4 月 30 日公告實施「全國國土計畫」，將「鄉村地區整體規劃」作為國土空間發展之重要策略，透過課題盤點及空間規劃配置，針對公共設施進行整體規劃，同時整合相關部會政策資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向，協助環境改善、協調產業需求及維護生態景觀，並形塑鄉村地區特色風貌。

為建立鄉村地區整體規劃之制度及協助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業，本署於委託辦理高雄市美濃區、宜蘭縣壯圍鄉、雲林縣古坑鄉、新竹縣五峰鄉及臺東縣金峰鄉等 5 地區示範計畫、研訂鄉村地區整體規劃作業手冊、成立顧問團、輔導服務團及辦理相關研習課程等過程中，持續召開鄉村地區整體規劃議題研商會議，就相關議題提出建議處理方式，並滾動式檢討及調整，以供直轄市、縣（市）政府納入規劃參考。

另本部分別於 110 年 12 月 24 日修訂「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」、111 年 2 月 14 日函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理國土計畫法定工作事項及執行管考要點」（簡稱管考要點）及 113 年 1 月 18 日函頒「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃及法定作業要點」

(簡稱法定作業要點)，並自 110 年起逐年補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業經費，為充分掌握並協助各直轄市、縣(市)政府辦理進度及情形，以及就辦理鄉村地區整體規劃後之法定程序及適用時機等進行討論，爰召開本次會議。

貳、報告事項

第一案、直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃進度

一、為協助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業，本部分別以 110 年 2 月 17 日台內營字第 1100801067 號、111 年 8 月 9 日台內營字第 1110813486 號及 112 年 3 月 27 日台內營字第 1120803908 號函核定補助直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業經費，亦有部分直轄市、縣(市)政府自籌預算辦理，先予敘明。

二、關於規劃作業階段，各直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃作業進度以 1.5 年為原則，如評估無法配合者，仍應按契約時程積極辦理，爰 110 至 113 年度案件作業時程如下：

(一) 110 年度案件(110 年 2 月 17 日核定)，按第 11 次研商會議之直轄市、縣(市)政府所提作業時程辦理。

(二) 111 年度案件(111 年 8 月 9 日核定)應於 112 年度 12 月底前完成各該鄉村地區整體規劃之期中階段成果；113 年度 6 月底前完成規劃作業，即完成總結報告。

(三) 112 年度案件(112 年 3 月 27 日核定)應於 113 年

度 12 月底前完成各該鄉村地區整體規劃之期中階段成果；114 年度 6 月底前完成規劃作業，即完成總結報告。

(四) 113 年度案件 (113 年 7 月 23 日核定) 應於 114 年度 12 月底前完成各該鄉村地區整體規劃之期中階段成果；115 年度 6 月底前完成規劃作業，即完成總結報告。

三、為掌握直轄市、縣 (市) 政府辦理鄉村地區整體規劃情形，本署就 110 至 113 年度案件分別以下重要工作檢核點進行檢視，請未符檢核點預定完成期程之直轄市、縣 (市) 政府分別說明期程落後或未辦理之原因：

(一) 110 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

經檢視尚無直轄市、縣 (市) 政府涉及此檢核項目。

2. 未符規劃辦理期程者

(1) 臺中市新社區：臺中市政府原預定於 112 年 11 月 30 日完成期末階段，前已於 112 年 12 月 4 日提送期中報告書，惟迄今尚未通過，請臺中市政府說明目前辦理進度及改進作為。

(2) 高雄市六龜區：高雄市政府原預定於 112 年 10 月 15 日完成期末階段，前已於 112 年 9 月 8 日提送第二次修正期末報告書及法定計畫書尚未通過，歷經修正期末報告書及法定計畫書、召開機關協商會議、2 場地方溝通會議及工作會議，

並於 113 年 6 月 14 日再次召開期末審查會議仍未通過，請高雄市政府說明目前辦理進度及改進作為。

- (3)雲林縣莿桐鄉(自辦):雲林縣政府原預定於 113 年 7 月 31 日完成期末階段，惟因期中階段於 113 年 6 月 3 日第 2 次期中審查會議始通過，並於 113 年 8 月 7 日同意核備期中修正報告書，迄今尚無期末進度，請雲林縣政府說明目前辦理進度及改進作為。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

經檢視尚無直轄市、縣(市)政府涉及此檢核項目。

(二) 111 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

經檢視尚無直轄市、縣(市)政府涉及此檢核項目。

2. 未符規劃辦理期程者

- (1)臺南市官田區：臺南市政府原預定於 113 年 9 月 20 日完成期末階段，規劃團隊於 113 年 9 月 19 日檢送期末報告書，惟迄今尚未通過，請臺南市政府說明目前辦理進度及改進作為。

- (2)高雄市永安區：高雄市政府原預定於 113 年 4 月 10 日完成期末階段，惟因期中報告於 113 年 9 月 11 日第 2 次期中報告審查會議始同意通過，請高雄市政府說明目前辦理進度及改進作為。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

- (1) 第 1 期：經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。
- (2) 第 2 期：請高雄市政府、苗栗縣政府及南投縣政府於計畫進度達 60%（或期中簡報審查通過）後，儘速依管考要點規定辦理請款作業；其餘直轄市、縣（市）政府均已來函請款。

（三）112 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

2. 未符規劃辦理期程者

- (1) 高雄市茂林區：高雄市政府原預定於 113 年 6 月 29 日完成期中階段，惟迄今尚未通過，請高雄市政府說明目前辦理進度及改進作為，並預估期末階段預定完成時程。
- (2) 新竹市香山區：新竹市政府原預定於 113 年 9 月 30 日完成期中階段，惟迄今尚未通過，請新竹市政府說明目前辦理進度及改進作為。
- (3) 彰化縣和美鎮：彰化縣政府原預定於 113 年 3 月 30 日完成期初階段，惟迄今尚未通過，請彰化縣政府說明目前辦理進度及改進作為。
- (4) 宜蘭縣五結鄉：宜蘭縣政府原預定於 113 年 10 月 1 日通過期中階段，惟迄今尚未通過，請宜蘭縣政府說明目前辦理進度及改進作為。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

- (1)第 1 期：嘉義縣政府已於 113 年 8 月 12 日完成契約簽訂，請儘速依管考要點規定辦理請款作業；其餘直轄市、縣（市）政府均已來函請款。
- (2)第 2 期：請高雄市政府、臺東縣政府、屏東縣政府於計畫進度達 60%(或期中簡報審查通過)後，儘速依管考要點規定辦理請款作業；其餘直轄市、縣（市）政府均已來函請款。

(四) 113 年度案件

1. 尚未完成招標作業者

- (1)刻辦理招標作業：雲林縣麥寮鄉案、大埤鄉案、土庫鎮案、嘉義縣大林鄉案、水上鄉案、新港鄉案、苗栗縣南庄鄉案、苗栗市、通霄鎮及大湖鄉案等 8 案，請雲林縣政府、嘉義縣政府及苗栗縣政府說明目前辦理情形及是否遭遇執行困難。
- (2)刻提送該市（縣）議會辦理墊付程序：花蓮縣光復鄉案、吉安鄉案、富里鄉案、新竹縣湖口鄉案、竹東鎮案、彰化縣大村鄉案、花壇鄉案、臺南市左鎮區案等 8 案，請花蓮縣政府、新竹縣政府、彰化縣政府及臺南市政府說明目前辦理情形及是否遭遇執行困難。
- (3)高雄市内門區、美濃區、臺東縣臺東市、東河鄉、南投縣仁愛鄉、南投市、新北市萬里區、基隆市七堵區、桃園市龍潭區：請高雄市政府、臺東縣政府、南投縣政府、新北市政府、基隆市政府及

桃園市政府說明目前辦理情形及是否遭遇執行困難，並請按本署所提規劃作業時程，評估修正採購作業辦理時程。

2. 未符規劃辦理期程者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

3. 已達補助經費請款條件，但尚未請領者

經檢視尚無直轄市、縣（市）政府涉及此檢核項目。

四、為使直轄市、縣（市）政府順利推動鄉村地區整體規劃作業，本署後續將依各機關所填列之預定進度進行追蹤，並將請落後預定完成期程之直轄市、縣（市）政府說明進度落後原因及改善措施。

五、請直轄市、縣（市）政府持續辦理相關作業，除依管考要點規定按月至本署建置雲端管考表單詳實填報辦理情形外，應於會後於雲端表單填寫各年度案件之後續規劃作業及法定作業階段之日程。

六、請各直轄市、縣（市）政府於辦理鄉村地區整體規劃作業相關審查及研商會議時，一併通知本署及輔導服務團，俾掌握相關進度及期程，並適時提供協助。

決定：

表 1 直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃執行進度表

113.10.09 製

	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
1	桃園市	新屋區及觀音區	補助	110	110.5.31	110.5.20	110.7.15	110.7.21	110.7.31	110.8.9	-	-	111.3.31	111.1.5	111.8.31	111.4.11	111.12.31	111.6.10	112.2.28	111.6.28 111.7.1	-	111.4.26 111.8.2 111.8.22	112.8.31	111.9.14	112.05.05 國土管理署退還計畫書，擬依到府訪談會議決議修正報告書後報部。 無進度更新
2	臺中市	新社區	補助	110	110.5.31	110.4.30 110.6.16	110.7.31	110.7.26	110.8.31	110.7.26	111.1.31	111.9.6	111.7.31	112.8.22	112.11.30	112.12.04	113.6.30								112.12.4 提送期末報告 113.2.5 召開第7場機關研商會議 113.3.12 拜訪新社區休閒導覽協會 依據 113.4.9 內政部鄉村整規會議討論內容修正期末報告內容。 113.7.18、7.31 函請相關單位就建議功能分區調整部分提出意見。 113.8.16 本府農業局函請中央確認城 2-1 與農政資源投入關係。
3	臺南市	學甲區	補助	110	110.7.31	110.8.12	110.9.30	110.9.17	110.10.31	110.10.5	111.5.29	111.5.6	111.10.10	111.10.27	112.11.30	112.12.13	113.12.31		114.1-114.2		114		114.4.30		刻正修正法定計畫書(草案)，並同步準備提送公展企劃書 113.8.5 內部召開工作會議 無進度更新
4	高雄市	六龜區	補助	110	110.6.25	110.6.25	110.8.31	110.8.17	110.8.31	110.8.17	-	-	111.1.31	111.4.15	112.10.15										113 年 6 月 14 日召開期末報告審查會議。 廠商 8 月 22 日檢送修正期末成果，檢視修正內容中。 113.10.16 召開工作會議
5	新竹縣	新豐鄉	補助	110	110.9.30	110.12.24	110.12.1	111.2.11	110.12.1	111.2.11	111.12.30	112.01.11	112.5.30	112.7.18	112.11.30	113.6.5	113.4.1		113.4.1~113.4.30		113.9.30		113.12.30		112.11.29 檢送期末報告書 112.12.20 與新豐鄉公所討論規劃策略及方案 112.12.21 函請規劃單位配合書面意見修正 113.4.3 拜訪在地濱海休閒農業區發展協會及村長 113.4.8 拜訪水環境守護協會 113.4.23 召開府內工作會議 113.6.5 召開期末審查會議原則修正後通過 113.7.5 檢送期末修正報告書 113.9.13 期末修正報告書核定 113.9.30 期末報告書核定本同意備查
6	苗栗縣	西湖鄉	補助	110	110.8.1	110.6.2	110.9.1	110.7.1	110.9.15	110.7.1	111.2.28	111.10.28	112.6.28	112.08.02	112.11.30	113.2.1									113.5.15 檢送成果報告 113.6 辦理成果說明並簽辦結案(修改法訂計畫書草案中) 無進度更新
7	雲林縣	麥寮鄉	補助	110	110.9.8	110.9.14	110.10.31	110.10.14	110.10.31	110.10.18	111.4.1	111.4.7	111.8.1	112.3.10	112.9.22	112.9.22	113.5.1		113.9.1		113.12.1		114.7.31		112.11.15 繳交成果報告 113.10 簽辦結案程序中

	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
					113.12.15		114.02.30		114.02.30														113.07.31 已送本縣議會提案墊付 113.08.21 本縣議會同意墊付，後續 辦理採購發包事宜。 無進度更新 (113.10.07)		
8	嘉義縣	阿里山鄉竹崎鄉番路鄉	補助	110	110.8.1	110.8.19	110.9.1	110.10.20	110.10.1	110.11.16	111.7.1	111.11.16	112.4.30	112.5.30	113.1	113.4.12	112.11.15		112.11.15~ 112.12.15		113.1		113.4	113.4.12 召開期末審查會議原則同意通過 113.7.5 檢送成果報告書，檢視內容中。 無進度更新	
9	屏東縣	三地門鄉霧臺鄉	補助	110	110.6.15	110.6.15	110.8.10	110.8.10	110.8.31	110.8.16	110.10.15	110.10.15	110.6.30	110.7.1	112.12.31	113.7.29								112.12.7 辦理修正後期末報告書審查會議，請城都公司依委員意見調整修正後交由業務單位確認通過。 113.1.31-城都公司提送修正後報告書 113.3.5 再至三地門鄉及霧臺鄉公所向地方代表（鄉長、議員、部落領袖、村里長等）說明規劃成果。 113.4.28 城都公司修正報府。 113.5.20 邀集公所、署輔導團及本府團隊併同審查期末報告書（修正版第2版）審查會議。 本府以113.7.29屏府原經字第1130073682 號函核定期末報告書，目前規劃單位城都公司刻正辦理請款作業中。 後續法定階段，上簽擬俟內政部完成法令修訂鄉村地區整體規劃之法律定位及法定計畫應載明事項後，再啟動公開展覽及公聽會等事宜中。 （無進度更新）	
10	宜蘭縣	員山鄉三星鄉	補助	110	110.7.19	110.7.19	110.8.31	110.8.26	110.9.1	110.9.1	111.5.30	111.8.17	111.12.31	111.10.31	112.09.30	113.5.6								廠商於113 年4 月29 日檢送修正後期末成果，本府於113 年5 月6 日函發期末報告審查通過，依契約將於113 年8 月2 日前檢送總結階段成果。 廠商於113 年8 月1 日前檢送總結階段成果，刻由業務單位檢視中。113 年8 月22 日奉核簽准辦理驗收作業。 本案已於113 年8 月29 日上午驗收完畢。	
11	花蓮縣	光復鄉	補助	110	110.9.1	110.8.20	110.10.1	110.9.30	110.11.1	110.10.25	-	-	111.9.1	111.9.14	112.5.1	112.5.31	113.12		114.01		114.05		114.06	113 年6 月11 日結案。 法定程序預算簽請議會同意墊付中。	
					113.12.15		113.2.28		113.2.28																暫無進度更新(113.10.9)
12	臺東縣	池上鄉卑南鄉	補助	110	110.11.1	110.10.18	110.12.1	110.11.29	110.12.30	110.12.11	-	111.11.14	112.5.30	112.5.29	112.11.30	112.11.15								113.03.14 驗收結案。	

	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)	
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議			
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		
13	澎湖縣	馬公市 湖西鄉	補助	110	110. 7. 2	110. 7. 2	110. 8. 31	110. 8. 26	110. 8. 31	110. 8. 31	-	110. 10. 30	112. 7. 30	112. 9. 1	113. 3. 31	113. 9. 2	113. 6. 30		113. 8. 1~ 113. 8. 31		113. 10. 31		113. 11. 30		113. 3. 4 辦理期末報告第 1 次審查會。 113. 4. 22 召開第 2 次期末報告審查會。 113. 7. 9 召開第 3 次期末報告審查會。 113. 9. 2 期末審查同意通過。	
24	臺中市	大安區 外埔區	自辦	110	-	110. 7. 9	-	110. 9. 1		110. 9. 1	-	-	112. 1. 31	113. 9. 23	112. 9. 30										112. 7. 4、7. 7 邀集審查委員及機關辦理現勘，刻依意見修正期中報告 112. 8. 1 廠商來文更換計畫主持人，112. 8. 25 本局原則同意 112. 8. 30、10. 25、11. 16 工作會議確認修正情形 113. 1.-2. 函請各機關研提書面意見，113. 3. 29 召開工作會議，113. 4. 22 廠商檢送修正本。 113. 7. 18、7. 31 函請相關單位就建議功能分區調整部分提出意見。 113. 9. 23 召開期中審查會議(第 2 次)，原則同意修正後通過。	
26	雲林縣	四湖鄉	自辦	110	-	110. 6. 30	-	110. 8. 16		110. 8. 23	-	111. 1. 26	-	112. 2. 22	-	112. 9. 22									112. 12. 4 檢送勞務結算驗收證明書，結案	
		雲林縣	大埤鄉	自辦	110	-	110. 4. 22	-	110. 6. 10		110. 06. 10	-	110. 12. 3	-	112. 5. 17	112. 9. 30	112. 11. 10	113. 5. 1		113. 9. 1		113. 12. 1		114. 7. 31		113. 05. 14 付款結案。
						113. 12. 15		114. 02. 30		114. 02. 30															113. 07. 31 已送本縣議會提案墊付 113. 08. 21 本縣議會同意墊付，後續辦理採購發包事宜。 無進度更新(113. 10. 07)	
28	雲林縣	莿桐鄉	自辦	110	-	110. 7. 12	-	110. 8. 23		110. 8. 9	-	111. 1. 26 111. 8. 26	113. 01. 31	113. 6. 3	113. 7. 31		114. 5. 1		114. 09. 1		114. 12. 1		115. 7. 31		113. 06. 03 召開期中審查第二次會議通過 113. 07. 05 廠商檢送期中修正報告書 113. 08. 07 縣府同意核備期中修正報告書 無進度更新	
29	新竹縣	湖口鄉	自辦	110	-	110. 8. 2	-	110. 9. 3			-	-	-	111. 2. 15	-	111. 7. 28									本案係湖口鄉公所自行辦理	
			補助	113	113. 11		113. 12		113. 12																聚落規劃部分俟預算立法程序完成後，辦理採購發包作業 無進度更新	
14	新北市	瑞芳區	補助	111	-	111. 10. 7	-	111. 12. 1	-	111. 12. 1	112. 5. 31	112. 6. 1	112. 12. 31	113. 5. 31	113. 12. 31										113. 1. 3 期中報告第 1 次審查會議 113. 3. 28 工作會議 113. 5. 31 期中報告第 2 次審查會議通過 無進度更新	

	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
15	臺中市	和平區	補助	111	-	111.10.27	-	112.1.3	-	112.1.19	112.8.31	112.11.20	113.1.31	113.7.16	113.5.31									113.3.18 提送期中報告 113.4.3 廠商檢送修正本 113.4.17 召開工作會議。 113.7.16 召開期中審查會議，修正後通過。 113.7.18、7.31 函請相關單位就建議功能分區調整部分提出意見。 113.7.25 函發期中審查會議紀錄，113.8.9 廠商檢送修正本、113.8.16 備查。113.9.2 國土署函復第2期補助款入帳。	
16	臺南市	官田區	補助	111	-	111.11.15	-	111.12.30	-	112.1.10	-	-	112.11.30	112.12.12	113.09.20	113.09.19								113.09.19 檢送期末報告書 陸續會再召開2場議題工作會議	
17	高雄市	永安區	補助	111	-	112.1.11	-	112.2.22	-	112.2.22	-	-	112.9.8	113.9.11	113.4.10		113.10.18		113.10.19~ 113.12.19				114.6.19	112.9.27 召開期中報告審查會議。請委辦廠商修正期中報告內容，再送都發局續審。 112.11.8 局內工作會議。 112.12.18 起預計陸續拜訪選區議員。 113.1.19、1.20 辦理3場地區工作坊。 113.3.27 局內工作會議。 113.6.18 局內工作會議。 113.6.28 召開永安鄉規議題座談會。 113.9.11 召開第2次期中報告審查會議(期中報告原則同意修正通過)。	
18	新竹縣	竹北市	補助	111		112.2.16	112.3.31	112.03.24	112.3.31	112.03.31	-	-	112.12.31	113.5.20	113.11.30									113.05.20 備查期中報告書 113.10.04 召開工作坊	
19	苗栗縣	卓蘭鎮	補助	111	-	111.11.23	-	111.12.28	-	111.12.28	-	113.2.22	113.9.5	113.9.4	113.12.20									112.12.21 召開期初會議 113.1.5 函發會議紀錄 113.2.22 期初定稿本准予備查 113.6 辦理5場工作坊(6/18.19.26) 113.7.2 檢送期中報告， 113.9.4 辦理期中審查會議，決議修正後通過，已於9/11發文，規劃單位應於10/12前送定稿本報府	
20	南投縣	竹山鎮	補助	111	112.6.30前	112.7.17(第2次)	112.08.30	112.09.14	112.09.01	112.9.26	-	-	113.4.30	113.4.23	113.12.31									113.4.23 通過期中報告書審查。 113.7.29 召開第3次工作坊會議。 113.8.23 召開第5次工作小組會議	
21	屏東縣	瑪家鄉	補助	111	-	112.2.23	-	112.4.13	-	112.4.26	112.6.26	112.6.21	113.1.15	113.1.8	113.6.30	113.7.23								112.11.30 辦理期中報告書成果審查會議，決議請惇陽公司於112年12月28日前依委員意見修正後函報本府。 期中階段113.1.8核定修正後通過。 113.1.17-就修正內容拜會瑪家鄉公所研討。 113.1.29 辦理期中幹部工作圈會議	

縣 市 別	案 名 (鄉、鎮、市、區)	性質 (補助/自辦)	辦 理 年 度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)
				公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
																							第 2 期款已請領完竣 113.5.30 召開期末審查會議完畢。 113.7.23 期末修正(二次)審查會議通過。 期末報告依本府 113 年 9 月 16 日屏府原經字地 1130119758 號函核定上開通過報告書定稿本，將函送計畫審查委員、公所及國土署暨輔導團等核備。	
22	花蓮縣	瑞穗鄉	補助	111	-	112.1.7	-	112.5.19	-	112.5.19	-	112.12.27	113.8.30	113.8.29	114.1.31								112.12.27 日經本府同意備查工作計畫書。 已於 113 年 5 月 24 日辦理地方訪談會議(鄉公所)。並於 113 年 5 月 30 及 31 日辦理 3 場地方工作坊完畢。廠商於 113 年 6 月 19 日檢送期中報告書 20 份到府。 已於 113 年 8 月 29 日召開期中審查會議，原則同意通過。 113.10.21 鄉規輔導團到府訪談。 暫無進度更新(113.10.9)	
23	臺東縣	太麻里鄉關山鎮	補助	111	-	111.11.25	-	112.1.13		112.1.11	-	-	112.10.31	112.11.30	113.6.30	113.8.7							113.4.29&30 辦理兩鄉鎮座談會 113.08.07 期末審查 113.09.10 期末定稿	
25	臺南市	新營區鹽水區柳營區	自辦	111	-	111.2.15	-	111.4.15		111.4.28	-	111.11.25	112.8.31	112.8.14	113.4.30								113.03.21 繳交期末報告 113.4.19 期末審查會前會 113.5.28 機關協調會 113.8.21 召開期末審查會議，同意修正後通過 期末成果報告刻依會議紀錄及國土計畫分區畫設成果補正中	
30	嘉義縣	義竹鄉	補助	112	112.12.15	113.1.11	113.4.30	113.5.14	113.6.30	113.8.12	-	-	114.5.9		115.2.3								本案已於 113 年 1 月 11 日上網招標。本案已於 113.3.8 召開評選會，113.5.14 議價完成，並於 113.5.31 公告決標，113.8.12 簽約完成。 113.9.5 提交工作計畫書，續排審查會議。	
31	臺南市	七股區	補助	112	112.8.30	112.8.28	112.10.1	112.10.12	112.10.30	112.10.26	-	-	113.8.29	113.9.30									113.3.18 召開地方座談會(地方領袖場次、相關團體場次) 113.4.30-6.28 啟動地方巡迴駐點工作站 113.8.22 召開 2 場地方工作坊 113.08.28 提交期中報告，並於 9/30 召開審查會議同意通過。	
32	高雄市	大樹區	補助	112	112.7.31	112.8.7	112.9.28	112.9.20	112.9.28	112.9.20	-	-	113.6.3	113.5.6	114.3.17								113.5.6 召開期中報告審查會議(原則同意修正通過) 113.6.~113.7. 期中報告書定稿等經同意確認後，已給付廠商第 2 期款 113.7.10 局內工作會議 113.9.3、9.5、9.9 辦理 3 場工作坊 暫無進度更新	

	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
33	高雄市	茂林區	補助	112	112. 8. 15	112. 11. 15	112. 9. 15	113. 2. 26	112. 10. 15	113. 3. 1	-	-	113. 6. 29											113. 5. 16 召開執行工作計畫審查 113. 6. 5 工作計畫書定稿 113. 6. 27 檢送期中報告書 113. 9. 26 會辦相關局處提供期中報告書面審查意見 無進度更新	
34	新竹市	香山區	補助	112	112. 8. 15	112. 8. 14	112. 10. 1	112. 09. 27	112. 10. 19	112. 11. 06	-	-	113. 9. 30		114. 9. 30									廠商已於 112. 12. 22 檢送修正後之工作計畫書，本府已同意備查。業於 113. 1 至 2 月完成 24 里之里長訪談，預計於 113 年 7 月辦理 3 場開放式訪談。 業完成各里里訪談，並已於 8 月 7 日舉辦第 1 場開放式訪談、於 8 月 14 日完成 2 場開放式訪談。 預計 10 月 14 日召開期中報告書審查會議。	
35	花蓮縣	新城鄉	補助	112	112. 10. 31	112. 9. 25	112. 11. 30	112. 10. 19	112. 12. 31	112. 11. 20	113. 3. 15	113. 4. 10	113. 10. 15		114. 3. 15									113. 4. 10 同意通過期初工作計畫書。 業於 113. 4. 25 與廠商洽新城鄉公所訪談及交流。 113 年 8 月 12 日晚上辦理地方工作坊(一般場)。 113 年 8 月 13 日晚上辦理地方工作坊(原住民專場)。 113. 10. 21 鄉規輔導團到府訪談。暫無進度更新(113. 10. 9)	
36	臺東縣	鹿野鄉	補助	112	112. 7. 14	112. 7. 7	112. 9. 15	112. 8. 15	112. 10. 16	112. 8. 29	-		113. 6. 30	113. 8. 7	114. 3. 31									112. 11. 24 工作計畫書定稿。 刻正辦理訪談作業 113. 08. 07 期中審查 113. 09. 09 期中定稿	
37	屏東縣	來義鄉	補助	112	-	112. 8. 18	112. 9. 30	112. 11. 08	112. 10. 31	112. 11. 20	112. 12. 31	112. 12. 15	113. 6. 30	113. 5. 17	113. 12. 31									113. 5. 17 召開期中審查會議完畢。 113. 7. 29 召開期中修正後工作會議。 第二期款刻正辦理補正作業中 113. 9. 3 二次拜會公所 113. 9. 9 部門空間發展計畫 113. 9. 13 召開期末成果(初稿)部落幹部說明會 預計 113. 10. 28 期末審查會議	

	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段						規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
38	臺中市	霧峰區	補助	112	112.6.15	112.6.1	112.10.31	112.9.8	112.11.30	112.9.22	113.6.30	113.4.1	113.12.31		114.7.31									113.1.2 同意備查工作計畫書， 113.2.21 檢送工作坊企劃書， 113.2.26 廠商請領第 1 期款。 113.3.21 召開網站工作會議， 113.3.25 通知廠商延後辦理工作坊 並辦理契約變更。113.4.1 檢送期初 報告書， 113.4.12 召開契約變更協 商會議。113.4.25 函發會議紀錄， 113.4.29 廠商檢送用印協議書， 113.5.6 檢選用印後協議書。 113.5.31 檢送修正後期初報告書。 113.7.19 召開期初報告書工作會 議，113.7.29 會議記錄發文， 113.8.12 檢送修正後報告書。 113.9.27 召開期初報告審查會議， 原則 修正後通過，113.10.7 函發會 議紀錄。	
39	澎湖縣	白沙鄉 西嶼鄉 望安鄉 七美鄉	補助	112	112.7.15	112.7.20	112.11.14	112.11.14	112.11.21	112.11.27	113.1.30	113.1.11	113.6.30	113.9.13	113.10.30									白沙鄉及西嶼鄉已於 8 月 29 日召開 第 3 次審查會議，原則同意通過； 本府將於 113 年 9 月 13 日函文同意 備查， 已於 9 月 24 日、25 日辦理白 沙鄉及望安鄉期末地方座談會，預 計於 10 月 9 日、10 月 17 日及 10 月 21 日辦理西嶼鄉及七美鄉期末地方 座談會並且召開機關協調會，彙整 相關資料後進行期末報告書製作。 (113.10.9 更新)	
40	彰化縣	和美鎮	補助	112	112.8.1	112.8.16	112.9.1	112.9.26	112.10.1	112.10.16	113.3.30		113.12.1		114.6.1									113 年 1 月 19 召開工作計畫書審查 會通過 於 5 月 8 月辦理訪談公所作 業，訂於 9 月 18 日召開和美鎮里長 及社區發展協會座談會 (113.09.09 更新)	
41	宜蘭縣	五結鄉	補助	112	112.8.15	112.8.29	112.10.13	112.9.26	112.10.31	112.10.13	113.4.13	113.5.27	113.10.1		114.2									113.5.27 召開期初審查會議，原則 修正後通過 113.7.8 召開第 4 次工作會議 113.7.16 發文會議紀錄(期初報告 原則同意通過) 113.8.2 期初報告定稿本審查核可 113.8.21 召開第 5 次工作會議 113.9.18 召開第 6 次工作會議 113.10.7 召開 2 場工作坊，預計 10.14 召開 1 場作坊 (113.10.08 更新)	
42	苗栗縣	後龍鎮	補助	112	-	112.6.15	112.6.29	112.08.30	112.8.1	112.08.30	113.04.10	113.04.10	113.10.13	113.9.4	114.6.3									113.04.10 召開期初報告審查會議， 決議修正後通過 已於 7 月初舉辦 4 場鄉親工作坊 113.7.18 檢送期中報 告書，113.9.4 召開審查會議，決議 修正後通過 無進度更新	

序	縣市別	案名 鄉(鎮市區)	性質 (補助/自辦)	辦理 年度	採購階段					規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)	
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會		函報本部審議		
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定		實際
43	苗栗縣	苑裡鎮 竹南鎮 銅鑼鄉 三義鄉	自辦	112	-	112.10.3	112.11.10	112.11.10	112.11.24	112.11.10	113.03.26	113.5.29	113.10.30	113.10.15 113.10.16	114.3.1										113.01.18 工作計畫書審查通過 113.05.22、05.29 召開期初報告審查會議，決議修正後通過。 已於8月14至8月29日舉辦16場工作坊 預計113.10.15及10.16召開期中審查會議
44	高雄市	內門區	補助	113	113.10.31		113.12.15		113.12.31																無進度更新
45	高雄市	路竹區	補助	113	113.10.31		113.12.15		113.12.31																113.10.7 簽准辦理採購作業，刻辦理遴選委員及採購上網作業中。
46	高雄市	桃源區	補助	113	113.10.31		113.12.15		113.12.31																俟預算立法程序完成後，辦理採購發包作業 無進度更新
47	高雄市	美濃區	補助	113	113.10.31		113.12.15		113.12.31																無進度更新
48	雲林縣	土庫鎮	補助	113	113.10.31		113.12.31		113.12.31																113.07.31 已送本縣議會提案墊付 113.08.21 本縣議會同意墊付，後續辦理採購發包事宜。 無進度更新(113.10.07)
49	新竹縣	竹東鎮	補助	113	113.11		113.12		113.12																俟預算立法程序完成後，辦理採購發包作業 無進度更新
50	花蓮縣	吉安鄉	補助	113	113.10.31		113.12.15		113.12.15																俟議會同意墊付程序完成後，辦理採購發包作業 無進度更新(113.10.9)
51	花蓮縣	富里鄉	補助	113	113.10.31		113.12.15		113.12.15																俟議會同意墊付程序完成後，辦理採購發包作業 無進度更新(113.10.9)
52	嘉義縣	大林鄉	補助	113	113.10.31		113.11.31		113.12.31																業經議會同意墊付，研擬採購發包作業中。 無進度更新
53	嘉義縣	水上鄉	補助	113	113.10.31		113.11.31		113.12.31																業經議會同意墊付，研擬採購發包作業中。 無進度更新
54	嘉義縣	新港鄉	補助	113	113.10.31		113.11.31		113.12.31																業經議會同意墊付，研擬採購發包作業中。 無進度更新
55	苗栗縣	苗栗市 通霄鎮	補助	113	113.10.31		113.11.31		113.12.15																業經議會同意墊付，研擬採購發包作業中。 無進度更新

	縣 市 別	案 名 鄉(鎮 市區)	性 質 (補 助/ 自 辦)	辦 理 年 度	採購階段				規劃作業階段						法定作業階段								目前辦理情形(補充說明)		
					公告上網		決標		簽約		期初		期中		期末		公開展覽		公聽會		縣/市級審議會			函報本部審議	
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際		預定	實際
		大湖鄉																							
56	彰化縣	大村鄉	補助	113	113. 10. 31		113. 12. 13		113. 12. 20															預計於 11 月提送本縣議會定期會提案墊付，俟墊付程序完備後，辦理採購發包事宜	
57	彰化縣	花壇鄉	補助	113	113. 10. 31		113. 12. 13		113. 12. 20															預計於 11 月提送本縣議會定期會提案墊付，俟墊付程序完備後，辦理採購發包事宜	
58	臺東縣	臺東市	補助	113	113. 10. 31		113. 12. 1		113. 12. 15															無進度更新	
59	臺東縣	東河鄉	補助	113	113. 10. 31		113. 12. 1		113. 12. 15															無進度更新	
60	南投縣	仁愛鄉	補助	113	113. 10. 31		113. 12. 15		113. 12. 31																
61	南投縣	南投市	補助	113	113. 10. 31		113. 12. 15		113. 12. 31																
62	臺南市	左鎮區	補助	113	113. 11. 15		113. 12. 15		114. 1. 15															預計於 9 月提送本市議會定期會提案墊付，俟墊付程序完備後，辦理採購發包事宜	
63	新北市	萬里區	補助	113	114. 06. 30		114. 08. 31		114. 09. 30															無進度更新	
64	基隆市	七堵區	補助	113	113. 10. 1		113. 11. 1		113. 12. 1															無進度更新	
65	桃園市	龍潭區	補助	113	114. 3. 30		114. 5. 31		114. 6. 30															無進度更新	
66	苗栗縣	南庄鄉	自辦	113	113. 9. 13	113. 9. 13	113. 10. 30		113. 11. 30															113. 10. 8 舉辦評選會議，評選結果發核後辦理決標公告	

第二案、直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃之專案報告

一、為協助直轄市、縣（市）政府推動鄉村地區整體規劃作業，本部分別於 110 年至 113 年補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業經費，共補助 18 直轄市、縣（市）、60 案、72 鄉（鎮、市、區），亦有部分直轄市、縣（市）政府自籌預算辦理，先予敘明。

二、關於規劃作業階段，各直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業進度以 1.5 年為原則，如評估無法配合者，仍應按契約時程積極辦理，爰 110 至 113 年度案件作業時程如下：

（一）110 年度案件（110 年 2 月 17 日核定），按第 11 次研商會議之直轄市、縣（市）政府所提作業時程辦理。

（二）111 年度案件（111 年 8 月 9 日核定）應於 112 年度 12 月底前完成各該鄉村地區整體規劃之期中階段成果；113 年度 6 月底前完成規劃作業，即完成總結報告。

（三）112 年度案件（112 年 3 月 27 日核定）應於 113 年度 12 月底前完成各該鄉村地區整體規劃之期中階段成果；114 年度 6 月底前完成規劃作業，即完成總結報告。

（四）113 年度案件（113 年 7 月 23 日核定）應於 114 年度 12 月底前完成各該鄉村地區整體規劃之期中階段成果；115 年度 6 月底前完成規劃作業，即完成總結報告。

三、經檢視 110 至 113 年度案件辦理情形，共計 9 案未符

規劃辦理期程如下：

- (一) 110 年度案件：臺中市新社區案、高雄市六龜區案、雲林縣莿桐鄉案（自辦）等 3 案。
- (二) 111 年度案件：臺南市官田區案、高雄市永安區案、等 2 案。
- (三) 112 年度案件：高雄市茂林區案、新竹縣香山市案、彰化縣和美鎮案、宜蘭縣五結鄉案等 4 案。

四、為加速推動各年度鄉村地區整體規劃案及瞭解直轄市、縣（市）政府辦理情形，本署將就案件未符規劃辦理期程之直轄市、縣（市）政府依序進行專案報告（時程如表 2），本次先請高雄市政府及雲林縣政府派員出席會場，並分別就高雄市六龜區案、雲林縣莿桐鄉案等 2 案之實質規劃內容及辦理情形簡報說明（每案簡報時間各 10 分鐘，請依簡報格式製作簡報（詳附件，不超過 20 頁））：

- (一) 辦理進度（目前執行階段及後續預定時程規劃）。
- (二) 主要處理課題及因應策略，並就執行工具以空間規劃、土地使用管制或部門資源整合等三面向，予以分類說明。
- (三) 辦理過程遭遇困難及預定解決方式。

表 2 鄉村地區整體規劃案進行專案報告時程表

年度	項次	案名	直轄市、縣（市）政府	專案報告預定時程
110	1.	臺中市新社區	臺中市政府	第 13 次研商會議 (已報告)
	2.	高雄市六龜區	高雄市政府	第 15 次研商會議
	3.	雲林縣莿桐鄉	雲林縣政府	第 15 次研商會議
111	4.	高雄市永安區	高雄市政府	後續另行安排
	5.	臺南市官田區	臺南市政府	後續另行安排
112	6.	高雄市茂林區	高雄市政府	後續另行安排
	7.	新竹市香山區	新竹市政府	後續另行安排
	8.	彰化縣和美鎮	彰化縣政府	後續另行安排
	9.	宜蘭縣五結鄉	宜蘭縣政府	後續另行安排

備註：時程表將視鄉村地區整體規劃案辦理情形滾動式更新。

決定：

參、討論事項：辦理鄉村地區整體規劃後之法定程序及適用時機

說明：

一、背景說明

- (一) 有關辦理鄉村地區整體規劃後之法定程序及法定計畫書應載明事項等內容，前經本署分別於110年8月23日、112年6月8日及112年9月26日召開鄉村地區整體規劃第5、10、12次研商會議與直轄市、縣(市)政府討論確認在案。
- (二) 依本署113年5月29日召開「國土計畫相關議題調整方向座談會」會議結論第二點：「另針對辦理鄉村地區整體規劃後之法定作業程序(含法定計畫之定位、計畫內容及與國土功能分區及土地使用管制之關聯性等)，請業務單位再重新梳理，俾利各直轄市、縣(市)政府依循。」為明確鄉村地區整體規劃之法律定位、法定計畫與國土計畫法定工具之關聯性，以及後續辦理法定程序與適用時機，本署遂再評析後予以調整法定計畫書之名稱，併同修正法定計畫書之應載明事項，再提本次研商會議與直轄市、縣(市)政府討論。
- (三) 依據全國國土計畫規定，為促進鄉村地區永續發展及農村再生，並滿足改善鄉村地區生產條件、維護鄉村地區生態環境及提升鄉村地區生活品質等需求，直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃時應採議題導向式規劃，透過空間規劃改善公共設施服務水準，以達提升鄉村地區生活品質之目標。

(四) 另依據國土計畫法施行細則第 6 條第 3 款第 5 目規定，鄉村地區整體規劃之法律定位為直轄市、縣(市)國土計畫之一部分，係屬直轄市、縣(市)國土計畫層級；且依據全國國土計畫第 11 章附表 1-3-1 亦規定，研訂鄉村地區整體規劃係屬直轄市、縣(市)政府應辦及配合事項之一。故直轄市、縣(市)政府辦理鄉村地區整體規劃，得依據國土計畫法(下稱本法)第 15 條第 3 項第 5 款規定變更直轄市、縣(市)國土計畫。

(五) 又依據本署 112 年 9 月 26 日直轄市、縣(市)鄉村地區整體規劃作業第 12 次研商會議(摘錄)：

1. 鄉村地區整體規劃係基於直轄市、縣(市)國土計畫之指導，以鄉(鎮、市、區)為範圍，就居住、產業、運輸、公共設施、景觀等面向研提更細緻之規劃內容，其法定計畫為直轄市、縣(市)國土計畫之附冊(即鄉村地區計畫)。前述概念近似都會區域計畫或特定區域計畫之於全國國土計畫之關係(如圖 1)。
2. 另因鄉村地區整體規劃屬規劃程序，為直轄市、縣(市)國土計畫就鄉(鎮、市、區)範圍對特定課題所作之細緻補充，且因應課題特性涵蓋全鄉(鎮、市、區)範圍或該鄉(鎮、市、區)內聚落及其周邊地區範圍，分別進行全鄉(鎮、市、區)規劃或聚落規劃，並視需要提出土地使用配置，指認居住、產業及公共設施等區位。

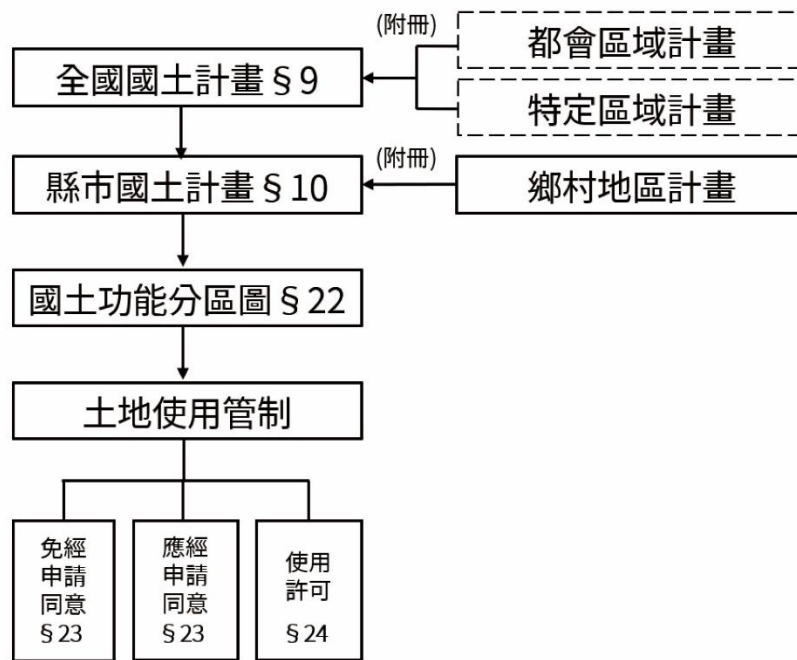


圖 1 鄉村地區整體規劃作業對應擬定法定計畫架構

二、建議處理方式

(一) 法定計畫書名稱調整

1. 有關全鄉（鎮、市、區）規劃及聚落規劃策略若應用國土計畫法定工具部分，包括本法第 22 條（調整國土功能分區及其分類）、第 23 條第 4 項（另訂土地使用管制規則）或第 24 條（使用許可）等規定之法定工具，因涉及本法第 10 條第 6 款「國土功能分區及其分類之劃設、調整、土地使用管制原則」之調整，屬變更直轄市、縣（市）國土計畫範疇。
2. 有關聚落規劃內容部分，因聚落規劃所研提之土地使用配置圖涉及該聚落及周邊範圍之土地使用指導事項，係屬變更直轄市、縣（市）國土計畫範疇。

3. 考量全鄉（鎮、市、區）規劃及聚落規劃皆須透過變更直轄市、縣（市）國土計畫落實其規劃內容，且本法第 15 條第 3 項規定直轄市、縣（市）國土計畫「得適時檢討變更」之情事共 5 款，為明確鄉村地區整體規劃之法律定位及其所屬情事，以及鄉村地區整體規劃與國土計畫法定工具關聯性，故統一鄉村地區整體規劃之法定計畫書名稱為「變更○○○○直轄市、縣（市）國土計畫（△△△鄉（鎮、市、區）鄉村地區計畫）」，如表 3。

（二）法定計畫書應載明事項調整


依循鄉村地區整體規劃之法律定位及其性質（即屬直轄市、縣（市）國土計畫之附冊），並就鄉（鎮、市、區）範圍或人口集居聚落之特定課題進行細緻補充，故研擬鄉村地區整體規劃之法定計畫書時，法定計畫內容僅須視實際規劃成果需要，就變更部分予以說明，如下表 3。

表 3 鄉村地區整體規劃作業完成後之法定計畫應載明事項

	本次修正	直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃作業第 12 次研商會議	
	統一為「變更直轄市、縣（市）國土計畫」	分為「變更直轄市、縣（市）國土計畫」與「擬定鄉村地區計畫」	
計畫名稱	變更○○直轄市、縣（市）國土計畫（○○鄉（鎮、市、區）鄉村地區計畫）	變更○○直轄市、縣（市）國土計畫	擬定○○縣○○鄉（鎮、市、區）鄉村地區計畫
計畫內容	一、計畫緣起。 二、計畫範圍及計畫年期。 三、全國國土計畫及原直轄市、縣（市）國土計畫之指示事項。 四、發展目標。 五、基本調查及發展預測。 六、空間發展及成長管理計畫。 （一）鄉（鎮、市、區）範圍 1. 空間發展計畫（視需要）。 2. 成長管理計畫（視需要）。 （二）聚落範圍 1. 聚落範圍課題（視需要）。 2. 聚落規劃構想（視需要）。 3. 土地使用配置（視需要）。 七、國土功能分區及其分類之劃設、調整、土地使用管制原則（視需要）。 八、部門空間發展計畫（視需要）。 九、氣候變遷調適計畫（視需要）。 十、國土復育促進地區之建議事項（視需要）。 十一、應辦事項及實施機關。 十二、其他相關事項。	一、變更範圍及位置。 二、全國國土計畫及原直轄市、縣（市）國土計畫之指示事項。 三、基本調查及發展預測。 四、空間發展及成長管理計畫。 五、變更理由及內容。 （一）國土功能分區及其分類之調整（視需要）。 （二）土地使用管制原則（視需要）。 六、部門空間發展計畫（視需要）。 七、氣候變遷調適計畫（視需要）。 八、國土復育促進地區之建議事項（視需要）。 九、應辦事項及實施機關。 十、其他相關事項。	一、計畫範圍。 二、現況分析及課題。 三、發展目標及規劃構想。 四、土地使用計畫。 五、實施機關、時程及經費來源。 六、其他相關事項。

三、法定程序办理流程

- (一) 依據本署 112 年 6 月 8 日直轄市、縣（市）鄉村地區整體規劃作業第 10 次研商會議，直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃時得採取一步到位機制，故包含書圖製作、審議均併同提至各級國土計畫審議及核定，並逐項接續公告實施，流程示意如圖 2。
- (二) 因辦理鄉村地區整體規劃後變更直轄市、縣（市）國土計畫，得視需要配合調整國土功能分區及其分類，惟直轄市、縣（市）政府刻辦理第三階段國土功能分區圖繪製作業，考量其變更依據及合理性，就法定計畫內容涉及變更國土功能分區圖者，建議俟各該直轄市、縣（市）國土功能分區圖公告實施後，再依本法規定辦理法定程序。

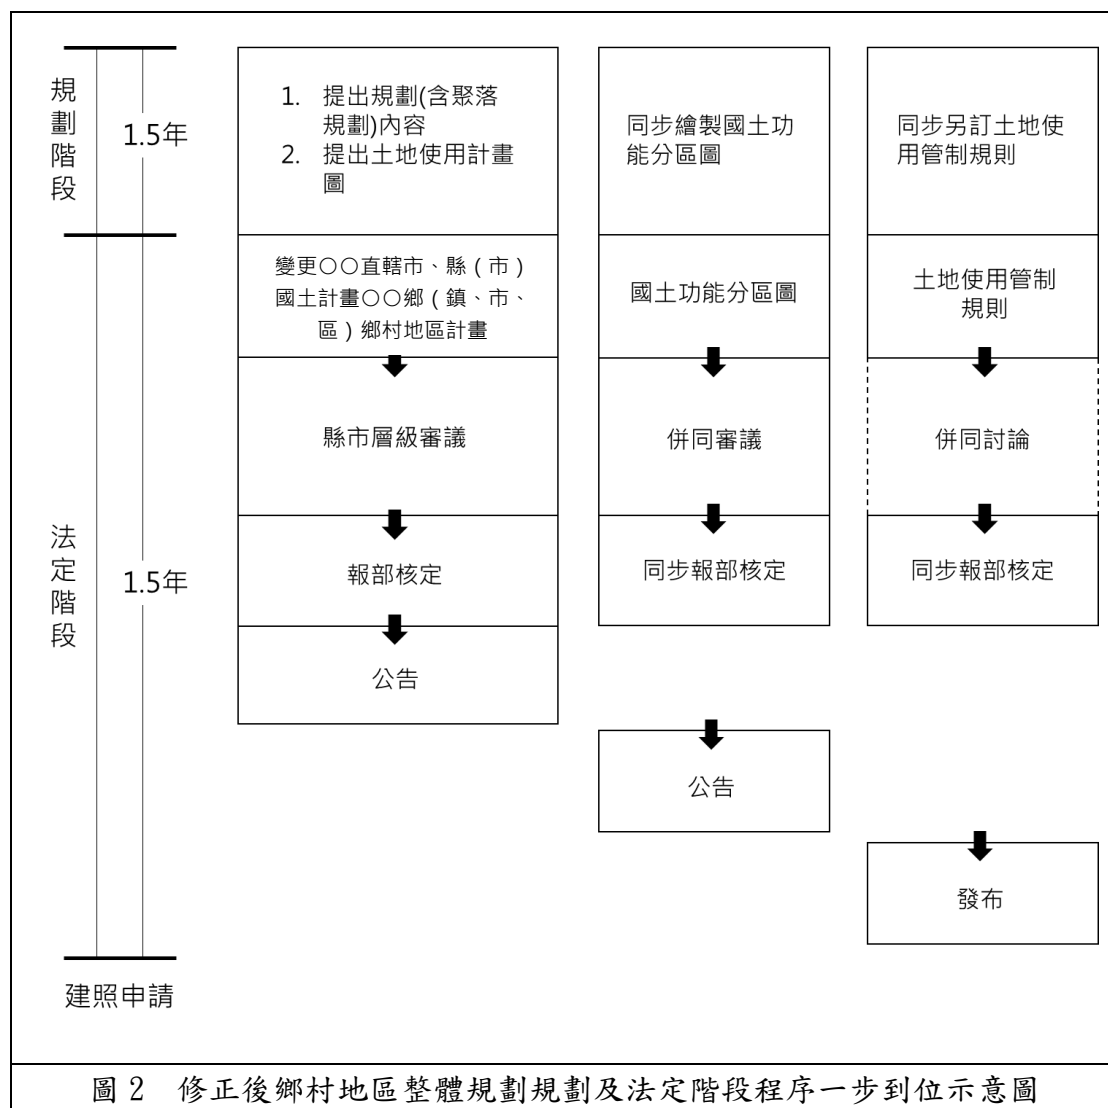

擬辦：擬請各直轄市、縣（市）政府依前開政策方向，調整或納入鄉村地區整體規劃案辦理。

肆、臨時動議

伍、散會
